

## "十三五"职业教育规划教材

高职高专土建专业"互联网+"创新规划教材



第三版

# 市政工程计量与计价

郭良娟◎主编

- 采用全新行业标准、规范与定额●
- 依据市政工程造价岗位实际需求●
- 辅以大量真实建设工程综合案例●









## "十三五"职业教育规划教材

高职高专士建专业"互联网+"创新规划教材



# 市政工程计量与计价

主 编◎郭良娟 副主编◎易 操 王云江 编◎洪 戸 干江红 周剑宏 李守敏



#### 内容简介

本书可作为高职高专院校市政工程技术、工程造价管理等专业的教材、也可供从事市政工程计量与计价工作的相关专业人员学习参考之用。

#### 图书在版编目(CIP)数据

市政工程计量与计价/郭良娟主编。—3版。—北京:北京大学出版社、2017.2 (高职高专土建专业"互联网+"创新规划教材) ISBN 978-7-301-27983-0

I. ①市··· Ⅱ. ①郭··· Ⅲ. ①市政工程—工程造价—高等职业教育—教材 Ⅳ. ①TU723.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 012935 号

书 名 市政工程计量与计价(第三版)

SHIZHENG GONGCHENG JILIANG YU JIJIA

著作责任者 郭良娟 主领

策划编辑 杨星璐

责任编辑 刻器

数字编辑 孟州

标准书号 ISBN 978-7-301-27983-0

出版发行 北京大学出版社

**地** 北京市海淀区成府路 205 号 100871

M 址 http://www.pup.cn 新浪微博:@北京大学出版社

电子信箱 pup\_6@163.com

印刷者

经 销 者 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 26.75 印张 642 千字

2008年9月第1版 2012年8月第2版

2017年2月第3版 2017年2月第1次印刷(总第14次印刷)

定 价 59.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有、侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: Id@pup.pku.edu.cn 图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话: 010-62756370



## 目 录

## 第一篇 市政工程计量与计价基础知识

第1章	- ()	
1.		4
1.3		6
1.3		
1.4	4 建设工程造价的特点	18
	考题与习题	
第2章		
2.	1 工程量计算的基本知识	21
	2 上程计价的基本知识	24
思	考题与习题	39
第3章	建设工程定额	42
3.	1 建设工程定额概述	43
3.3	2 施工定额	48
3	3 预算定额	51
3.4	4 概算定额	62
3.:	5 企业定额	63
思	考题与习题	67
	第二篇 市政工程定额计价模式下的计量与计价	
第 4 章	《通用项目》预算定额应用	71
4.	1 总说明	72
4.	2 通用项目	74
4.:		
思	考题与习题	106

## 市政工程计量与计价(第三版)

第5章	《道路工程》预算定额应用	109
5.1	册说明	110
5.2	路基处理	110
5,3	道路基层	112
5.4	道路面层	114
5.5	人行道及其他	121
5.6	道路工程定额计量与计价实例	124
思考	題与习题	135
第6章	《排水工程》预算定額应用	137
6.1	册说明	139
6.2	管道铺设	139
6.3	井、渠(管)道基础及砌筑	143
6.4	不开槽施工管道工程	158
6.5	给排水构筑物	161
6.6	模板、钢筋及井字架工程	
6.7	排水工程定额计量与计价实例	167
思考	题与习题	
第7章	《桥涵工程》预算定额应用	192
7.1	册说明	193
7.2	打桩工程	195
7.3	钻孔潘注桩工程	197
7.4	砌筑工程	202
7.5	钢筋及钢结构工程	203
7.6	现浇混凝土工程	207
7.7	预制混凝土工程	210
7.8	立交箱涵工程	212
7.9	安装工程	213
7.10	临时工程	214
7.11	装饰工程	218
7.12	桥梁工程定额计量与计价实例	220
思考	- 题与习题	253

## 第三篇 市政工程清单计价模式下的计量与计价

第8章	工程量清单与清单计价的基本知识	257
8.	I 概述	258
8.3	2 工程量清单的基本知识	259
8.:	3 工程量清单计价的基本知识	267
思	3考题与习题	276
第9章	土石方工程清单计量与计价	278
9.	1 土石方工程分部分项清单项目	279
9.3	2 土石方工程招标工程量清单编制实例	282
9.:		
思	考題与习题	290
第 10		
10	0.1 道路工程清单项目	
10	0.2 道路工程招标工程量清单编制实例	299
10	0.3 道路工程清单计价(投标报价)实例	305
思	3考题与习题	319
第 11	排水管网工程清单计量与计价	321
11	1.1 排水管网工程清单项目	
11	1.2 排水管道工程招标工程量清单编制实例	326
11	1.3 排水管道工程清单计价(投标报价)实例。	333
思	3考题与习题	354
第 12	章 桥涵工程清单计量与计价	355
12	2.1 桥涵工程清单项目	356
12	2.2 桥涵工程招标工程量清单编制实例	363
12	2.3 桥涵工程清单计价(投标报价)实例	370
思	3考题与习题	383
附录	市政工程清单项目及其计算规则、组合工作内容	384
参老文	r 献	412



# 市政工程计量与计价 基础知识

水质大学出版社版

## 第 章 工程造价的基本知识

## 本章学习要点

- 1. 工程造价的概念与含义。
- 法批准相所 2. 建筑安装工程费用的构成及各项费用的概念。
- 3. 工程造价与建设项目组成、建设程序的关系。





工程项目建设的周期一般比较长,可以分为项目可行性研究与决策阶段、项目初步设计阶段、项目技术设计阶段、项目施工图设计阶段、项目招投标阶段、项目实施阶段、项目或工验收阶段、项目试车(试运行)阶段、项目运行阶段。在每个阶段进行工程的投资管理活动,会产生相应的费用,这些费用是如何构成的呢?每个阶段预计和实际发生的费用相同吗?

## 1.1 工程造价的概念与含义

## 1.1.1 工程造价的概念

工程造价的直接意义就是工程的建造价格,是工程项目按照确定的建设项目、建设规模、建设标准、功能要求、使用要求等全部建成后经验收合格并交付使用所需的全部费用。

## 1.1.2 工程造价的含义

工程造价有两种含义。

## 1. 第一种含义

工程造价是指建设一项工程预期或实际开支的全部固定资产的投资费用。

这一含义是从投资者——业主的角度来定义的。投资者选定一个投资项目,为了获得 预期的效益,需通过项目评估、决策、设计招标、施工招标、监理招标、工程施工监督管 理,直至竣工验收等一系列的投资管理活动,在投资管理活动中所支付的全部费用就形成 了固定资产和无形资产。

工程造价的第一种含义即建设项目总投资中的固定资产投资。



建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分,具体构成见表 1-1。

	设备及工具、器具购置费用	设备购置费	设备原价	
			设备运杂费	
		E具、器具及生产家具!	购置费	
		直接费		
	建筑安装工程费用 (工程造价的第二种含义)	间接费		
		利润		
固定资产投资		税金		
(工程造价的第一种含义)	工程建设其他费用	土地使用费		
(下 (八 人)		与项目建设有关的其他费用		
		与未来企业生产经营有关的其他费用		
	THE Are able	基本预备费		
	预备费	,流价预备费		
	建设期利息			
	固定资产投资方向调节税			

设备原价是指国产标准设备、国产非标准设备或进口设备的原价。国产标准设备、国 产非标准设备其原价一般是指设备生产厂家的交货价、即出厂价; 进口设备原价是指进口 设备的抵岸价、是指抵达买方边境港口或边境车站且变完关税后的价格。

设备运杂费由运输与装卸费、包装费、设备供销部门的手续费、采购与仓库保管费 组成..

工具、器具及生产家具购置费是指新建或扩建项目按初步设计规定、主要保证初期正 常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具各备 品条件的费用。

## 特别提示

工具、器具及生产家具一般价值不高,未达到固定资产标准:设备一般价值较高,已 达到固定资产标准。

土地使用费包括土地征用及迁移补偿费、土地使用权出让念。

建设项目不同,与项目建设有关的其他费用也不尽相同,一般包括:建设单位管理费、 勘察设计费、研究试验费、建设单位临时设施费、工程监理费、工程保险费、引进技术和 进口设备其他费用、工程承包费。

与未来企业生产经营有关的其他费用主要包括:联合试运转费、生产准备费、办公和 生活家具购置费。

基本预备费是指在初步设计及概算内难以预料的工程费用。

涨价预备费是建设项目在建设期间由干价格等变化引起工程造价变化的预测预留费用。



建设期贷款利息包括向国内银行和其他非银行金融机构贷款、出口信贷、外国政府贷款、国际商业银行以及在境内发行的债券等在建设期内应偿还的债款利息。

固定资产投资方向调节税是为了贯彻国家产业政策、控制投资规模、引导投资方向、调整投资结构、加强重点建设、促进国民经济持续、稳定、协调发展、对在 我国境内进行固定资产投资的单位和个人征收的一项税费、简称投资方向调节税。 自2000年1月1日起新发生的投资额、暂停征收固定资产投资方向调节税。

## 2. 第二种会义

工程造价是指为建设一项工程,预计或实际在上地市场、设备市场、技术劳务市场、承包市场等空易活动中所形成的建筑安装工程总价格。

这一含义以建设工程项目这种特定的商品作为交易对象,通过招投标或其他交易方式,在进行多次预估的基础上,最终由市场形成价格。

工程造价的第二种含义即建设项目总投资中的建筑安装工程费用。

## 1.2 建筑安装工程费用的构成



根据《住房和城乡建设部、财政部关于印发〈建筑安装工程费用项目组成〉的 通知》(建标[2013]44号)规定,建筑安装工程费用有两种划分方式:按费用构成要素 划分、按工程造价形成顺序划分。

【参考图文】

## 1.2.1 按费用构成要素组成划分



建筑安装工程费用项目按费用构成要素划分为人工费、材料费、施工机具使用 费、企业管理费、利润、规费和税金,如图1.1所示。

## 1. 人工费

人工费是指按工资总额构成规定,支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和 附属生产单位工人的各项费用。

#### 人工费包括:

- (1) 计时工资或计件工资: 是指按计时工资标准和工作时间或对已做工作按计件 单价支付给个人的劳动报酬。
- (2) 奖金: 是指对超额劳动和增收节支支付给个人的劳动报酬, 如节约奖、劳动 意塞奖等。
- (3) 津贴补贴: 是指为了补偿职工特殊或额外的劳动消耗和因其他特殊原因支付 给个人的津贴,以及为了保证职工工资水平不受物价影响支付给个人的物价补贴, 如流动施工津贴、特殊地区施工津贴、高温(赛)作业临时津贴、高空津贴等。



图 1.1 建筑安装工程费用项目组成(按构成要素划分)

- (4) 加班加点工资: 是指按规定支付的在法定节假日工作的加班工资和在法定日工作时间外延时工作的加点工资。
- (5) 特殊情况下支付的工资: 是指根据国家法律、法规和政策规定, 因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资。

#### 2. 材料费

材料费是指施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品、工

## 市政工程计量与计价(第三版)

程设备的费用。



依据国家发展和改革委员会、财政部等 9 部委发布的《标准施工招标文件》的有关规定,将工程设备费列入材料费;工程设备是指构成或计划构成水久工程一部分的机电设备、 金屬盆构设备、仅器装置及其他类似的设备和装置。

材料费包括:

- (1) 材料原价: 是指材料、工程设备的出厂价格或商家供应价格。
- (2) 运杂费: 是指材料、工程设备自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用。
  - (3) 运输损耗费: 是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗。
- (4) 采购及保管费:是指为组织采购、供应和保管材料、「程设备的过程中所需要的 各项费用、包括采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。
  - 3. 施工机具使用费

施工机具使用费是指施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或其租赁费。

1) 施工机械使用费

施工机械使用费以施工机械台班耗用量乘以施工机械台班单价表示,施工机械台班单价应由下列 7 项费用组成。

- (1) 折旧费; 指施工机械在规定的使用年限内, 陆续收回其原值的费用。
- (2) 大修理费: 指施工机械按规定的大修理问隔台近进行必要的大修理,以恢复其正常功能所需的费用。
- (3) 经常修理费、指施工机械除大修理以外的各级保养和临时故障排除所需的费用。 包括为保障机械正常运转所需替换设备与随机配备工具附具的摊销和维护费用,机械运转 中日常保养所需询滑与擦材的材料费用,以及机械停滞期间的维护和保养费用等。
- (4) 安拆费及场外运费:安拆费指施工机械(大型机械除外)在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用,以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用;场外运费指施工机械整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点的运输、装卸、辅助材料及架线等费用。
  - (5) 人工费: 指机上司机(司炉)和其他操作人员的人工费。
  - (6) 燃料动力费: 指施工机械在运转作业中所消耗的各种燃料及水、电等费用。
  - (7) 税费: 指施工机械按照国家规定应缴纳的车船使用税、保险费及年检费等。
  - 2) 仪器仪表使用费

仪器仪表使用费是指工程施工所需使用的仪器仪表的摊销及维修费用。

#### 4. 企业管理费

企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用。

企业管理费包括:

(1)管理人员工资:是指按规定支付给管理人员的计时工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资及特殊情况下支付的工资等。

- (2) 办公费:是指企业管理办公用的文具、纸张、账表、印刷、邮电、书报、办公软件、现场监控、会议、水电和集体取暖降温(包括现场临时宿舍取暖降温)等费用。
- (3) 差旅交通费;是指职工因公出差、调动工作的差旅费、住勤补助费,市内交通费和误餐补助费,职工探亲路费,劳动力招募费,职工退休、退职一次性路费,工伤人员就 医路费,工地转移费以及管理部门使用的交通工具的油料、燃料等费用。
- (4) 固定资产使用费:是指管理和试验部门及附属生产单位使用的属于固定资产的房屋、设备、仅器等的折旧、大修、维修或租赁费。
- (5) 工具用具使用费;是指企业施工生产和管理使用的不属于固定资产的工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费。
- (6) 劳动保险和职工福利费:是指由企业支付的职工退职金、按规定支付给离休干部的经费,集体福利费、夏季防暑降温、冬季取暖补贴、上下班交通补贴等。
- (7) 劳动保护费:是企业按规定发放的劳动保护用品的支出,如工作服、手套、防暑 降温饮料以及在有碍身体健康的环境中施工的保健费用等。
- (8) 检验试验费:是指施工企业按照有关标准规定、对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行。般鉴定、检查所发生的费用,包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用,不包括新结构,新材料的试验费,对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和建设单位委托检测机构进行检测的费用,对此类检测发生的费用,由建设单位在工程建设其他费用中列之。但对施工企业提供的具有合格证明的材料进行检测不合格的,该检测费用由施工企业支付。
- (9) 工会经费;是指企业按《中华人民共和国工会法》规定的全部职工工资总额比例 计提的工会经费。
- (10) 职上教育绘数:是指按职工工资总额的规定比例计提,企业为职工进行专业技术和职业技能培训。专业技术人员继续教育、职工职业技能鉴定、职业资格认定以及根据需要对职工进行各类文化教育所发生的费用。
  - (11) 财产保险费:是指施工管理用财产、车辆等的保险费用。
- (12) 财务费:是指企业为施工生产筹集资金或提供预付款担保、履约担保、职工工资支付担保等所发生的各种费用。
  - (13) 税金: 是指企业按规定缴纳的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等。
- (14) 其他:包括技术转让费、技术开发费、投标费、业务招待费、绿化费、广告费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费、保险费等。
  - 5. 利润

利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利。

#### 6. 坂素

规费是指按国家法律、法规规定,由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计 取的费用。

规带包括:

- 1) 社会保险费
- (1) 养老保险费: 是指企业按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。



- (2) 失业保险费。是指企业按照规定标准为职工缴纳的失业保险费。
- (3) 医疗保险费, 是指企业按照规定标准为职厂缴纳的基本医疗保险费。
- (4) 生育保险费, 是指企业按照规定标准为职工缴纳的生育保险费。
- (5) 工伤保险费, 是指企业按照规定标准为职工缴纳的工伤保险费。
- 2) 住房公积金

企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金。

3) 工程排污费

按规定缴纳的施工现场工程排污费。

其他应列而未列入的规带, 按实际发生计取。

#### 7 税金

税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税、城市维护建设 税、教育费附加以及地方教育附加。



- 1. 要注意企业管理费中的税念与建筑容装工程费用七大构成要素之一的税念的 区别。
  - 2. 浙江省增设税余项目· 地方水利建设基金。



## 知识链接

财政部、国家税务总局于 2016 年 3 月 23 日发布财税[2016]36 号文 --- 《财政 部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税的通知》、自2016年5月1日起、 在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点,建筑业、房地产业、 金融业、生活服务业等全部营业税纳税人、纳入试点范围、由缴纳营业税改为缴纳 增值税。

增值税的计税方法、包括一般计税方法和简易计税方法。一般纳税人以清包工 方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税:一般纳税人为甲供工程提供 的建筑服务,可以选择适用的简易计税方法计税:一般纳税人为建筑工程老项目提供 的建筑服务,可以选择适用的简易计税方法计税,建筑工程老项目,是指:①《建 贷工程施工许可证》注明的合同开工日期在 2016 年 4 月 30 日前的建筑工程项目: ②未取得《建筑工程施工许可证》的,建筑工程承包合同注明的开工日期在2016年 4月30日前的建筑工程项目。



浙江省住房和城乡建设厅发布了建建发[2016]144 号文件, 自 2016 年 4 月 18 日 执行,采用一般计税方法的建设工程,按照"价税分离"的原则,实施营改增后建 设工程计价规则进行了调整:采用简易计税方法要求的工程项目,可按原合同约定 或营改增前的计价依据执行,并执行财税部门的有关规定。

采用一般计税方法的建设工程。计价规则调整如下。

工程造价由税前工程造价、增值税销项税额、地方水利建设基金构成。其中, 税前工程造价是由人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润和规费等各费 用项目组成、各费用项目均不包含增值税进项税额。

营改增后有关要素价格的调整。

- (1) 材料价格:包括材料供应价、运杂费、采购保管费等、其中材料供应价、运 杂费、采购保管费均按增值税下不含进项税额的价格或费用确定。
- (2) 施工机械台班单价: 包括台班折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场 外运费、机上人工费、燃料动力费和其他费用等、其中台班折旧费、大修理费、经 常修理费及燃料动力费等均按增值税下不含进项税额的价格或费用确定。
- (3) 企业管理费及施工组织措施费: 均按增值税下不含进项税额的价格或费用确 定,企业管理费的组成内容增加城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加。
  - (4) 税金,税金由增值税销项税额和地方水利建设基金构成。

## 122 按工程浩价形成顺序划分

建筑安装工程费用按工程造价形成顺序划分为分部分项工程费、措施项目费、 其他项目费、规费和税金,分部分项工程费、措施项目费、其他项目费包含人工费、 材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润, 如图 1.2 所示。



## 1. 分部分项工程费

分部分项工程费是指各专业工程的分部分项工程应予列支的各项费用。

- (1) 专业工程, 是指按现行国家计量规范划分的房屋建筑与装饰工程、仿古建筑 下程、通用安装工程、市政工程、园林绿化工程、矿山工程、构筑物工程、城市组 道交诵工程、爆破工程等各类工程。
- (2) 分部分项工程: 指按现行国家计量规范对各专业工程划分的项目。如房屋建 领与装饰工程划分的土石方工程、地基处理与桩基工程、砌筑工程、钢筋及钢筋混 凝土工程等。

各类专业工程的分部分项工程划分见现行国家或行业计量规范。

#### 2. 措施项目费

措施项目费是指为完成建设工程施工、发生干该工程施工前和施工过程中的技 术、生活、安全、环境保护等方面的费用。

措施项目费包括:

- (1) 安全文明施工费,包括:
- (1) 环境保护费, 是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。
- ② 文明施工费: 是指施工现场文明施工所需要的各项费用。
- ③ 安全施工费: 是指施工现场安全施工所需要的各项费用。
- ④ 临时设施费:是指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用 的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用。包括临时设施的搭设、维修、抵除、 清理费或摊销费等。

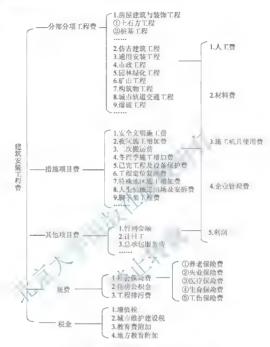


图 1.2 建筑安装工程费用组成(按造价形成划分)

## 知识链接

根据浙江省住房和城乡建设厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅于 2015 年 12 月 21 日发布的建建发[2015]517 号文件规定、调整了安全文明施工费费用组成及费率标准、自 2016 年 2 月 1 日起执行。

在《浙江省建设工程施工费用定额》(2010版)中安全文明施工费(以下简称"基本费")的基础上增加施工扬尘污染防治增加费、创安全文明施工标准化工地增加费(以下简称"创标化工地增加费"),基本费、施工扬尘污染防治增加费和创标化工地增加费三项费用合并为安全文明施工费。

- (2) 夜间施工增加费,是指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜 间施工照明设备摊销及照明用电等费用。
- (3) 次搬运费: 是指因施工场地条件限制而发生的材料、构配件、半成品等。 次运输不能到达堆放地点,必须进行,次或多次搬运所发生的费用。
- (4) 冬雨季施工增加费: 是指在冬季或雨季施工需增加的临时设施、防滑、排除 雨雪。人工及施工机械效率降低等费用。
- (5) 已完工程及设备保护费: 是指竣工验收前, 对已完工程及设备采取的必要保 护措施所发生的费用。
- (6) 工程定位复测费: 是指工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作的 费用。
- (7) 特殊地区施工增加费; 是指工程在沙漠或其边缘地区、高海拔、高寒、原始 森林等特殊地区施工增加的费用。

## 知识链接

浙江省建设工程造价管理总站干 2013 年 12 月 16 日颁发了浙建站计[2013]64 号文件, 规定在施工组织措施费项目中增加工程定位复测费项目和特殊地区增加费 项目:将施工组织措施费中的检验试验费按"费用项目组成"的内容和要求并入企【参考图文】 业管理费,施工组织措施费中不再计算检验试验费;并相应调整了企业管理费的费 率, 干 2014年1月1日起施行



- (8) 大型机械设备进出场及安拆费; 是指机械整体或分体自停放场地运至施工现 场或由一个施工协直运至另一个施工协直、所发生的机械讲出场运输及转移费用。 以及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和 安装所需的辅助设施的费用。
- (9) 脚手架工程费: 是指施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用以及脚手架购 胃费的摊销(或租赁)费用。

其他措施项目及其包含的内容详见各类专业工程的现行国家或行业计量规范。

## 知识链接

根据浙江省建设工程谱价管理总站编制、干 2013 年 11 月发布的《浙江省建设 工程工程量清单计价指引》(市政工程),除上述措施项目外,还包括以下技术措施项 目, 混凝土模板与支架带, 围堰、便道、便桥、洞内临时设施、施工排水、隆水、 她下管线交叉处理, 施工监测、监控等: 还包括以下组织措施项目, 行车、行人干 扰增加费, 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费。

#### 3. 其他项目费

(1) 暂列金额,是指建设单位在下程量清单中暂定并包括在下程合同价款中的一 笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务

## ★ 市政工程计量与计价(第三版)

的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生 的索赔、现场签证确认等的费用。

- (2) 计日 L: 是指在施工过程中,施工企业完成建设单位提出的施工图纸以外的零星项目或工作所需的费用。
- (3)总承包服务费:是指总承包人为配合、协调建设单位进行的专业工程发包,对建设单位自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。

## 4. 规费

与 1.2.1 节按费用构成要素组成划分相同。



浙江省建设工程造价管理总站于2013年12月16日颁发了浙建站计[2013]64号文件、根据《建筑安装工程费用组成》(建标[2013]44号)的要求、将"意外伤害保险费"从"规费"调整为"企业管理费"、调整后的意外伤害保险费暂不并入"企业管理费"内,在建设工程费用计算程序表中的规费之后单独列项、于2014年1月1日起施行。

## 5. 税金

与 1.2.1 节按费用构成要素组成划分相同。



在两种划分方式下,建筑安装工程费用组成的费用项目名称不同,但在本质上,建筑 安装工程费用的构成是相同的。

## 1.3 建设项目组成、工程造价与建设程序

## 1.3.1 建设项目的组成

工程建设项目按建设管理和合理确定工程造价的需要,可划分为建设项目、单项工程、单位工程、分部工程、分项工程5个组成的层次。

#### 1. 建设项目

建设项目是指在一个总体设计范围内,经济上实行统一核算,行政上实行统一管理的 建设单位,一般应以一个企业(或联合企业)、事业单位或大型综合独立工程作为一个建设 项目。 例如城市的 · 个污水厂、 · 座立交桥、 · 条道路等, 均为 · 个建设项目。

#### 2. 单项工程

单项工程是建设项目的组成部分,是指具有独立的设计文件、建成后可以独立发挥生成能力和使用效益的工程。

例如一个污水厂的细格棚、曝气池、初沉池、二沉池、消化池等均是一个单项工程。 一个建设项目可能是一个单项工程,也可能包括岩干个单项工程。

## 3. 单位工程

单位 L程是单项 L程的组成部分,是指具有独立的设计文件、可以独立组织施工,但建成后一般不能独立发挥生成能力和使用效益的工程。

通常根据能否独立施工、独立核算的要求,将一个单项工程划分为若干个单位工程。

例如污水厂的曝气池是一个单项工程,曝气池的上建工程、设备安装工程则为其所包含的单位工程。

## 4. 分部工程

分部工程是单位工程的组成部分,是指在一个单位工程中,按工程部位及使用的材料、工种进一步划分的工程。

例如污水厂曝气池的钻孔灌注桩基础、现浇混凝土(主体)结构是曝气池土建工程这个单位工程所包含的分部工程。

## 5. 分项工程

分项工程是分部工程的组成部分,是指在一个分部工程中,按照不同的施工方法、不同材料的不同规格等进一步划分确定的工程。分项工程是最小的一个层次,是施工图预算中最基本的计算单位。

例如现浇污水/曝/(池的底板模板、底板钢筋、底板混凝土浇筑等是曝/(池混凝土(主体)结构这个分部工程所包含的分项工程。

## 特别提示

一个建设项目通常由一个或若干个单项工程组成;一个单项工程通常由若干个单位工程组成;一个单位工程通常由若干个分部工程组成;一个分部工程通常由若干个分项工程组成

## 1.3.2 工程造价与建设项目的组成

相应于建设项目组成的层次划分,工程造价的组成也可分为5个层次;建设项目总造价、单项工程造价、单位工程造价、分部工程造价、分项工程造价。

工程造价的计算过程:分部分项工程单价 • 单位工程造价 • 单项工程造价 • 建设项目总造价。

## 特别提示

市政工程计量与计价是由局部到整体的一个计算过程,即分项工程,分部工程,单位



工程→单项工程→建设项目的分解、组合计算的过程。

合理划分建设项目的组成, 尤其是分部分项工程的划分是进行工程计量与计价的一项 很重要的工作。

## 1.3.3 工程建设基本程序

工程建设基本程序 · 般划分为以下几个阶段:项目建议书和可行性研究阶段,初步设计阶段,技术设计阶段,施工图设计阶段,招投标阶段,实施阶段,竣工验收阶段,项目变付使用阶段。

## 1.3.4 工程造价与建设程序

工程建设周期长、规模大, 工程建设程序划分为若干个阶段, 相应地需要在工程建设 的不同阶段多次进行工程造价的计算。

各个建设阶段与对应的 [程造价见表 1-2。

表 1-2 各个建设阶段与对应的工程造价

M	项目建议书、 市会	иятын <u>.</u>	*****	MIN EN		<b>竣工</b> 阶段	<b>交付</b> 阶段
工程造价	投资估算	概算造价	修止 概算造价	预算遊戲 合同价	施工预算	结算价	决算价

## 1. 投资估算

投资估算是指在项目建议书和可行性研究阶段,由建设单位或受其委托的咨询机构编制,依据项目建议、投资估算指标及类似工程的有关资料,须先测算和确定的建设项目的 投资额,又称估算赔价。

投资估算是决策、筹资和控制造价的主要依据。

#### 2. 概算造价

概算造价是指在初步设计或扩大初步设计阶段,由设计单位编制,依据初步设计图纸和说明、概算指标或概算定额、各项费用取费标准、类似工程预(决)算文件等预先测算和限定的工程造价。

概算造价又称设计概算,它是设计文件的组成部分,根据编制的先后顺序和范围大小 可以分为;单位工程概算、单项工程概算、单设项目总概算。

概算造价受投资估算(估算造价)的控制,同时概算造价比投资估算造价的准确性有所提高。

#### 3. 修正概算造价

修正概算造价是指在采用:阶段设计的技术设计阶段,由设计单位编制,依据技术设计的要求,通过编制修正概算文件预先测算和限定的工程造价。

修正概算造价又称修正设计概算,它是对初步设计阶段的概算造价的修正和调整,比 概算造价准确,但受概算造价控制。

## 4. 预复造价

预算遊价是指在施工图设计阶段,由建设单位或设计单位、受其委托的咨询单位编制, 依据施工图、预算定额或估价表、费用定额,以及地区人工、材料、机械、设备的价格等 预生测算和限定的工程造价。

预算造价又称施工图预算,它受设计概算或修正设计概算的控制,但比设计概算或修 正设计概算更详尽和准确。

#### 5. 合同价

合同价是指在工程招投标阶段,由投标单位依据招标单位提供的图纸、招标文件、预算定额或企业定额、费用定额,以及地区人工、材料、机械、设备的价格等编制投标报价,再通过评标、定标,确定中标单位后在工程承包合同中确定的工程造价。

合同价是承发包双方根据市场行情共同议定和认可的成交价格,它不等同于工程的实际:告价。建设工程合同有多种类型,不同类型的合同其合同价的内涵也有所不同。

## 6. 施工预算

施工预算是指在实施阶段,在工程施工前、由施工单位编制,依据施工图及标准图集、 施工定额(或借用预算定额)、施工组织设计(或施工方案)、施工及验收规范等编制的单位工 程或分部分项工程施工所需的人工、材料、机械台班的数量和费用。

施工预算施工单位内部的经济管理文件,是施工单位进行施工准备、编制施工进度计划、编制资源供应计划、加强内部经济核算的依据。

#### 7. 结篁价

(竣工)结算价是指在竣工验收阶段,由施工单位编制,依据合同调价范围、调价方法等相关规定,对实际发生的工程量增减、设备和材料的价差等进行调整后计算和确定,并由建设单位或受其委托的咨询单位核对,最终确定的工程造价。

结算价是该结算工程的实际造价。

## 知识链接

工程结算是指施工企业依据承包合同和已完工程量,按照规定的程序向建设单位收取 工程价款的一项经济活动。如果工程建设周期长、耗用资金数量大、则需要对工程价款进 行中间结算(进度款结算)、年终结算和竣工结算。

## 8. 决算价

决算价是指在竣验收、交付使用后,由建设单位编制,建设项目从筹建到竣工验收、 交付使用全过程实际支付的全部建设费用。

决算价又称竣 [决算, 是整个建设项目的最终价格。



## 1.4 建设工程造价的特点

建设厂程诰价具有以下几个特点。

#### 1. 大额性

能够发挥投资效益的任何一项工程,不仅实物形体庞大,而且工程造价高昂。一般工程造价也需上百万、上千万元,特大工程造价可达上百亿、上千亿元人民币。

#### 2. 个别性

任何一项  $\Gamma$ 程都有特定的用途、功能、规模,因而  $\Gamma$ 程内容和实物形态都具有个别性,从而决定了  $\Gamma$  在程道价的个别性。同时,由于每项  $\Gamma$  程所处地区、地段不同,使得  $\Gamma$  程造价的个别性更为突出。

## 3. 动态性

工程建设周期较长,在此期间会出现许多影响工程造价的因素,如设计变更、设备及 材料价格的变动、利率及汇率的变化等,使得工程造价在建设期内处于不确定状态。

#### 4. 层次性

建设项目的组成具有层次性,与此对应,工程造价也具有层次性。它包括分项工程造价、分部工程造价、单位工程造价、单项工程造价、建设项目总造价。

#### 5. 萋窓性

工程造价的兼容性首先表现在它具有两种含义, 其次表现在工程造价构成因素的广泛 性。此外, 盈利的构成也较为复杂, 资金成本较大。

## (思考题与习题)

- 1. 什么是工程造价?
- 2. 按费用构成要素组成划分,建筑安装工程费用由哪几部分组成?
- 3. 按工程造价形成顺序划分,建筑安装工程费用由哪几部分组成?
- 4. 人工费包括哪几部分费用?
- 5. 材料费包括了施工过程中耗费的工程设备的费用,这里的工程设备的概念是什么?
- 6. 施工机具使用费中包含的人工费、包括哪些人工的费用?
- 7. 新结构、新材料的试验费包含在企业管理费中吗?
- 8. 什么是规费? 它包括哪些内容?
- 9. 企业管理费中的税金与建筑安装工程费用组成按构成要素划分的七大部分之一的税金如何区别?

- 11. 安全文明施工费包括哪些费用?
- 12. 其他项目费包括哪些费用?
- 13、什么是暂列金额?
- 14. 什么是计日工?
- 15. 建设项目的组成分哪几个层次?
- 16. 建设项目的建设程序分哪几个阶段,各个阶段相应的工程造价分别称为什么?
- 17. 增值税的计税方法有哪两种? 哪些建设项目可以选择适用简易计税法计税?
- 18. 采用简易计税法计税与采用一般计税法计税,工程造价组成中材料单价有何不同? 施工机械台班单价有何不同?企业管理费的组成有何不同?税金有何不同?

# 第2章 工程量计算与计价的基本知识

## 本章学习要点

- 工程量的概念、作用; 工程量的计算依据、计算顺序; 工程计量的影响因素及注意 事项。
- 2. 工程计价的概念、依据;工程计价的模式与方法;工程费用计算程序;施工取费计算规则;工程类别的划分及各项费率的确定。

## 引言

某市区要建设城市高架路,一期工程长 2.5km。根据施工图,按正常的施工组织设计、正常的施工工期并结合市场价格计算出预算定额分部分项工程费为 5000 万元(其中人工费+机械费为1200 万元), 按定额计价模式的工料单价法计算程序计算该工程造价。

思考: (1) 各项施工组织措施费如何计算? 企业管理费、利润、规费、税金如何计算? 各项费用计算的依据是什么?

- (2) 预算定额分部分项工程费为 5000 万元又是如何计算得到的?
- (3) 清单计价模式下采用什么计价方法?
- (4) 综合单价法计算程序与工料单价法计算程序有什么不同?,

## 2.1 工程量计算的基本知识

## 2.1.1 工程量的概念

工程量是以物理计量单位或自然计量单位表示的建筑工程各个分项工程或结构构件的数量。

物理计量单位是指以物体的某种物理属性来作为计量单位。如道路面层以 m² 为计量单位; 砖砌检查井砌筑以 m³ 为计量单位。自然计量单位是指以物体本身的自然组成为计量单位来表示工程项目的数量。如井字架以座为计量单位。

工程量计算是指建筑工程以工程图纸、施工组织设计或施工方案及相关的技术、经 济文件为依据,按照相关工程的计算规则等规定,进行工程数量的计算活动,简称工程 计量。

## 2.1.2 工程量的作用

- (1) 工程量是确定工程造价的基础。准确计算工程量,才能准确计算出分部分项工程费,进而按照费用计算程序计算、确定工程造价。
- (2) 工程量是施工单位进行生产经营管理的重要依据。各项工程量是施工单位编制施工组织设计、合理安排施工进度,组织现场劳动力、材料、机械等资源供应计划,进行经济核算的重要依据。
- (3) 工程量是建设单位管理工程建设的重要依据。工程量也是建设单位编制建设计划、 筹集资金、进行工程价款的结算与拨付等的重要依据。



## 2.1.3 工程量的计算依据

- (1) 现行的工程量计算规范、定额、政策规定等。
  - (2) 施工图纸及设计说明、相关图集、设计变更文件资料等。
  - (3) 施工组织设计或施工方案、专项方案等。
  - (4) 其他有关的技术、经济文件、如工程施工合同、招标文件等。

## 2.1.4 工程量的计算顺序

## 1. 按施工顺序依次计算

结合 L程图纸,按照 L程施工顺序逐项计算工程量。如某道路、排水工程,可以按照 总体施工顺序依次计算以下各分项工程的工程量:沟槽开挖、管道垫层、管道基础、管道 铺设、检查并垫层、检查并底板、检查并砌筑、检查并抹灰、并室盖板预制安装、井圈预 电安装、管道闭水试验、沟槽回填、道路路床整形碾压、道路基层、道路面层、平侧石安砌、人行道板铺设等。

## 2. 根据图纸,按一定的顺序依次计算

根据图纸,可以按顺时针方向计算; 从图纸的左上角开始,按顺时针方向依次计算; 也可以按从左到右或者从上到下的顺序依靠计算。

## 2.1.5 工程计量的影响因素与注意事项

## 1. 丁程计量的影响因素

在进行工程计量以前。应先确定以下工程计量因素。

1) 计量对象

在不同的建设阶段, 有不同的计量对象, 对应有不同的计量方法, 所以确定计量对象 是工程计量的前提。

在项目决策阶段编制投资估算时, 工程计量的对象取得较大, 可能是单项工程或单位, 工程, 甚至是整个建设项目, 这时得到的工程造价也就较粗略。

在初步设计阶段编制设计概算时, L程计量的对象可以取单位工程或扩大的分部分项 工程。

在施工图设计阶段编制施工图预算时,以分项工程为计量的基本对象,这时取得的工程造价也就较为准确。

2) 计量单位

工程计量时采用的计量单位不同,则计算结果也不同,所以工程计量前应明确计量 单位。

按定额计算规则计算时,工程量计算单位必须与定额的计量单位相一致,市政工程预算定额中大多数采用扩大定额的方法计算,即采用 100m³、1 000m³、1 000m²、100m²、10t 等计量单位。如"挖掘机挖沟槽上方"定额的计量单位为"1 000m³",而"人工挖沟槽七方"定额的计量单位为"100m³"。

按清单计算规则计算时,工程量计算单位必须与清单工程量计算规范的规定相一致,清单工程量计算规范中通常采用基本计量单位,即采用  $m^3$ 、 $m^2$ 、t 等计量单位。如"挖沟槽上方"清单项目的计量单位为" $m^3$ "。

#### 3) 施工方案

在 L程计量时,对于施工图样相同的 L程,往往会因为施工方案的不同而导致实际完成 L程量的不同,所以工程计量前应确定施工方案。

如同一段管道沟槽开挖,采用放坡开挖的施工方案和采用加设支撑的施工方案,所计 算的沟槽挖方工程量完全不同。

## 4) 计价方式

在工程计量时,对于施工图样相同的工程,采用定额的计价模式和清单的计价模式,可能工程量的计算规则会不同,相应地会有不同的计算结果,所以在计量前也必须确定计价方式。

如"管道铺设"按定额的计算规则需扣除附属构筑物、管件及阀门所占长度,而按清单的计算规则则不需要扣除附属构筑物、管件及阀门所占长度。

## 2. 工程计量的注意事项

- (1) 要依据对应的工程量计算规则进行计算,包括项目名称、计量单位、计量方法的一致性。
- (2) 熟悉设计图纸和设计说明, 计算时以图纸标注尺寸为依据, 不得任意加大或缩小尺寸。
- (3)注意计算中的整体性和相关性。如在市政工程计量中,要注意处理道路工程、排水工程的相互关系。避免道路工程、排水工程在计算上看方工程量时的漏算或重复计算。
- (4) 注意计算列式的规范性和完整性,最好采用统一格式的工程量计算纸,并写明计算部位、项目、特征等,以便核对。
- (5) 注意计算过程中的顺序性,为了避免工程量计算过程中发生漏算、重复等现象,计算时可按一定的顺序进行。

(6) 注意结合工程实际,工程计量前应了解工程的现场情况、拟用的施工方案、施工方法等,从而使工程量更切合实际。

(7) 注意计算结果的自检和他检。 L程量计算后,计算者可采用指标检查、对比检查 等方法进行自检,也可谓经验丰富的资价工程师进行他检。

## 特别提示

工程数量有效位数规定如下。

- (1) 以吨为单位,应保留小数点后 3 位数字,第 4 位四舍五入。
- (2) 以米、平方米、立方米为单位,应保留小数点后 2 位数字,第 3 位四舍五入。
- (3) 以个、项、块等为单位,应取整数。



## 2.2 工程计价的基本知识

## 2.2.1 工程计价的概念

工程计价是指在定额计价模式下或在工程量清单计价模式下,按照规定的费用计算程序,根据相应的定额,结合人工、材料、机械市场价格,经计算预测或确定工程造价的活动。 计价模式不同,工程造价的费用计算程序、采用的计价方法不同;现行有两种计价模式,即定额计价模式和清单计价模式,对应有两种计价方法、两种费用计算程序。

建设项目所处的阶段不同,工程计价的具体内容、计价方法、计价的要求也不同。如 在项目招投标阶段和项目实施阶段,建设工程工程量清单计价涵盖了从招投标到工程竣工 结算的全过程,包括以下计价内容:工程量清单招标控制价、工程量清单投标报价、工程 合同价款约定、工程计量与价款支付、工程价款调整、合同价款中期支付、工程竣工结算 与支付、合同解除的价款结算与支付等。

## 2.2.2 市政工程计价的依据

## 1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)

中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合于 2012年12月25日发布"第1567号"公告,于2013年7月1日起正式在全国统一贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013),原国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013),原国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2008)同时废止。

《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013)包括正文、附录两大部分,两者具有同等效力。

正文共16章,包括总则、术语、一般规定、工程量清单编制、招标控制价、投标报价、 合同价款约定、工程计量、合同价款调整、合同价款期中支付、竣工结算及支付、合同解 除的价款结算与支付、合同价款争议的解决、工程造价鉴定、工程计价资料与档案、工程 计价表格。

附录包括附录 A 物价变化合同价款调整方法, 附录 B 工程计价文件封面, 附录 C 工程 计价文件扉页, 附录 D 工程计价总说明, 附录 E 工程计价汇总表, 附录 F 分部分项 L 程相 措施项目计价表, 附录 G 其他项目计价表, 附录 H 规费、税金项目计价表, 附录 J 工程计量申请(核准)表, 附录 K 合同价款支付申请(核准)表, 附录 L 主要材料设备一览表。

## 2. 《市政工程工程量计算规范》(GB 50857-2013)

《市政工程  $\Gamma$  程  $\Gamma$  程  $\Gamma$  程  $\Gamma$  程  $\Gamma$  2013 年 7 月 1 日起工式在全国统一贯彻实施。

《市政工程工程量计算规范》(GB 50857 2013)包括包括正文、附录两大部分, 两者具有同等效力。

## 特别提示

接浙江省建建发[2013]273 号文件通知,浙江省于 2014 年 1 月 1 日起在全省范围内贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB 50857—2013)。



## 3. 《浙江省建筑工程计价依据》(2010版)

《浙江省建筑工程计价依据》(2010 版)经浙江省住房和城乡建设厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅共同发布的建建发 [2010] 224 号文件, 自 2011 年 1 月 1 日起施行。

《浙江省建筑工程计价依据》(2010 版)包括:《浙江省建设工程计价规则》(2010 版)、《浙江省建筑工程预算定额》(2010 版)、《浙江省安装工程预算定额》(2010 版)、《浙江省市政工程预算定额》(2010 版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2010 版)、《浙江省建设工程施工费用定额》(2010 版)、《浙江省建设工程施工费用定额》(2010 版)。

## 1) 《浙江省建设工程计价规则》(2010版)

《浙江省建设工程计价规则》(2010 版) 共设十章:第一章总则,第二章术语,第三章工程造价组成及计价方法,第四章设计概算,第五章工程量清单编制与计价,第六章招标控制价、投标价与成本价,第七章合同价格与工程结算,第八章工程计价纠纷处理,第九章附件及标准格式,第十章附则。

## 2) 《浙江省市政工程预算定额》(2010版)

《浙江省市政工程预算定额》(2010 版)是在《浙江省市政工程预算定额》(2003 版)的基础上,依据国家、浙江省有关现行产品标准、设计规范和施工验收规范、质量评定标准、安全技术操作规程,并结合浙江省实际情况进行编制的。

## 3) 《浙江省建设工程施工费用定额》(2010版)

《浙江省建设 C程施 C费用定额》(2010 版)以《浙江省建设 C程施 C费用定额》 (2003 版)为基础编制,它以指令性与指导性结合、政策指导与市场调节互补为编制 原则,既适用于 C程量清单计价模式,也适用于定额计价模式。

《浙江省建设工程施工费用定额》(2010版)由五部分内容组成,包括:总说明、



建设工程施工费用计算规则、建设工程施工费用取费费率、工程类别划分、附录。

4) 《浙江省施工机械台班费用定额》(2010版)

《浙江省施工机械台班费用定额》(2010版)包括一部分内容: 施工机械台班单价、 施工机械台班基础数据、附录。

# 【参考图立】

## 4. 《浙汀省建设工程工程量清单计价指引》(市政工程)

浙江省建设工程造价管理总站于2013年11月印发了《浙江省建设工程工程量 清单计价指引》,列出了清单项目与现行计价依据定额子目的对应关系。供建设各方 主体在工程计价活动中参考使用。

## 5. 其他



建筑市场信息价格, 如工程造价管理机构定期发布的人工、材料、施工机械台 班市场价格信息也是确定工程造价的依据。

企业(行业)自行编制的经验性计价依据,如企业定额等也是确定工程造价(投标 报价)的依据。

国家相关部门及各省、自治区相关部门发布的有关工程计量与计价的相关通知、 文件等也是确定工程造价的依据。

## 2.2.3 工程计价的模式与方法

建设工程计价模式分为定额计价模式、工程量清单计价模式两种。定额计价模 式采用工料单价法, 工程量清单计价模式采用综合单价法。

## 特别提示

全部使用国有资金或以国有资金为主的建设工程发承包,必须采用工程曼清单 计价.

## 1. 工料单价法

工料单价(直接工程费单价)是指完成一个规定计量单位的分部分项工程项目或 技术措施工程项目所需的人工费、材料费、施工机具使用费。

厂料单价法是指分部分项厂程项目及施工技术措施工程项目的单价按厂料单价 (直接工程费单价)计算,施工组织措施项目费、企业管理费、利润、规费、税金、暂 列金额及总承包服务费等其他项目费用、风险费用按规定程序单独列项计算的一种 计价方法。

工程造价=∑项目合价+取费基数×(施工组织措施费率+企业管理费率+ 利润率)+规费+其他项目费+风险费用+税金 (2-4)

## 2. 综合单价法

综合单价是指 · 个规定计量单位的分部分项 [ 程量清单项目或技术措施清单项目除规费、税金以外的全部费用,包括人 [ 费、材料费、施 [ 机具使用费、企业管理费、利润及一定的风险费用。

## 特别提示

上述综合单价不包括规费、税金等不可竞争的费用,并不是真正意义上的全包括的综合单价,而是一种狭义上的综合单价。

国际上所谓的综合单价一般是指全包括的综合单价,包括规费、税金。

综合单价法是指分部分项 L程量清单项目及施 L技术措施清单项目单价按综合 单价计算,施工组织措施项目费、规费、税金、暂列金额及总承包服务费等其他项 目费用按规定程序单独列项计算的一种计价方法。

项目单价~综合单价

(2-5)

综合单价=1 个规定计量单位的人工费+材料费+施工机具使用费+取费基数×

(企业管理费率+利润率)+风险费用

(2-6)

项目合价=综合单价×项目工程数量 (2-7) 工程造价=∑项目合价+取费基数×施工组织措施费率+规费+其他项目费+税金

(2-8)

## 3. 工程量清单计价模式与定额计价模式的区别与联系

- 1) 两者的区别
- (1) 适用范围不同。

全部采用国有投资资金或以国有投资资金为主的建设工程项目必须实行工程量 清单计价。除此以外的工程,可以采用工程量清单计价模式,也可以采用定额计价 模式。

(2) 采用的计价方法不同。

工程量清单计价模式采用综合单价法计价, 定额计价模式采用工料单价法计价。

(3) 项目划分不同。

□ 下程量清单计价模式下的项目基本以一个"综合实体"考虑,一般一个项目包括多项□程内容。定额计价模式下的项目一般一个项目只包括一项□程内容。

如"混凝上管道铺设"工程量清单项目包括管道垫层、基础、管座、接口、管 道铺设、闭水试验等多项工程内容,而"混凝上管道铺设"定额项目只包括管道铺 设达一项工程内容。

(4) 工程量计算规则的依据不同。

工程量清单计价模式下工程量计算规则的依据是《市政工程工程量计算规范》 (GB 50857 2013),为全国统一的计算规则。

定额计价模式下工程量计算规则的依据是预算定额,由一个地区(省、自治区、直辖市)制定,在本区域内统一。如《浙江省市政工程预算定额》(2010版)在浙江省范围内统一。





(5) 采用的消耗量标准不同。

工程量清单计价模式下,投标人计价时可以采用自己的企业定额,其消耗量标准体现 的是投标人个体的水平,是动态的。

定额计价模式下,投标人计价时采用统一的消耗量定额,其消耗量标准反映的是社会平均水平,是静态的。

(6) 风险分担不同。

工程量清单计价模式下,工程量清单由招标人提供,由招标人承担工程量计算的风险, 投标人承担报价(单价和费率)的风险。

定额计价模式下, 工程量由各投标人自行计算, 故工程量计算风险和报价风险均由投标人承担。

#### 2) 两者的联系

为了与国际接轨,我国于2003年开始推行工程量清单计价模式。由于大部分施工企业还没有建立和拥有自己的企业定额体系,因而,建设行政主管部门发布的定额,尤其是当地的消耗量定额(预算定额),仍然是企业投标报价的主要依据。

另外,工程量清单项目一般包括多项工作内容,计价时,首先需将清单项目分解成若 干个组合工作内容,再按其对应的定额项目计算规则计算其工程量并套用定额子目。也就 是说,工程量清单计价活动中,存在部分定额计价的成分。

## 2.2.4 工程费用的计算程序

定额计价模式采用工料单价法, 工程量清单计价模式采用综合单价法, 相应有两种工程费用计算程序。

(1) 工料单价法计算程序, 见表 2-1

表 2-1 /工料单价法

序号	费用项目	计 算 方 法
	预算定额分部分项工程费	∑(项目工程量×工料单价)
	1. 人工费+机械费	∑(定额人工费+定额机械费)
1	施工组织措施费	各项合计
	2. 安全文明施工费	
	3. 工程定位复测费	
	4. 特殊地区施工增加费	
	5. 冬雨季施 Ľ增加费	
其	6. 夜间施工增加费	1×费率
中	7. 已完工程及设备保护费	
.,.	8. 二次搬运费	
	9. 行车、行人干扰增加费	
	10. 提前竣工增加费	
	11. 其他施工组织措施费	按相关规定计算

续表

序号	费用项目	计 算 方 法
=	企业管理费	1/
四	利润	1×费率
Ŧī.	规费	12+13+14
	12. 排污费、社保费、公积金	1×费率
	13. 农民工工伤保险费	按各地有关规定计算
	14. 危险作业意外伤害保险费	
六	总承包服务费	(15+16)或(15+17)
	15. 总承包管理和协调费	Object Company with the
	16. 总承包管理、协调和服务费	── 分包项目 T程造价×费率
	17. 甲供材料、设备管理服务费	(甲供材料费、设备费)>费率
七	风险费	( '+ '+ '+ '世+五+六)×费率
八	暂列金额	( '+ '+ '+ '円+五+六+七)×费率
ĴL	税金	( '+ '+ '+  - 四+五+六+七+八)×税率
+	建设工程造价	~++三+四+五+六+七+八+九



- (1) 表中预算定额分部分项工程费包括了分部分项工程项目、施工技术措施工程项目 的直接工程费(包括人工费、材料费、施工机具使用费),均按"工程量×工料单价"的方法 计算。
- (2) 施工组织措施费中:安全文明施工费必须计取;其他各项组织措施费根据工程实 际情况计取。如工程现场场地宽敞、材料无须二次搬运、就无须计取二次搬运费。
  - (3) 农民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险费按各地的规定进行计算。
  - (2) 综合单价法费用计算程序, 见表 2-2。

表 2-2 综合单价法

序号		费用项目	计 算 方 法
	L程量清单分部分项 L程费		∑(分部分項 L程量×综合单价)
	1. 人工费+机械费		∑分部分项(人工费+机械费)
=	措施项	目費	()+()
	(一) 施	□技术措施项目费	∑(技术措施项目 L程量×综合单价)
	其中	2. 人工费+机械费	∑技术措施项目(人工费+机械费)
(二) 施工组织措施项目清单署		工组织措施项目清单费	各项合计
		3. 安全文明施工费	
	其中	4. 工程定位复测费	(1+2)×费率
		5. 特殊地区施工增加费	

法书

			:失代	
序号		贵 用 项 目	计 算 方 法	
		6. 冬雨季施 I.增加费		
		7. 夜间施工增加费		
		8. 已完工程及设备保护费		
	其中	9. 次搬运费		
		10. 行车、行人干扰增加费		
		11. 提前竣工增加费	按相关规定计算	
		12. 其他施工组织措施费		
=	其他项目费		按工程量清单计价要求计算	
四	规费		13+14+15	
	13. 排污费、社保费、公积金		(1+2)×费率	
	14. 农民工工伤保险费		かない たい何かこ 物	
	15. 危险作业意外伤害保险费		按各地有关规定计算	
H	税金		( -+ .+ :+四)×费率	
六	建设工程造价		→+文水=+四+五	

## 2.2.5 施工取费的计算规则

- (1) 以"人工费+机械费"为取费基数。"人工费+机械费"是指分部分项工程项目及施工技术措施工程项目的人工费和机械费之和。
- ① 人工费不包括机工人工,大型机械设备进出场及安拆费不能直接作为机械费计算,但其中的人工费及机械费可作为取费基数。
  - ② 编制招标控制价时,应以预算定额的人工费及机械费作为计算费用的基数。
- ③ 编制投标报价时,其人工、机械台班消耗量可根据企业定额确定,人工单价、机械 台班单价可按当时当地的市场价格确定,以此计算的人工费和机械费作为取费基数。
- (2) 施工措施项目应根据《浙江省建设工程施工费用定额》(2010 版)、措施项目清单,结合工程实际确定。
- ① 施工技术措施项目可根据相关的工程量计算规则,结合工程的实际情况,根据施工 方案计算确定其工程量及费用。
- ② 施工组织措施费按施工费用计算程序以取费基数乘以组织措施费费率计算,其中安 全文明施工费为必须计算的措施费项目,其他组织措施费项目可根据工程量清单、结合工 程实际情况列项,工程实际不发生的项目不应计取费用。
- ③ 在编制投标报价时,安全文明施工费不得低于《浙江省建设工程施工费用定额》 (2010版)的下限费率报价:在编制招标控制价时,安全文明施工费按费率的中值计算。
- (3) 企业管理费费率是根据不同的工程类别确定的。通常市政工程划分为一类、二类、 三类工程。

(4)编制招标控制价时,施工组织措施费、企业管理费及利润,应按费率的中值 或弹性区间费率的中值计取。

编制施工图预算时,施工组织措施费、企业管理费及利润,可按费率的中值或 弹性区间费率的中值计取。

- (5) 暂列金额 · 般可按税前造价的 5%计算。工程结算时,暂列金额应予以取消, 另按工程实际发生项目增加费用。
- (6) 发包人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时,总承包单位可按 分包的专业工程造价的 1%-2%向发包方计取总承包服务费, 发包人要求总承包单 位对分包的专业工程进行总承包管理和协调,并同时要求提供配合服务时,总承包 单位可按分包的专业工程造价的 1%-4%向发包方计取总承包服务费,对甲供材料、 设备进行管理和服务时,可按甲供材料、设备价值的 0.2%~1%计取费用。
- (7) 规费、税金应按《浙江省建设工程施工费用定额》(2010 版)规定的费率计取, 不得作为竞争性费用。

## 2.2.6 费率取值

#### 1. 市政工程施工组织措施费费率

营改增前的市政工程以及营改增后采用简易计税法的市政工程,施工组织措施 费费率取值见表 2-3。

表 2-3 市政工程施工组织措施费费率



【参考图》

定額编号	一 项目名款	计算基数	1	费率/%	
<b>上照确</b> 写		月春季数	下限	中值	上限
C1-1	安全又同地上费				
	(含扬尘污染防治增加费)				
C1-11	其一非市区工程	人工费+机械费	9.92	10.82	11.72
C1-12	中市区、般工程	八上班市机械班	11.54	12.61	13.69
C1-1-1	<b>创标化</b> E 地增加费				
C1-1-11	其 非市区工程	人工费+机械费	1.76	2.07	2.48
C1-1-12	中市区·般上程	人上项下机械项	2 07	2.44	2.93
C1-2	夜间施工增加费	人工费+机械费	0.01	0.03	0.06
C1-3	提前竣工增加费				
C1-31	指短工期 10%以内		0.01	0.83	1.65
C1-32	中 缩短工期 20%以内	人工费+机械费	1.65	2.04	2.44
C1-33	缩短工期 30%以内		2.44	2.83	3.23
C1-4	二次搬运费		0.57	0.71	0.82
C1 5	己完工程及设备保护费		0 02	0.04	0.06
C1-6	工程定位复测费	人工费+机械费	0.03	0.04	0.05
C1-7	冬季、雨季施 匚增加费		0.10	0.19	0.29
C1-8	行车、行人干扰增加费		2.00	2.50	3.00
C1-9	优质工程增加费	优质工程增加费前造价	1.00	2.00	3.00
	特殊地区增加费	人工费+机械费	按	实际发生计	算

注: 专业 Ł 石方 L程安全文明施工费费率乘以系数 0.6。创标化工地增加费上限、中值和下限费分别对应国家级、省级和市级标化工地增加费费率。





## 知识链接

(1) 根据浙江省住房和城乡建设厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅于 2015年12月21日颁发的建建发[2015]517号文件规定,调整了安全文明施工费费用 组成及费率标准、自2016年2月1日起执行。在此之前已招标或已答署施工合同的 工程仍按原合同约定条款执行。如合同约定可调整的,2016年2月1日后发生的工 程量可据此文件调整.



(2) 浙江省建设工程造价管理总站于2013年12月16日颁发的浙建站计[2013]64 号文件、规定在施工组织措施费项目中增加工程定位复测费项目和特殊地区增加费 项目,相应费率见表 2-3;将施工组织措施费中的检验试验费按"费用项目组成"的 内容和要求并入企业管理费、施工组织措施费中不再计算检验试验费: 并相应调整 了企业管理费的费率、于2014年1月1日起施行。

营改增后采用 一般计税法的市政工程,施工组织措施费中:安全文明施工费、 创标化工地增加费的费率与简易计程法的费率不同,取值见表 2-4: 其他各项施工组 织措施费的费率同表 2-3。

表 2-4 市政工程施工组织措施费费率(一般计税法)

	le.	- 項目名称	计算基数 。又	,	费率/%	
定額编号		- 福日治療	打弄金双 火	<b>上下限</b>	中值	上限
C1-1	(含:	安全又明愈 贵 场尘污染防治增加费)				
C1-11	其	作市区工程	人工费+机械费	9.17	10.19	11.21
C1-12	1/1	一 市区一般工程	人工好中机械好	10.68	11.88	13.08
C1-1-1		刨标化工地增加费				
C1-1-11	其	非市区工程	人工费+机械费	1.66	1.95	2.34
C1-1-12	中	市区一般工程	八上页下机恢页	1.95	2.30	2.76

## 知识链接



【参名图文】

浙江省建设工程造价管理总站于2016年4月18日发布浙建站定[2016]23号文件, 对营改增后浙江省建设工程施工取费费率予以调整。

#### 2. 市政工程企业管理费费率

营改增前的市政 厂程以及营改增后采用简易计税法的市政 厂程。企业管理费费 率取值见表 2-5。

表 2-5 市政工程企业管理费费率(简易计税法)

-	法自发统	汗管其影	幕室/%		
III. Later	<b>坝目名</b> 称	丌昇基效	一类	二类	三类
C2 1	道路工程	A south to the	16 -21	14 -19	12 -16
C2 2	桥梁 L程	人工费+机械费	21~28	18~24	16~21

维表

定額编号	项目名称	C) At 40 M	费率/%			
正视猜亏	坝日名称	计算基数	一类	二类	三类	
C2-3	隧道工程		10~13	8~11	6~9	
C2-4	河道护岸工程	人工费+机械费	_	13~17	11~15	
C2 5	给水、燃气及单独排水工程		14~18	12~16	10~14	
C2-6	专业土石方工程			3~4	2~3	
C2-7	路灯及交通设施工程	人工费+机械费	27~36	22~30	18~25	

## 知识链接

根据浙江省建设工程造价管理总站于2013年12月16日颁发的浙建站计[2013]64号文件,"企业管理费"按相应专业费率乘以系数1.30,于2014年1月1日起施行。

营改增后采用一般计税法的市政工程,企业管理费增加城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等内容, 绘用时不再区分工程所在地,按统一费率执行,见表 2-6。

表 2-6 市政工程企业管理表表率(一般计税法)

定		in A	Y	<b>臺寧/%</b>	
<b>正</b> 表示。	ovietelo.	TON MET		二类	三类
C2-1	道路工程		22.63~29.71	19.81~26.88	16.98~22.63
C2-2	桥梁工程		29.71-39.61	25.46~33.95	22.63~29.71
C2-3	隧道上程	人工费+	14,15 18.39	11.32~15.56	8.49~12.73
C2-4	河道护岸工程	机械费	_	18.39~24.05	15.56~21.22
C2-5	给水、燃气及单独排水工程	17	19.81~25.46	16.98~22.63	14.15~19.81
C2-6	专业上看方工程		_	4.24~5.66	2.83~4.24
C2-7	路灯及交通设施工程	人工费+ 机械费	_	31.12~42.44	25.46~35.37

#### 3. 市政工程利润费率

营改增前的市政工程以及营改增后采用简易计税法与采用一般计税法的市政工程,利润费率相同,取值见表 2-7。

表 2-7 市政工程利润费率

定额编号	项目名称	计算基数	蒉率/%
C3 1	道路工程		9~15
C3-2	桥梁工程		8~14
C3-3	隧道工程	1 -	4~8
C3~4	河道护岸工程	人工费+机械费	6~12
C3-5	给水、燃气及单独排水工程		8~13
C3 6	专业 上石方 L程		1~4
C3 7	路灯及交通设施工程		13~20



#### 4. 市政工程规费费率

营改增前的市政工程以及营改增后采用简易计税法与采用一般计税法的市政工 程, 规带费率相同, 取值见表 2-8。

表 2-8 市政工程规带费率

定额编号	項目名称	计算基数	费率/%
C4 1	道路、桥梁、河道护岸、给排水及燃气工程		7.30
C4-2	隧道工程	A ye atta . An Aub atta	4.05
C4-3	专业土石方工程	人工费+机械费 -	1.05
C4-4	路灯及交通设施工程	1	11.96



根据浙江省建设工程造价管理总站于 2013年 12月 16日颁发的浙建站计 [2013]64 号文件、根据"费用项目组成"的要求、将"意外伤害保险费"从"规费" 调整为"企业管理费",调整后的意外伤害保险费暂不并入"企业管理费"内,在建 设工程费用计算程序表中的规费之后单独列项。

### 5. 市政工程税金费率

营改增前的市政工程, 税金费率取值见表 2-9。

表 2-9 市政工程税金费率(营改增前)

定額编号	TATE OF THE	14.00.00	<b>農率/%</b>		
<b>走飘得写</b>	<b>州</b> 自44	X Z	市区	城(镇)	其他
D4	税金	直接费4间接费+规费	3.577	3.513	3.384
D4-1	税费	直接费+间接费+规费	3 477	3.413	3.284
D4-2	水利建设资金	直接费+间接费+规费	0.100	0.100	0.100

营改增后采用简易计税法的市政工程,税金费率取值见表 2-10。

表 2-10 市政工程税金费率(简易计税法)

<b>产物</b> 体 医二	項目名称	计算基数			
定额编号		订异类数	市区	城(镇)	其他
S2	税金		3.43%	3.37%	3.25%
S2-1	增值税征收率	直接工程费+措施费 - + 企业管理费 + 利润 - + 规费	3.00%	3.00%	3.00%
S2-2	城市维护建设税		0.21%	0.15%	0 03%
S2-3	教育费附加及地方 教育附加		0.15%	0.15%	0.15%
S2-4	地方水利建设基金		0.07%	0.07%	0.07%

注: 简易计税方法下的直接工程费、措施费、企业管理费、利润和规费的各项费用中,均包 含增值税进项税额。

## 2 知识链接

浙江省建设工程造价管理总站于2016年5月12日发布浙建站定[2016]35号文件,对营改增后浙江省建设工程税金费率予以调整。



营改增后采用一般计税法的市政工程,税金费率取值见表 2-11。

表 2-11 市政工程税金费率(一般计税法)

定额编号	项目名称	计算基数	费率/%
SI	税金		11.07
S1-1	增值税(销项税额)	税前工程造价	11.00
S1-2	地方水利建设基金		0.07

## 2.2.7 工程类别划分

## 1. 市政工程类别划分

市政工程类别划分见表 2-12。

#### 表 2-12 市政工程类别划分

土程 工程	34 \ - 75/2	() =	
道路工程	城中在建干道	1. 城市主于道、水干道 2. 10 000m 以上广场、 5 000m 以上停车场 3. 带 400m 标准跑道的 运动场	<ol> <li>支路、街道、居民厂区道路</li> <li>单独的人行道工程、广场及路面维修</li> <li>1000m²以下广场、5000m²以下停车场</li> <li>运动场、跑道、燥场</li> </ol>
桥插工程	<ol> <li>层数3层以上的立交桥</li> <li>单孔最大跨径40m以上的桥梁</li> <li>拉索桥</li> <li>籍涵顶进</li> </ol>	<ol> <li>3 层以下立交桥、人 行地道</li> <li>单孔最大跨径 20m 以 上的桥梁</li> <li>高架路</li> </ol>	1. 单孔最大跨谷 20m 以下的 桥梁 2. 涵洞 3. 人行天桥
隧道工程	1. 水底隧道 2. 垂直顶升隧道 3. 截面宽度 9m 以」	截而宽度 6m 以上	截面宽度 6m 以下
河道排洪及 护岸工程	-	单独排洪工程	单独护岸护坡及土堤

结表

			77.15
工程			
给排水 E程	1. 日生产能力 200 000t 以 上的自来水厂 2. 日处理能力 200 000t 以 上的污水处理厂 3. 日处理能力 100 000t 以 上的单独排水泵站 4. 直径 1 200mm 以上的给 水管道 5. 直径 1 800mm 以上的排 水管道	2. 日处理能力 100 000t 以上的污水处理厂 3. 日处理能力 50 000t 以上的单独排水泵站 4. 直径 600mm 以上的给水 管道 5. 直径 1 000mm 以上的排	1. 日生产能力 80 000t 以下的自 来水厂 2. 目处理能力 100 000t 以下的 污水处理厂 3. 日处理能力 50 000t 以下的单 独排水泵站 4. 宜餐 600mm 以内的给水管道 5. 真经 1 000mm 以内的排水管道
燃气供热 工程	管外径 900mm 以上的燃气 供热管道	管外径 600mm 以上的燃气 供热管道	管外径 600mm 以下的燃气供热 管道
路灯及交通设施工程	- 33	路灯安装大于 30 根, 且包含 20m 及以上的高灯杆安装大于 4 根的工程	:类工程以外的其他工程
Ł石方工程	- ' '	深度 4m 以上的上石方开挖	深度 4m 以下的土石方开挖

#### 2. 工程类别划分说明

1) 道路工程

按道路交通动能分类。

- (1) 城市高速干道:城市道路设有中央分隔带,具有 4 条以上车道,全部或部分采用 立体交叉与控制出入,供车辆高速行驶的道路。
  - (2) 城市主干道: 在城市道路网中起骨架作用的道路。
- (3) 城市次下道:城市道路网中的区域性干路,与主干道相连,构成完整的城市干路系统。
  - (4) 支路:城市道路网中的干路以外联系次干路或供区域内部使用的道路。
- (5) 街道:在城市范围全部或大部分地段两侧建有各式建筑物,设有人行道和各种市政公用设施的道路。
  - (6) 居民(厂)区道路:以住宅(厂房)建筑为主体的区域内道路。
  - 2) 桥涵工程
  - (1) 单独桥涵按桥涵分类,附属于道路工程的桥涵,按道路工程分类。
- (2) 单独立交桥工程按立交桥层数进行分类;与高架路相连的立交桥,执行立交桥类别。
  - 3) 隊道工程

按隧道类型及隧道内截面的净宽度进行分类。

4) 河道排洪及护岸工程

按单独排洪工程、单独护岸护坡及上堤工程分类。

- (1) 单独排洪工程包括明渠、暗渠及截洪沟。
- (2) 单独护岸护坡包括抛石、石笼、砌护底、护脚、台阶以及附属于本类别的上方工程等。
  - 5) 给排水工程

按管径大小分类。

- (1) 顶管工程包括挤压顶进。
- (2) 在一个给水或排水工程中有两种及以上不同管径时,最大管径的管道长度超过管道总长的(不包括支管长度)10%时,按最大管径确定工程类别;最大管径的管道长度小于管道总长的10%时,按次一级管径确定工程类别。
  - (3) 给排水管道包括附属于本类别的挖土和管道附属构筑物及设备安装。
  - 6) 燃气供热工程

按燃气供热管道外径大小分类。

- (1) 在 · 个燃气或供热管道工程中有两种及以上不同管外径时,最大管外径的管道长度超过管道总长(不包括支管长度)的 10%时,按最大管外径确定类别;最大管径的管道长度小于管道总长的 10%时,按次一级管径确定工程类别。
  - (2) 燃气供热管道包括管道挖上和管道附属构筑物。

## 特别提示

- (1) 单因素确定原则:某专业工程有多种情况的,符合其中一种情况、即为该类别。
- (2) 就高原则:多个专业工程一同发包时,以专业工程类别最高者作为该工程的类别。
- (3) 单独排水工程按其类别执行给水费率;单独附属工程按相应主体工程的三类取费标准计取。单独学校跑道、操场按道路的类别及费率执行。
- 【例 2-1】 某市区单独排水工程,于 2016 年 3 月 17 日—3 月 21 日编制招标控制价。已知管道最大管径为 1 200mm,根据施工图纸、按正常的施工组织设计、正常的施工工期并结合市场价格计算出分部分项工程量清单项目费为 1 200 万元(其中人工费+机械费为 300 万元),施工技术措施项目清单费为 250 万元(其中人工费+机械费为 80 万元),其他项目清单费为 30 万元,试按综合单价法编制招标控制价。

### 【解】(1) 工程类别判别。

根据《浙江省建设工程施工费用定额》(2010版)规定,本例工程类别为二类排水工程。

(2) 费率确定。

根据《浙江省建设工程施工费用定额》(2010 版)规定,编制招标控制价时,施工组织措施费,企业管理费及利润应按费率的中值或弹性区间费率的中值计取。

家民工工伤保险费费率按 0.114%计取, 危险作业意外伤害保险费暂不考虑, 创标化工 地增加费不计。

(3) 按费用计算程序计算招标控制价, 见表 2-13.



表 2-13 计算招标控制价

序号	费用项目	计算方法	金额/万元
	[.程量清单分部分项 [.程费	∑(分部分项 L.程量×综合单价)	1 200
	1, 人工费+机械费	∑分部分项(人工费+机械费)	300
	措施项目费	(·)+( ·;)	308.558
	(一) 施工技术措施项目清单费	∑(技术措施项目工程量×综合单价)	250
	2. 人工费+机械费	∑技术措施项目(人工费+机械费)	80
	(二) 施工组织措施项目费	3+4+5+6+7+8+9	58.558
	3. 安全文明施工费(基本费)	(300+80)×10.61%	40,318
	4. 扬尘污染防治增加费	(300+80)×2.00%	7.600
	5. 定位复测费	(300+80)×0.04%	0.152
	6. 冬季、雨季施工增加费	(300+80)×0.19% \ \ \ \	0.722
	7. 夜间施工增加费	(300+80)×0 03%	0.114
	8. 已完工程及设备保护费	(300+80)×0.04%	0.152
	9. 行车、行人干扰增加费	(300+80)×2.50%	9.500
Ξ	其他项目费	在工程量清单计价要求计算	30
四	規费	12+13+14	28.173 2
	12. 工程排污费、社会保障费、住房公积金	(300+80)×7,30%	27.74
	13. 农民工工伤保险费	(300+80)×0,114%	0.433 2
	14. 危险作业意外伤害保险费	_	0
fi	税金	(一十二十三十四)×3.577%	56.042 0
六	建设工程造价	*+二+三+四+五	1 622.773

【例 2-2】 某市区欲建设城市高架路、长 3.5km。于 2016 年 3 月 17 日—3 月 21 日编制投标报价。根据施工图纸,按正常的施工组织设计、正常的施工工期并结合市场价格计算出预算定额分部分项工程费为 7 500 万元(其中人工费+机械费为 2 100 万元)。该工程不允许分包,材料不需要二次搬运、暂列金额按税前造价的 5%计算,风险费用暂不考虑,施工组织措施费、企业管理费及利润按费率范围或弹性区间的下限计取,农民工工伤保险费要率按 0.114%计取,危险作业意外伤害保险费暂不考虑,创标化工地增加费不计,试按工料单价法编制投标报价。

#### 【解】(1) 工程类别判定。

根据《浙江省建设工程施工费用定额》(2010版)规定,本例"城市高架路"工程类别为二类桥涵工程。

(2) 按费用计算程序计算招标控制价, 见表 2-14。

表 2-14 计算施工图预算造价

序号	费用项目	计算方法	金额/万元
	预算定额分部分项 L程费	∑(分部分项项目 L程量× L料单价)	7 500
	1. 人工费+机械费	∑(定额人工費+定额机械费)	2 100
	施工组织措施费	2+3+4+5+6+7+8	287.7
	2. 安全文明施工费(基本费)	2 100× 9.54%	200.34
	3. 扬生污染防治增加费	2 100×2.00%	42
	4. 定位复测费	2 100×0.03%	0.63
	5、冬季、雨季施 Ľ增加费	2 100×0.10%	2.1
	6. 夜间施工增加费	2 100×0.01%	0.21
	7. 己完工程及设备保护费	2 100× 0.02%	0.42
	8. 行车、行人干扰增加费	2 100×2.00%	42
-:	企业管理费	2 100×23.40%	491.4
四	利润	2 100× 8%	168
h	规费	11+12+14	155.694
	11. 排污费、社保费、公积金	2100×7.30%	153.3
	12. 农民工工伤保险费	2 100×0.114%	2.394
	13. 危险作业意外伤害保险费	<del>-</del>	0
六	总承包服务费 乙二人	14+15+16	0
	14. 总承包管理和协调费		0
	15. 总承包管理、协调和服务费		0
	16. 甲供材料、设备管理服务费	_	0
七	风险费	( '+ 1+-1+四+五+六)×费率	0
八	暂列金额	(一+二+三+四+五+六+七)×5%	430.139 7
九	税金	(一+二+三+四+五+六+七+八)×3.577%	323.108 (
H	建设工程造价	一+二+三+四+五+六+七+八+九	9 356.041

## ◎ 思考题与习题 〕

#### 一、简答题

- 1. 工程计价的依据主要有哪些?
- 2. 市政工程计价模式有哪两种? 分别采用什么计算方法?
- 3. 什么是工料单价? 什么是综合单价? 其单价的组成内容有何区别?
- 4. 定额计价模式与工程量清单计价模式有何区别?
- 5. 某单独排水工程,管道总长为 1 020m, 其中最大管径为 1 200mm, 管长为 90m;
- 5. 宋十级称小工程, 官是心长为 1020m, 买干最大官任为 1200mm, 官长为 90m, 次一级管径为 D1000, 管长为 210m, 试确定其工程类别。编制招标控制价时,施工组织措



施费、企业管理费及利润应按费率的中值或弹性区间费率的中值计取, 试确定其各项费用 的费率是多少。

- 6. 营改增后,采用简易计税法与采用一般计税法比较、哪些费用项目的费率是相同的? 哪些费用项目的费率是不同的?
  - 7. 营改增前与营改增后比较、税余所包括的内容及税余的费率是否相同?

### 二、计算题

1. 菜城市主干道工程, 按正常的施工组织设计、正常的施工工期并结合市场价格计算 出各部分费用见表 2-15, 试按综合单价法编制招标控制价,并将计算结果填入表 2-15 内。

序号	费用项目	计算方法 🗸	金额/万元
	工程量清单分部分项工程费	Σ(分部分项 L程量×综合单价)	1 100
	1. 人工费+机械费	Σ分部分项(人工费+机械费)	300
	措施项目费		
	(一) 施 1.技术措施项目清单费	Σ(技术措施项目 L 程量×综合单价)	250
	2. 人工费+机械费	Σ技术措施项目 人工费+机械费)	80
	(二) 施工组织措施项目费	Σ[(H-2) 施工组织措施费率]	
	3. 安全文明施工费(基本费)		
	4. 扬尘污染防治增加费	KIT	
	5. 定位复测费		
	6. 夜间施工增加费	v.XX	
	7. 已完工程及设备保护费	T. T.	
	8. 二次搬运费		
	9. 行车、行人子批增加费	VK.	
.î	其他项目费、「	77/5-	50
四	规费		
	12. 排污费、社保费、公积金		
	13. 农民工工伤保险费		
	14. 危险作业意外伤害保险费	_	0
Ŧi.	税金		
六	建设工程造价	一+二+三+四+五	

表 2-15 招标控制价(一)

2. 某小区排水管道工程,最大管径为1000mm,按正常的施工组织设计、正常的施工 工期并结合市场价格计算出各部分费用见表2-16、该工程不允许分包,材料需要二次搬运, 暂列金额按税前造价的4%计算,风险费用暂不考虑,试按工料单价法编制投标报价,并将 计算结果堆入表2-16内。

表 2-16	招标控制价(二)	

序号	费用项目	计算方法	金额/万元	
	预算定额分部分项工程费	Σ(分部分项项目工程量×工料单价)	960	
	1. 人工费+机械费	∑(定额人工费+定额机械费)	300	

## 第2章 工程量计算与计价的基本知识

用号	费用项目	计算方法	金额/万元
1	施工组织措施费	∑(1×施工组织措施费率)	
	2. 安全文明施 [费(基本费)		
	3. 扬尘污染防治增加费		
	4. 工程定位复测费		
	5. 冬季、南季施工增加费		
	6. 夜间施工增加费		
	7. 己完工程及设备保护费		
	8. 二次搬运费		
	9. 行车、行人干扰增加费	, 1	
	10. 提前竣工增加费		
=	企业管理费		
ĮД	利润		
Ti.	规费	1	
	11. 排污费、社保费、公积金	64000°	
	12. 农民工工伤保险费		
	13. 危险作业意外伤害保险费	V-	0
六	总承包服务费		
	14. 总承包管理和协调费		
	15. 总承包管理、协调和服务费	- 3.77	
	16. 甲供材料、设备管理服务费		
Ł	风险费		
八	哲列金额		
九	税金		
	建设工程造价	一+二+三+四+五+六+七+八+九	

# 第3章 建设工程定额



## 本章学习要点

- 1. 建设工程定额的概念、分类、特点、作用。
- 2. 施工定额的概念、组成和内容、作用。
- 3. 预算定额的概念、组成和内容、编制、应用。
- 4. 概算定额的概念、组成和内容、编制、作用。
- 5. 企业定额的概念、作用、编制。

## 引言

经过第2章的学习,我们可知该章引例中"某市区高架路工程的分部分项工程费为5000 万元"是依据预算定额计算得到的,那么什么是定额?什么是预算定额?还有其他定额吗? 怎样使用定额?

#### 3.1 建设工程定额概述

### 3.1.1 定额的概念

定额:"定"就是规定,"额"就是数额或额度。定额就是规定的数额或额度,是在生 产经营活动中、根据一定时期的生产力发展水平和产品的质量要求。为完成一定数量的合 格产品所需消耗的人力、物力和财力的数量标准。

一般来讲,生产力发展水平高,则生产效率高,生产过程中的消耗就少,定额所规定 的人力、物力和财力等资源消耗量应相应降低,称为定额水平高;反之,生产力发展水平 低,则生产效率低,生产过程中的消耗就多,定额所规定的人力、物力和财力等资源消耗 量应相应提高, 称为定额水平低。

## 3.1.2 市政工程定额的概念

市政工程定额是指在市政工程项目建设中,在一定的施工组织和施工技术条件下,将 科学的方法和实践经验相结合,完成质量合格的单位工程产品所必须消耗的人工、材料、 机械和资金的数量标准。

市政工程定额是在一定社会生产力发展水平下、完成市政工程中的某项合格产品与各 种生产要素(人工、材料和机械和资金)消耗之间的数量关系,反映了在一定的社会生产力 发展水平下市政工程的施工管理和技术水平。

## 3.1.3 建设工程定额的分类

建设工程定额的种类很多,如图 3.1 所示。一般按定额反映的生产因素、定额的编制 程序和用涂、定额制定单位和执行范围, 可分为以下类型。

#### 1. 按定额反映的生产因素分类

按定额反映的生产因素可分为劳动消耗定额、材料消耗定额与机械消耗定额。

1) 劳动消耗定额

劳动消耗定额简称劳动定额,也称人工定额,是指在正常施工条件下,某工种、某一



等级工人以社会平均熟练程度和劳动强度为完成单位合格工程产品所必须消耗的劳动时间 的数量标准,或在单位工作时间内完成合格产品的数量标准。



图 3.1 建设工程定额分类

劳动消耗定额按其表现形式不同,可分为时间定额和产量定额两种,两者互为倒数。

#### 2) 材料消耗定额

材料消耗定额简称材料定额,是指在正常施工条件和合理使用材料的条件下,完成单位合格工程产品所必须消耗的材料的数量标准。

材料是 L程建设中使用一定品种、规格的原材料、成品、半成品、构(配)件、燃料以及水、电等资源的统称。

#### 3) 机械消耗定额

机械消耗定额简称机械定额,是指在正常施工条件和合理的劳动组织下,使用某种施工机械完成单位合格工程产品所必须消耗的机械台班的数量标准,或在单位时间内机械完成合格工程产品的数量标准。

机械消耗定额按其表现形式不同,可分为机械时间定额和机械产量定额两种,两者互 为倒数。

由于我国习惯上以一台机械一个工作班(台班,按一台机械工作 8 小时计)为机械消耗

的计量单位, 机械消耗定额又称为机械台班消耗定额。

#### 2. 按编制程序和用途分类

按编制程序和用途可分为施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标、 丁期定额。

#### 1) 施工定额

施工定额以同一性质的施工过程或工序为测定对象,在正常的施工条件下,完成单位 合格工程产品而产生的人工、材料、机械台班消耗的数量标准。

施工定额是施工企业为组织生产和加强管理而在企业内部使用的一种定额、属于企业 生产定额性质。

施工定额由劳动定额、材料消耗定额和机械台班使用定额 3 个部分组成, 主要直接用 于 [程的施工管理, 可用于编制施工组织设计、施工预算、施工作业计划、签发施工任务 单、限额领料、结算让件工资等施工管理活动中。

施工定额的项目划分最细,是工程建设定额中的基础性定额,也是编制预算定额的 基础.

#### 2) 预算定额

预算定额是以建设工程的分项工程为测定对象,确定完成规定计量单位的分项工程所 消耗的人工、材料、机械台班的数量标准。

预算定额是一种计价性定额, 在编制施工图预算阶段, 用于计算工程造价、计算工程 所需的人工、材料、机械台班的需要量、同时可作为编制施工组织设计、工程财务计划的

预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的,同时也是编制概算定额的基础。 VK.

#### 3) 概算定额

概算定额是以扩大的分项工程为对象。确定完成规定计量单位的扩大分项工程所消耗 的人工、材料、机械台班的数量标准。

概算定额也是一种计价性定额,在扩大初步设计或技术设计阶段,用于编制(修正)设 计概算,并作为确定建设项目投资额的依据。

概算定额目划分的粗细与扩大初步设计的深度相适应, 一般是在预算定额的基础上综 合扩大而成的,同时可作为编制概算指标、投资估算指标的依据。

## 特别提示

概算定额是介干预算定额与概算指标之间的定额。

#### 4) 梅質指标

概算指标是以整个建(构)筑物为对象,以一定数量面积(或长度)为计量单位,而规定人 工、主要材料、机械的耗用量及其费用标准。

概算指标也是一种计价性定额, 在初步设计阶段, 用了编制工程初步设计概算。

概算指标的设定与初步设计的深度相适应, 是在概算定额和预算定额的基础上编制的, 比概算定额更加综合扩大。



#### 5) 投资估算指标

投资估算指标往往以独立的单项工程或完整的工程项目为计算对象,编制内容是所有 项目费用之和。

投资估算指标也是一种计价性定额,用于项目建议书和可行性研究阶段编制投资估算、 计算工程投资需要量,并作为进行项目可行性分析、项目评估和决策、设计方案的技术经 济分析等的依据。

投资估算指标比概算指标更为综合扩大、更为概略、其概略程度与可行性研究阶段相 适应。投资估算指标编制基础离不开预算定额、概算定额、是在历史实际工程的概预算、 结算资料的基础上, 通过技术分析和统计分析编制而成的。

#### 6) 工期定额

工期定额是指在一定生产技术和自然条件下,完成某个单项工程平均需用的编制天数, 包括建设工期定额、施工工期定额两个层次。

建设工期是指建设项目或独立的单项工程在建设过程中耗用的时间总量,一般以月数 或天教表示。建设下期是从开下建设开始到全部建成投产或交付使用所经历的时间,不包 括由干决策失误而停(缓)建所延误的时间。

施工工期是指单项工程或单位工程从开工到完工所经历的时间。

施丁丁期是建设丁期中的一部分。

下期定额是评价工程建设速度、编制施工进度计划及施工计划、签订承包合同的依据。

## 知识链接

工程建设的不同阶段,均需编制相应阶段的工程造价、采用或依据不同的定额、参见 表 3-1.

lyres.	项目建议 可告 研究阶段	AND MILE	and a series	- 27 L.C.	wie.c	n i i i	<b>竣工</b> 阶段	<b>交付</b> 阶段
工程 造价	投资估算	初步 设计概算	(修正) 设计概算	施工	图预算	施工预算	工程 结算	竣工 决算
依据的 定额	投资估算 指标	概算指标	概算定额	预算定额	预算定额	施工定额	预算定额	预算定额

表 3-1 工程建设阶段与工程造价、依据定额的关系表

### 3. 按定额编制单位和执行范围分类

按定额编制单位和执行范围可分为全国统一定额、地区定额、行业定额、企业定额和 补充定额。

#### 1) 全国统一定额

全国统一定额是由根据建设行政主管部门组织,综合全国 [程建设中的技术和施工组 织管理水平情况进行编制、批准、发布的, 在全国范围内使用的定额。

#### 2) 地区定额

地区定额是各省、自治区、直辖市建设行政主管部门在国家建设行政主管部门统一指

导下,考虑地区工程建设特点,对国家定额进行调整、补充编制并批准、发布,只在规定 的地区范围内使用的定额。

#### 3) 行业定额

行业定额是由行业行政主管部门组织,在国家建设行政主管部门统一指导下,依据各 行业专业工程特点、标准和规范、施工企业生产水平、管理情况等进行编制、批准、发布 的, 一般只在本行业和相同专业性质的范围内使用的定额。

#### 4) 企业定额

企业 定额是施工企业根据本企业的人员素质、机械设备程度、企业管理水平、参照国 家、行业或地方定额自行编制的、只限于本企业内部使用的定额。

企业定额是反映企业素质高低的一个重要标志,其定额水平一般应高于国家现行定额 水平,才能满足生产技术发展、企业管理和市场竞争的需要。

#### 5) 补充定额

补充定额是随着设计、施工技术的发展,现行定额不能满足需要的情况下,为了补充 缺陷而编制的定额。一般由施工企业提供测定资料,与建设单位或设计单位协商议定,并 同时报主管部门各查, 只能在限定范围内使用。\

补充定额往往成为修订正式统一定额的基础资料。

### 3.1.4 建设工程定额的特点

#### 1. 科学性

定额的科学性首先表现在用科学的态度制定定额,尊重客观实际,力求定额水平合理; 其次表现在制定定额的技术方法上,利用现代科学管理的成就,形成一套系统的、完善的, 在实践中行之有效的方法: 再次表现在定额制定和贯彻的一体化,制定是为了提高贯彻的 依据、贯彻是为了实现管理的目标、也是对定额的信息反馈。

#### 2. 系统性

建设工程定额是相对独立的系统、是由多种定额结合而成的有机的整体。它的结构复 杂,有鲜明的层次。

工程建设是庞大的实体系统, 工程建设定额是为这个实体系统服务的, 因而工程建设 本身的多种类、多层次就决定了以它为服务对象的工程建设定额的多种类、多层次。

#### 3. 统一性

为了使国民经济按照既定的目标发展,需要借助于标准、定额、参数等,对工程建设 进行规划、组织、调节、控制。而这些标准、定额、参数必须在一定范围内是一种统一的 尺度,才能利用它对项目的决策、设计方案、投标报价、成本控制等进行比选和评价。

#### 4. 权威性

工程建设定额具有很大的权威性,在一些情况下具有经济法规性质。定额的权威性反 映了统一的意志和要求, 也反映了定额的信誉和对其的信赖度。

工程建设定额权威性的客观基础是定额的科学性,只有科学的定额才具有权威性。

#### 5. 稳定性和时效性

任何一种定额都只能反映一定时期的技术发展和管理水平,因而在一段时间内表现出



稳定的状态。稳定的时间一般在 5~10 年。保持定额的稳定性是维护定额的权威性所必需的,也是有效地贯彻定额所必要的。

当工程技术和管理水平向前发展了,定额就会与已经发展了的生产力水平不相适应, 建需要重新编制或修订,所以定额又具有时效性。

## 3.1.5 建设工程定额的作用

建设工程定额是专门为工程建设而制定的定额,反映了工程建设和各种资源消耗之间 的客观规律,它的主要作用如下。

(1) 它是工程建设的依据。

建设工程具有建设周期长、投入大的特点,需要对工程建设中的资金、资源消耗进行预测、计划、调配和控制。而建设工程定额中提供的各类资金、资源消耗的数量标准,为此提供了科学的依据。

(2) 它是企业实行科学管理的依据。

建设工程定额中的施工定额所提供的人工、材料、机械台班消耗的标准可以作为企业 编制施工进度计划、施工作业计划、下达施工任务、合理组织调配资源及进行成本核算的 依据,同时定额为企业开展考核评比、开展劳动竞赛、实行计件工资和超额奖励树立了标 准尺度。

(3) 它是节约社会劳动和优化资源配置的重要手段。

企业利用建设工程定额加强管理,把社会劳动的消耗控制在合理的尺度内,可以节约 社会劳动,并促进项目投资者合理和有效地利用和分配社会劳动、合理配置生产要素、优 化资源配置。

## 3.2 施工定额

## 3.2.1 施工定额的概念

施工定额是直接用于工程施工管理的一种定额,是施工企业管理工作的基础。它是以同一性质的施工过程或工序为测定对象,在正常施工条件下完成一定计量单位的施工过程或工序所需消耗的人工、材料和机械台班的数量标准。

### 3.2.2 施工定额的组成内容

施工定额由劳动定额、材料消耗定额和机械台班使用定额3部分所组成。

1. 劳动定额

劳动定额也称人工定额。它是施工定额的主要组成部分。人工以"工日"为计量单位,

每"工目"是指一个工人工作一个工作目时间(按8小时计)。

劳动定额由于表现形式不同, 可分为时间定额和产量定额两种。

(1)时间定额;某种专业、某种技术等级工人班组或个人在合理的劳动组织与合理使用材料的条件下完成单位合格产品所必须消耗的工作时间。

定额中的工作时间包括有效工作时间(准备与结束时间,基本生产时间和辅助生产时间)、工人必需的休息时间和不可避免的中断时间。

(2)产量定额:在合理的劳动组织与合理使用材料的条件下,某工程技术等级的工人 班组或个人在单位工目中应完成的合格产品数量。

产量定额的计量单位按单位时间内生产的产品数量表示,如 m³/工日、t/工日等。其计算方法如下:

时间定额与产量定额互为倒数,即人。下

팺

ωÇ

【例 3-1】 砖石工程 初 1m³ 砖墙,规定需要 0.524 工日,每工日应砌筑砖墙 1.91m³。试确定其时间定额、产量定额。

【解】时间定额=
$$\frac{1}{1.91} \approx 0.524($$
工日/ $m^3$ )  
产量定额= $\frac{1}{0.524} \approx 1.91(m^3/$ 工日)

#### 2. 材料消耗定额

材料消耗定额是指在节约与合理使用材料的条件下, 生产单位合格产品所必须消耗一 定规格的材料、(半)成品、构(配)件的数量标准。

它包括材料净用量和材料损耗量两部分,即

材料浄用量是指直接用到工程上,构成工程实体的材料用量。材料损耗量是指在施工 过程中不可避免的损耗量,包括:施工操作损耗量、场内运输损耗量、加工制作损耗量和 现场堆放损耗量。

材料损耗量与材料净用量之比(百分数)称之为材料损耗率,即

材料损耗率 
$$-\frac{材料损耗量}{材料净用量} \times 100\%$$
 (3-7)

# 市政工程计量与计价(第三版)

PÝ.

(3-8)

材料的损耗率是通过观测和统计得到的,通常由国家有关部门确定。材料消耗量也可以表示为:

例如,浇筑混凝上构件时,由于所需混凝上材料在搅拌、运输过程中不可避免的损耗, 以及振棉后变得密实,每立方米混凝上产品往往需要消耗 1.02m³ 混凝上拌和材料。

建设工程中的材料可以分为两种类型: 次性使用材料、周转性使用材料。 次性使用材料直接构成工程实体,如水泥、碎石、砂、钢筋等。周转性使用材料在施工中可多次使用,但不构成工程实体,如脚手架、模板、挡土板、井点管等。

#### 3. 机械台班使用定额

机械台班使用定额是完成单位合格产品所必须消耗的机械台班数量标准。它分为机械时间定额和机械产量定额。

#### 1) 机械时间定额

机械时间定额就是生产质量合格的单位产品所必须消耗的某种机械工作时间。机械时间定额以某种机械一个工作日(8 小时)为一个合班进行计量。其计算方法为:

2) 机械产量定额

机械产量定额就是某种机械在一个台班时间内所应完成合格产品的数量。其计算方法 为:

机械台班产量定额 = 
$$\frac{1}{$$
机械时间定额 (3-11)

机械时间定额与机械产量定额互为倒数,即

机械时间定额 = 
$$\frac{1}{$$
机械产量定额 (3-12)

或

ΠŶ.

【例 3-2】 机械运输及吊装工程分部定额中规定安装装配式钢筋混凝土柱(构件质量在 5t以内), 每立方米采用履带吊为 0.058 台班, 试确定机械时间定额、机械产量定额。

【解】机械时间定额=0.058(合班/m3)

机械产量定额=1/0.058≈17.24(m³/台班)

## 3.2.3 施工定额的作用

- (1) 施工定额是施工队向班组签发施工任务单和限额领料单的依据。
- (2) 施工定额是施工企业编制施工组织设计和施工进度计划的依据。
- (3) 施 L 定额是加强企业成本核算和成本管理的依据。

- (4) 施工定额是贯彻经济责任制、实行按劳分配和内部承包责任制的依据。
- (5) 施工定额是编制施工预算的主要依据。
- (6) 施丁定额是编制预算定额的依据。

## 预算定额

## 3.3.1 预算定额的概念

预算定额是确定一定计量单位的合格的分项工程或结构构件的人工、材料、机械台班 消耗量的数量标准。

现行市政工程的预算定额,有全国统一使用的预算定额,如原建设部编制的《全国统 一市政工程预算定额》,也有各省、市编制的地区预算定额,如《浙江省市政工程预算定额》 (2010版)。

## 3.3.2 预算定额的作用

- (1) 预算定额是编制施工图预算,确定和控制建设工程造价的基础。
- (2) 预算定额是编制招标标底、投标报价的基础。
- (3) 预算定额是工程结算的依据。
- (4) 预算定额是施工企业进行经济活动分析的依据。
- (5) 预算定额是编制施工组织设计、施工作业计划的依据。
- (6) 预算定额是编制概算定额与概算指标的基础。

### 3.3.3 预算定额的编制

#### 1. 预算定额的编制原则

1) 桉社会平均水平确定的原则

预算定额应按照"在现有的社会正常的生产条件下,在社会平均的劳动熟练程度和劳 动强度下,制造某种使用价值所需要的劳动时间"来确定定额水平。

预算定额的平均水平是指在正常的施工条件、合理的施工组织和工艺条件、平均劳动 熟练程度和劳动强度下,完成单位分项工程基本构造所需要的劳动时间、材料消耗量、机 械台班消耗量。

## 知识链接

预算定额的水平是以大多数的施工企业的施工定额水平为基础的,但不是简单套用施

## 市政工程计量与计价(第三版)



工定额的水平; 预算定额中包含了更多的可变因素, 需要保留合理的幅度差, 如人工幅度 差、机械幅度差等。

预算定额是社会平均水平、施工定额是平均先进水平。

2) 简明话用的原则

在编制预算定额时,对于主要的、常用的、价值大的项目,分项工程划分宜细,相应 的定额步距要小一些;对于次要的、不常用的、价值小的项目,分项工程的划分可以放粗 一些,定额步距也可以适当大一些。

此外,颁算定额项目要齐全,要注意补充采用新技术、新结构、新材料而出现的新的 定额项目,并应合理确定预算定额计量单位,简化工程量的计算,尽可能避免同一种材料 用不同的计量单位。

3) 坚持统一性和差别性相结合的原则

统一性是指计价定额的制定规划和组织实施由国务院建设行政主管部门归口,并负责 全国统一定额制定和修订,颁发有关工程造价管理的规章制度、办法。

差别性是指在统一性的基础上,各部门和省、自治区、直辖市主管部门可以在自己的管辖范围内,根据本部门和本地区的具体情况、制定部门和地区性定额,制定补充性制度和管理办法,以适应我国地区间和部门间发展不平衡、差异大的实际情况。

#### 2. 预算定额的编制依据

- (1) 现行的劳动消耗定额、材料消耗定额和机械消耗定额,以及施工定额。
- (2) 现行的设计规范、施工及验收规范、质量评定标准和安全操作规程。
- (3) 具有代表性的典型工程施工图及现行的标准图。
- (4) 新技术、新结构、新材料和先进的施工方法等。
- (5) 有关科学试验, 技术测定的统计、经验资料。
- (6) 现行的预算定额、材料预算价格及有关文件规定等。

#### 3. 预算定额的编制步骤

预算定额的编制大致可以分为准备工作、收集资料、定额编制、定额审核、定额报批 和整理资料 5 个阶段。

- 1) 准备工作阶段
- (1) 拟定编制方案。
- (2) 根据专业需要划分编制小组和综合组。
- 2) 收集资料阶段
- (1) 普遍收集资料。在己确定的编制范围内,采用表格化收集定额编制基础资料,以统计资料为主,注明所需的资料内容、填表要求和时间范围。
- (2) 召开专题座谈会。邀请建设单位、设计单位、施工单位及其他相关单位的专业人员召开座谈会,就以往定额中存在的问题提出意见和建议,以便在新定额编制时加以改讲。
  - (3) 收集现行规范、规定和相关政策法规资料。
- (4) 收集定额管理部门积累的资料,包括定额解释、补充定额资料、新技术在工程实 选中的应用资料等。
- (5) 专项查定及实验资料, 主要是混凝土、砂浆试验试配资料, 还应收集一定数量的现场实际配合比资料。

- 3) 定额编制阶段
- (1) 确定编制细则,包括统一编制表格及编制方法,统一计算口径、计量单位和小数 点位数等要求。
  - (2) 确定定额的项目划分和工程量计算规则。
  - (3) 定额人工、材料、机械台班耗用量的计算、复核和测算。
  - 4) 定额审核阶段
- (1) 审核定稿。审稿主要内容: 文字表达确切通顺、简明易情: 定额数字正确无误: 童节、项目之间无矛盾。
  - (2) 预算定额水平测算。测算方法如下。
- ① 按工程类别比重测算;在定额执行范围内,选择有代表性的各类工程,分别以新旧 定额对比测算,并按测算的年限以工程所占比例加权,以考察宏观影响程度。
- ② 单项工程比较测算法: 以典型工程分别以新旧定额对比测算, 以考察定额水平的升 路及其原因。
  - 5) 定额报批和整理资料阶段
  - (1) 征求意见, 定额初稿编制完成后,需要征求各方面的意见、组织讨论、反馈意见。
  - (2) 修改、整理、报批: 修改、整理后、形成报批稿。
  - (3) 撰写编制说明。
  - (4) 立档、成卷。
  - 4. 预算定额的编制方法。
  - 1) 确定预算定额的计量单位

预算定额的计量单位是根据分部分项工程和结构构件的形体特征及其变化确定的。 般按如下方法确定。

- (I) 结构构件的长、宽、高(厚)都变化时, 可按体积以 m3 为计量单位, 如土方、湿凝 土构件等。
- (2) 结构构件的厚(高)度有一定规格,长度、宽度不定时,可按面积以 m² 为计量单位, 如道路路面、人行道板等。
- (3) 结构构件的横断面有一定形状和大小,长度不定时,可接长度以"延长米"为计 量单位,如管道、桥梁栏杆等。
  - (4) 结构构件构造比较复杂,可以个、台、座、套为计量单位。
  - (5) 工程量主要取决上设备或材料的质量,可以吨为计量单位。

预算定额中人工按工目计算,机械按台班计算,材料按自然计算单位确定。

## 特别提示

为了减少小数位数、提高预算定额的准确性、通常采取扩大单位的办法、即预算定额 通常采用 1 000m3、100m3、100m2、10m、10t 等计量单位。

2) 按典型设计图纸和资料计算工程量

通过计算典型设计图纸所包含的施工过程的工程量,有可能利用施工定额的人工、机 械、材料消耗量指标确定预算定额所包含的各工序的消耗量。

- 3) 确定预算定额各分项工程人工、材料、机械台班消耗量指标
- (1) 人工工日消耗量的确定。

预算定额的人工工日消耗量有两种确定方法: 一是以劳动定额为基础确定,由分项工程所综合的各个工序劳动定额包括的基本用工、其他用工两部分组成; 是遇劳动定额缺项时,采用现场工作日写室等测时方法确定和计算人工耗用量。

预算定额中的人工工目消耗量是指在正常施工条件下,完成定额单位分项工程所必须 消耗的人工工日数量,由基本用工、其他用工两部分组成。

① 基本用工。

基本用 L 是指完成单位分项 L 程所必须消耗的技术 L 种用 L。按综合取定的工程量和 相应的劳动定额计算。

基本用 
$$\Gamma = \sum ($$
综合取定的  $\Gamma$ 程量×施  $\Gamma$ 劳动定额)

(3-15)

(3-16)

② 其他用工。

其他用工包括辅助用工、超运距用工、人工幅度差。

- (a) 辅助用工,是指在技术工种劳动定额内不包括而在预算定额内又必须考虑的用工,如相械土方工程配合用工,材料加工用工、由程点水用工等。
- (b) 超运即用工,超运距是指预算定额所考虑的现场材料、半成品堆放地点到操作点的平均水平运距超过劳动定额中已包括的场内水平运距的部分。

超运距 预算定额取定运距 劳动定额已包括的运距



实际工程现场运距超过预算定额取定运距时,可另行计算现场二次搬运费。

(c) 人工幅度差,是指劳动定额中未包括而在正常施工情况下不可避免但又很难准确计量的用工和各种工时损失。它包括:各工种间的工序搭接及交叉作业相互配合或影响所发生的停歇用工,施工机械的基础。场内班组操作地点的转移动所造成的停工;质量检查和隐蔽工程验收工作的影响。场内班组操作地点的转移用工,工序交接时对前一工序不可避免的休整用工,施工中不可避免的其他零星用工。

人工幅度差=(基本用工+辅助用工+超运距用工)×人工幅度差系数 (3-17) 人工幅度差系数一般为 10%~15%.

人工工日消耗量=基本用工+辅助用工+超运距用工+人工幅度差

=(基本用工+辅助用工+超运距用工)×(1+人工幅度差系数) (3-18)

(2) 材料消耗量的确定。 预算完類中的 A L L 日消耗量量指力

预算定额中的人工工日消耗量是指在正常施工条件下,完成定额单位分项工程所必须 消耗的材料、成品、半成品、构(配)件及周转性材料的数量。

预算定额中材料按用途划分为以下 4 类。

- ① 主要材料: 指直接构成工程实体的材料,其中也包括半成品、成品,如混凝土。
- ② 辅助材料: 指直接构成工程实体,但用量较小的材料,如铁钉、铅丝等。
- ③ 周转材料: 指多次使用, 但不构成工程实体的材料, 如脚手架、模板等。
- ④ 其他材料: 指用量小、价值小的零星材料, 如棉纱等。

预算定额的材料消耗量由材料的净用量和损耗量构成, 预算定额材料消耗量的确定方 法与施工定额中材料消耗量的确定方法一样。

#### (3) 机械台班消耗量的确定。

预复定额的机械台班损耗量是指在正常施工条件下,完成定额单位分项工程所必须消 耗的某种型号施工机械的台班数量。一般按施工定额中的机械台班产量并考虑一定的机械 幅度差进行计算。

机械台班消耗量 施工定额机械耗用台班消耗量×(1+机械幅度差系数) (3-19) 预算定额中的机械幅度差包括: 施工技术原因引起的中断及合理的停歇时间: 因供电 供水故障及水电线路移动、 检修而发生的中断及合理的停歇时间; 因气候原因或机械本身 故障引起的中断时间,施工机械在单位工程之间转移所造成的机械中断时间,各工种间的 下序搭接及交叉作业相互配合或影响所发生的机械停歇时间。质量检查和隐蔽下程验收下 作引起的机械中断时间: 施工中不可避免的其他零星的施工机械中断或停歇时间。

#### 4) 预算定额基价的确定

预算定额基价由人工费、材料费、机械费组成。

定额基价=人工费+材料费+机械费 人工费=人工工目消耗量※火工工目单价 材料势= $\sum$ (材料消耗量×材料单价) 机械费= \(\(\sigma\) (机械台班消耗量×机械台班单价)

5) 编制定额项目表、拟定有关说明

定额项目表的一般格式是:横向排列各分项工程的项目名称, 竖向排列分项工程的人 工、材料、机械台班的消耗量。有的项目表下方还有附注,说明设计有特殊要求时,如何 讲行调整换宽。

## 3.3.4 市政工程预算定额的组成及基本内容

#### 1. 预算定额的组成

《浙江省市政工程预算定额》(2010版)共计8册;第一册《通用项目》、第二册《道路 工程》、第三册《桥涵工程》、第四册《隧道工程》、第五册《给水工程》、第六册《排水工 程》、第七册《燃气与集中供热工程》、第八册《路灯工程》。

#### 2. 预复定额的基本内容

预算定额 一般由目录, 总说明, 册、意说明, 定额项目表, 分部分项工程表头说明, 定额附录组成。

1) 目录

目录 上要用于查找,将总说明、各类工程的分部分项定额顺序列出并注明页数。

2) 总说明

总说明综合说明了定额的编制原则、指导思想、编制依据、话用范围及定额的作用, 定额中人工、材料、机械台班用量的编制方法、定额采用的材料规格指标与允许换算的原 则,使用定额时必须遵守的规则,定额在编制时已经考虑和没有考虑的因素,以及有关规 定、使用方法。



在使用定额前, 应先了解并熟悉这部分内容。

#### 3) 册、章说明

册、章说明是对各章、册各分部工程的重点说明,包括定额中允许换算的界限和增减 系数的规定等。

#### 4) 定额项目表及分部分项表头说明

定额项目表是预算定额最重要的部分,每个定额项目表列有分项 E程的名称、类别、规格、定额的计量单位、定额编号、定额基价,以及人 E、材料、机械台班等的消耗量指标。有些定额项目表下列有附注,说明设计与定额不符时如何调整,以及其他有关事项的说明。

分部分项表头说明列于定额项目表的上方,说明该分项 [程所包含的主要 [序和 [作内容。

#### 5) 定额附录

附录是定额的有机组成部分,包括机械台班预算价格表,各种砂浆、混凝土的配合比及各种材料名称规格表等,供编制预算与材料换算用。

预算定额的内容组成形式如图 3.2 所示。



图 3.2 预算定额的内容组成

## 3.3.5 市政工程预算定额的应用

#### 1. 预复定额项目的划分

预算定额的项目根据工程种类、构造性质、施工方法划分不同的分部工程、分项工程。 例如市政工程预算定额共分为上石方工程、道路工程、桥梁工程、排水工程等分部工程、 道路工程由路基、基层、面层、平侧石、人行道等分项工程组成。沥青混凝土道路面层又 分为粗粒式、中粒式、细粒式及不同厚度的子目等。

#### 2. 预算定额项目表

预算定额项目表列有:工作内容、计量单位、项目名称、定额编号、消耗量、定额基 价及定额附注等内容。

- 1) 工作内容
- 工作内容是说明完成本节定额的主要施工过程。
- 2) 计量单位

每一分项工程都有一定的计量单位,预算定额的计量单位是根据分项工程的形体特征、 变化规律或结构组合等情况选择确定的。一般来说, 当产品的长、宽、高 3 个度量都发生 变化时,采用 m3 或 t 为计量单位,当两个度量不固定时,采用 m3 为计量单位,当产品的 截而大小基本固定时,则用 m 为计量单位,当产品采用上述3种计量单位都不适宜时,则 分别采用个、座等自然计量单位。为了避免出现过多的小数位数,定额常采用扩大计量单 位,如 10m3、100m3等。

3) 项目名称

项目名称是按构(配)件划分的,常用的和经济价值大的项目划分得细些,一般的项目 划分得粗些。

4) 定额编号

定额编号基指定额的序号,其目的是便于检查使用定额时,项目套用是否正确合理。 起减少差错、提高管理水平的作用。定额手册均用规定的编号方法——二符号编号。第一 个号码表示属定额第几册,第二个号码表示该册中子目的序号。两个号码均用阿拉伯数字 表示。

例如:人工挖土方三类土

水泥混凝土路面塑料膜养护

定额子目编号 1-2

定额子目编号 2-207

5) 消耗量

消耗量是指完成每一分项产品所需耗用的人工、材料、机械台班消耗的标准。其中人 正定额不分工种、等级、列合计工数。材料的消耗量定额列有原材料、成品、半成品的消 耗量。机械定额有两种表现形式;单种机械和综合机械。单种机械的单价是一种机械的单 价,综合机械的单价是几种机械的综合单价。定额中的次要材料和次要机械用其他材料费 和其他机械带表示。

6) 定额基价

定额基价是指定额的基准价格,一般是省的代表性价格,实行全省统一基价,是地区 调价和动态管理调价的基数。

## 市政工程计量与计价(第三版)

定额基价=人工费+材料费+机械费	(3-20)
人工费=人工综合工日×人工单价	(3-21)
材料费= $\sum$ (材料消耗量×材料单价)	(3-22)
\$\$-∑(机械与进源转骨×机械与进用份)	(2.22)

7) 定额附注

定额附注是对某一分项定额的制定依据、使用方法及调整换算等所做的说明和规定。



预算定额项目表下方的附注通常与定额的换算套用有关,故需特别注意。

例如, 水泥混凝上路面(抗折强度 4.0MPa、厚 20cm)这个定额项目的预算定额表如下。

- (1) 工作内容: 放样、混凝上纵缝涂沥青油、拌和、浇筑、捣固、抹光或拉毛。
- (2) 计量单位: 100m2。
- (3) 项目名称: 20cm 厚水泥混凝上路面(抗折强度 4.0MPa, 现拌)。
- (4) 定额编号: 2-193。
- (5) 基价: 5 571 元。
- (6) 消耗量: 人工消耗量为 22.440 TU(二类人工): 材料消耗量包括抗拆混凝土、水及 其他材料费, 其中抗折混凝土的消耗量为 20.300m³; 机械消耗量包括混凝土搅拌机、平板 式混凝土振捣器, 插入式混凝土振捣器, 水泥混凝土填空吸水机, 其中混凝土搅拌机的消 耗量为 0.743 台班。

## 特别提示

注意《浙江省市政工程预算定额》(2010版)的定额项目表中小数点的有效位数。

- (1) 人工、材料、机械的消耗量;小数点后保留 3 位小数。
- (2) 人工费、材料费、机械费:小数点后保留 2 位小数。
- (3) 定额基价: 取整数。

#### 3. 预算定额的查阅

- (1) 按分部→定额节→定额表→项目的顺序找到所需项目名称,并从上向下目视。
- (2) 在定额表中找出所需人工、材料、机械名称,并自左向右目视。
- (3) 两视线交点的数量,即为所查数值。

#### 4. 预算定额的应用

预算定额的应用主要包括预算定额的套用、换算和补充。

- 1) 预算定额的套用
- 套用预算定额包括直接使用定额中的人工、材料、机械台班用量,人工费、材料费、 机械费及基价。

在套用预算定额时,应根据施工图或标准图及相关设计说明,选择预算定额项目,对每个分项工程的工作内容、技术特征、施工方法等进行核对,确定与之相对应的预算定额项目。

预算定额的套用方式主要有: 直接套用、合并套用、换算套用。

(1) 直接套用。

当分项于程的设计内容与预算定额的项目工作内容完全一致时,可以直接套用定额。 当分项工程的设计内容与预算定额的项目工作内容不一致时。如定额规定不允许换算和调 整的, 也应直接套用定额。

【例 3-3】 人工挖一、二类十方 1 000 m3、试确定套用的定额子目编号、基价、人工工 日消耗量及所需人工工日的数量。

【解】人工挖土方套用的定额子目编号为[1-1],定额计量单位为100m3。

基价=371(元/100m3)

人工工日消耗量=9.280(工日/100m3)

工程数量=1000/100=10(100m3) 所需人工工日数量=10×9 280=92 8(千日)

(2) 合并套用。

当分项于程的设计内容与预算完额的两个及以上项目的总工作内容完全一致时,可以 合并套用定额。

【例 3-4】 人工运土方,运距 40m, 试确定套用的定额子目编号、基价及人工工日消 耗量.

【解】 查用的定额子目编号: [1-28]+[1-29]

基价 533+115 648(元/100m3)

人工工日消耗量=13.320+2.880=16.200(工日/100m3)

(3) 换复套用。

当分项工程的设计内容与预算定额的项目工作内容不完全一致时,不能直接套用定额。 而定额规定允许换算和调整时,可以按照预算定额规定的范围、内容、方法进行调整换算。

经过换算的定额项目,应在其定额子目编号后加注"换"或加注"H",以示区别。

2) 预算定额的换算

预算定额的换算主要有:系数换算、强度换算、材料换算、厚度换算等。

(1) 系数换算。

此类换算是根据预算定额的说明(总说明、章说明等)、定额附注规定,对定额基价或 其中的人工消耗量、材料消耗量、机械消耗量乘以规定的换算系数, 从而得到新的定额基 价。

換算后的基价=原定额基价+∑调整部分金额×(调整系数-1) (3-24)

【例 3-5】 人工挖沟槽土方,三类湿土,深 2m。试确定套用的定额子目,基价及人工 工日消耗量.

【解】根据《浙江省市政工程预算定额》(2010版)第一册第一章土石方工程的章说明第 三条: 挖云湿土时,人工(消耗量)应乘以系数 1.18、定额套用时需进行换算。

> 人工挖沟槽湿土(三类土、挖深 2m 内)套用定额子目: [1-8]H 调整后的人工工日消耗量 33.920×1.18≈40.026(工日) 换算后的基价= $40.026 \times 40 \approx 1.601( 元/100 \text{ m}^3)$

血

或换算后的基价=1 357+1 356.80×(1.18 1)≈1 601(元/100m3)

(2) 强度换算。

当预算定额项目中混凝土或砂浆的强度等级与施工图设计要求不同时,定额规定可以 按算。

換算时,先查找两种不同强度等级的混凝土或砂浆的预算单价并计算出其价差,再查 找定额中该分项工程的定额基价及混凝土或砂浆的定额消耗量,最后进行调整,计算出换 算后的定额基价。

换算后的基价-原定额基价+(换入单价 换出单价)×混凝土或砂浆的定额消耗量(3-25)

【例 3-6】 某浆砌料石桥台,采用 M10 水泥砂浆砌筑,试确定套用的定额子目、基价。

【解】定额子目: [3-156]H

定额中用 M7.5 水泥砂浆, 而设计要求用 M10 水泥砂浆。

M7.5 水泥砂浆单价=168.17(元/m3), M10 水泥砂浆单价=174.77(元/m3)

水泥砂浆的定额消耗量=0.920m3

換算后基价=3 098+(174 77-168 17)×0 920≈3 105(元/10m3)

【例 3-7】 某排水管道的钢筋混凝土平基、采用观浇现拌 C20(40)混凝土,试确定其套用的定额子目、基价。

【解】定额子目: [6-276]H

定额中用现浇现拌 C15(40)混凝土,而设计要求用现浇现拌 C20(40)混凝土。

C15(40)混凝土单价。183.25(元/m³), C20(40)混凝土单价。192.94(元/m³)

C15(40)混凝土的定额消耗量=10.150m3

換算后基价=2 843+(192.94-183.25)×10.150≈ 2 942(元/100m3)

(3) 材料换算。

当预算定额项目中材料规格、品种与施工图设计要求不同时、定额规定可以换算。

换算时,先竟找两种不同规格、品种的材料单价并计算出其价差,再查找定额中该分项工程的定额基价及该材料的定额消耗量,最后进行调整、计算出换算后的定额基价。

换算后的基价-原定额基价+(换入单价 换出单价)×材料的定额消耗量 (3-26)

【例 3-8】 某道路工程采用花岗岩人行道板、下铺 2cmM7.5 水泥砂浆卧底、花岗岩人行道板的单价为 66 元/m²、试确定人行道板铺设套用的定额子目、基价。

【解】定额子目: [2-215]H

定额中采用的人行道板单价为 20 元/m2。

人行道板的定额消耗量=103.000m2

换算后基价=3 346+(66-20)×103.000 ≈ 8 084(元/100m2)

(4) 厚度换算。

当预算定额项目中的厚度与施工图设计要求不同时,可以依据预算定额的说明或附注 进行调整换算,并计算出换算后的基价。

【例 3-9】 某道路工程采用 250mm×250mm×50mm 的预制人行道板,下铺 3cmM7.5 水泥砂浆卧底,试确定人行道板铺设套用的定额子目、基价。

【解】定额子目: [2 215]H

定额中采用 2cmM7 5 水泥砂浆、设计采用 3cmM7 5 水泥砂浆。

根据《浙江省市政工程预算定额》(2010版)第二册第四章人行道及其他的童说明第三 条: 各类垫层厚度、配合比如与设计不同时、材料、搅拌机械应进行调整(按厚度比例)、 人工不变、定额套用时需进行换算。

定额中水泥砂浆的消耗量=2.120m3

调整后水泥砂浆的消耗量=2.120× $\frac{3}{2}$ =3.180(m³)

定额中灰浆搅拌机的消耗量=0.350 台班

调整后灰浆搅拌机的消耗量= $0.350 \times \frac{3}{2}$ =0.525(台班)

换算后基价=3 346+(3.180-2.120)×168.17+(0.525-0.350)×58.57≈3 535(元/100m²)

## 特别提示

当预算定额项目中的厚度与施工图设计要求不同时。也可以采用内插法讲行换算套用。 如道路底基层的设计厚度与定额不同时,可以采用内插法进行定额基价的调整换算。

当预算定额项目中的厚度与施工图设计要求不同时,也可以利用每增(减)子目进行定 额某价的调整换算.

#### (5) 其他換算。

除了上述几种换算外,若施工方法与预算定额中分项工程的常规施工方法不一致时、 需要进行调整换算。如《浙江省市政工程预算定额》(2010版)总说明第十一条规定:本定 额中现浇泥凝土项目分现拌混凝土、商品混凝土。商品混凝土定额已按结构部位取泵送或 非泵送,如果实际施工方式与定额不同时,除混凝土单价换算外,人工、机械调整如下。 ①泵送商品混凝上调整为非泵送商品混凝土。定额人工乘以系数 1.35, 并增加相应普通混 凝上子目中垂直运输机械的含量。②非泵送商品混凝土调整为泵送商品混凝土;定额人工 乘以系数 0.75, 并扣除定额子目中垂直运输机械的含量。

【例 3-10】 某桥梁承台、混凝土强度等级为 C20、施工时采用非泵送商品混凝土、试 确定套用的定额子目、基价.

#### 【解】定额子目: [3-216]H

定额中采用 C20 泵送商品混凝土,施工时采用 C20 非泵送商品混凝土。

C20 泵送商品混凝土的单价=299 元/m3, C20 非泵送商品混凝土的单价=285 元/m3。

C20 泵送商品混凝土的定额消耗量=10.150m3。

定额的人工消耗量=2.650 工日, 定额人工乘以系数 1.35.

相应普通混凝土子目为[3 215], 其中垂直运输机械为履带式电动起重机(5t), 其消耗量 =0.550 台班, 台班单价为 144.71 元。

换算后基价=3 182+(285 ·299)×10.150+113.95×(1.35-1)+144.71×0.550  $=3.251(\pi/10\text{m}^3)$ 

3) 预算定额的补充

当分项工程的设计要求与定额条件完全不相符时,或者由于设计采用新结构、新材料



及新工艺施工方法, 在预算定额中没有这类项目, 属于定额缺项时, 叮编制补充预 算定额。



### 概算定额的概念



概算定额是在预算定额的基础上,确定完成合格的单位扩大分部分项工程或扩 人结构构件所需消耗的人工、材料、机械台班的数量标准,概算定额又称为扩大结 构定额。

【参考图】】

### 3.4.2 概算定额与预算定额的区别与联系

- (1) 概算定额是预算定额的综合与扩大。概算定额将预算定额中有一定联系的若干分项工程定额子目进行合并、扩大,综合为一个概算定额子目。
- 如"现浇钢筋混凝土柱"概算项目,除了包括柱的混凝土浇筑这个预算定额的 分项工程内容外,还包括柱模板的制作、安装、拆除,钢筋的制作安装,以及抹灰、 砂浆等预算定额的分项工程内容。
  - (2) 概算定额与预算定额在编排次序、内容形式、基本使用方法上是相近的。
- 两者都以建(构)筑物的结构部分和分部分项工程为单位表示的,内容也包括人工、材料、机械使用量三个基本部分。

## 概算定额的作用

- (I) 概算定额是初步设计阶段编制设计概算、扩大初步设计阶段编制修正设计概算的主要依据。
  - (2) 概算定额是对设计项目进行技术经济分析比较的基础资料之一。
  - (3) 概算定额是建设工程项目编制主要材料计划的依据。
  - (4) 概算定额是编制概算指标的依据。

### 3.4.4 概算定额的编制原则

(1) 应贯彻社会平均水平的原则,应符合价值规律、反映现阶段的社会生产力平均水平。概算定额与预算定额水平之间应保留必要的幅度差,应留有5%的定额水平差,以使得设计概算能真正地起到控制施工图预算的作用。

- (2) 应有一定的深度目简明适用。概算定额的项目划分应简明、齐全、便于计算、概 算定额结构形式务必简化、准确、适用。
  - (3) 应保证其严密性、准确性。概算定额的内容和深度是以预算定额为基础的综合和 扩大,在合并中不得遗漏或增减项目,以保证其严密性和准确性。

### 3.4.5 概算定额的编制步骤

概算定额的编制一般分3个阶段进行。

- (1) 准备阶段。主要工作是确定编制机构和人员组成、进行调查研究、了解现行概算 定额执行情况和存在的问题。明确编制的目的。制定编制方案。确定概算定额的项目。
- (2) 编制初稿阶段。主要工作是根据已经确定的编制方案和概算定额的项目,收集和 整理各种编制依据,对各种资料进行深入细致的测算和分析,确定人工、材料、机械台班 的消耗量指标,编制概算定额初稿。
- (3) 审查定稿阶段。主要工作是测算概算定额的水平,包括测算现编概算定额与原概 算定额以及现行预算定额之间的定额水平差,概算定额水平与预算定额水平之间应有 5% 以内的幅度差。

测算的方法既要分项进行测算,又要以单位工程为对象进行测算。概算定额经测算比 较后,可报送国家授权机关审批。

## 3.4.6 概算定额的组成内容

概算定额的内容基本上由文字说明、定额项目表和附录三部分组成。

- 文字说明。包括真说明和分部工程说明、真说明主要阐述概算定额的编制依据、 使用范围、包括的内容和作用、应遵守的规则等:分部工程说明主要阐述分部工程包括的 综合工作内容及分部工程的工程量计算规则等。
- (2) 定额项目表。由若干分节定额组成、是概算定额的主要内容。各节定额由工程内 容、定额表、附注说明组成。定额表中列有定额编号、计量单位、概算基价、人工、材料、 机械台班的消耗量指标。
  - (3) 附录。包括各种附表,如土类分级表等。

## 企业定额

### 3.5.1 企业定额的概念

企业定额是指建筑安装企业根据本企业的技术水平和管理水平,自行编制确定的完成 单位合格产品所必需的人工、材料、机械台班以及其他生产经营要素消耗的数量标准。

## 市政工程计最与计价(第三版)

企业定额是建筑安装企业的生产力水平的反映, 只限于本企业内部使用, 是供企业内部进行经营管理、成本核管和投标报价的企业内部文件。

## 3.5.2 企业定额的作用

- (1) 企业定额是施工企业进行工程投标,编制工程投标报价的依据。
- (2) 企业定额是编制施工预算,加强企业成本管理的基础。
- (3) 企业定额是企业计划管理和编制施工组织设计的依据。
- (4) 企业定额是计算劳动报酬、实行按劳分配的依据, 也是企业激励工人的条件。
- (5) 企业定额是推广先进技术的必要手段。
- (6) 企业定额是编制预算定额和补充单位估价表的基础。

## 3.5.3 企业定额编制原则

#### 1、平均先进原则

企业定额应以平均先进水平为基准编制企业定额。

平均先进水平是在正常的施工条件下,经过努力可以达到或超出的平均水平。平均 先进性考虑了先进企业、先进生产者达到的水平,特别是实践证明行之有效的改革施工 工艺、改革操作方法、合理配备劳动组织等方面所取得的技术成果,以及综合确定的平均先进数值。

#### 2. 简明适用性原则

企业定额结构要合理,定额步距大小要适当,文字要通俗易懂,计算方法要简便,易 于掌握运用,具有广泛的适应性,能在较大范围内满足各种需要。

#### 3. 独立自主编制原则

企业应自主确定定额水平,自主划分定额项目,根据需要自主确定新增定额项目,同 时要注意对国家、地区及有关部门编制的定额的维承性。

#### 4. 动态管理原则

企业定额是一定时期内企业生产力水平的反映,在一段时间内是相对稳定的,但这种 稳定有时效性,当其不再适应市场竞争时,就需要重新进行修订。

## 3.5.4 企业定额的编制步骤

#### 1. 制订《企业定额编制计划书》

《企业定额编制计划书》一般包含以下内容。

#### 1) 企业定额编制的目的

企业定额编制的目的一定要明确,因为编制目的决定了企业定额的适用性,同时也决定了企业定额的表现形式。例如,企业定额的编制如果是为了控制工耗和计算工人劳动报酬,应采取劳动定额的形式;如果是为了企业进行工程成本核算,以及为企业走向市场、参与投标报价提供依据,则应采用施工定额或定额估价表的形式。

#### 2) 企业定额水平的确定原则

企业定额水平的确定, 是企业定额能否实现编制目的的关键。如果定额水平过高, 背 离企业现有水平, 使定额在实施讨程中, 企业内多数施工队、研组、工人通过努力仍然达 不到定额水平,不仅不利于定额在本企业内推行,还会影响管理者和劳动者双方的积极性。 如果定额水平过低。不但起不到鼓励先进和督促落后的作用。而且也不利于对项目成本进 行核算和企业参与市场竞争。因此, 在编制计划书时, 必须合理确定定额水平。

#### 3) 确定编制方法和定额形式

定额的编制方法很多,对不同形式的定额其编制方法也不相同。例如,劳动定额的编 制方法有技术测定法、统计分析法、类比推算法、经验估算法等。材料消耗定额的编制方 法有观察法、实验法、统计法等。因此,定额编制究竟采取哪种方法应根据具体情况而定。 企业定额编制通常采用的方法有两种; 定额测算法和方案测算法。

#### 4) 成立企业定额编制机构

企业定额的编制工作是一个系统工程,需要一批高素质的专业人才在一个高效率的组 织机构统一指挥下协调工作。因此,在京额编制工作开始时,必须设置一个专门的机构。 配置一批专业人员。

#### 5) 明确应搜集的数据和资料

定额在编制时需要搜集大量的基础数据和各种法律、法规、标准、规程、规范文件、 规定等,这些资料都是定额编制的依据。所以,在编制计划书时,要制定一份按门类划分 的资料明细表。在明细表中、除一些必须采用的法律、法规、标准、规程、规范资料外。 应根据企业自身的特点、选择一些能够适合本企业使用的基础性数据资料。

## 6) 确定编制期限和进度计划

定额是有时效性的, 所以应确定一个合理的编制期限和进度计划, 既有利于编制工作 的开展,又能保证编制工作的效率。 ※

#### 2. 搜集资料。讲行分析、测算和研究

搜集的资料应包括以下几个方面。

- (1) 现行定额,包括基础定额和预算定额。
- (2) 国家现行的法律、法规、经济政策和劳动制度等与工程建设有关的各种文件。
- (3) 有关建筑安装工程的设计规范、施工及验收规范、工程质量检验评定标准和安全 操作规程。
- (4) 现行的全国通用建筑标准设计图集、安装工程标准安装图集、定型设计图纸、有 代表性的设计图纸、地方建筑配件通用图集和地方结构构件通用图集, 并根据上述资料计 笕 厂程量, 作为编制定额的依据。
  - (5) 有关建筑安装工程的科学试验、技术测定和经济分析数据。
  - (6) 高新技术、新型结构、新研制的建筑材料和新的施工方法等。
  - (7) 现行人工工资标准和地方材料预算价格。
  - (8) 现行机械效率、寿命周期和价格,以及机械台班和赁价格行情。
- (9) 本企业近几年各工程项目的财务报表、公司财务总报表,以及历年收集的各类经 济数据。

## 市政工程计量与计价(第三版)

- (10) 本企业近几年各下程项目的施工组织设计、施工方案、以及工程结算资料。
- (11) 本企业近几年发布的合理化建议和技术成果。
- (12) 本企业目前拥有的机械设备状况和材料库存状况。
- (13) 本企业目前工人技术素质、构成比例、家庭状况和收入水平。

资料收集后,要对上述资料进行分类整理、分析、对比、研究和综合测算,提取可供 使用的各种技术数据。内容包括:企业整体水平与定额水平的差异,现行法律、法规以及 规程、规范对定额的影响,新材料、新技术对定额水平的影响等。

- 3. 拟定编制企业定额的工作方案与计划
- (1) 根据编制目的,确定企业定额的内容及专业划分。
- (2) 确定企业定额的册、章、节的划分和内容框架。
- (3) 确定企业定额的结构形式及步距划分原则。
- (4) 具体参编人员的工作内容、职责、要求。

#### 4. 企业定额初稿的编制

1) 确定企业定额的项目及其内容

企业定额项目及其内容的编制就是根据定额的编制目的及企业自身的特点,本省内容简明适用、形式结构合理、步距划分合理的原则,将一个单位工程按工程性质划分为若干个分部工程,如市政道路专业的路基处理、道路基层、道路面层、人行道及其他等。然后将分部工程划分为若干个分项工程。如道路基层分为石灰粉煤灰土基层、不灰粉煤灰碎石基层、粉煤灰土海基层、水泥稳定碎石基层、塘流成层、碎石底层等分项工程。最后,确定分项工程的步距,根据步距将分项工程进一步详细划分为具体项目。步距参数的设定一定要合理,既不宜过粗,也不宜过细。同时应对分项工程的工作内容进行简明振要的说明。

### 2) 确定定额的计量单位

分项工程计量单位的确定一定要合理, 应根据分项工程的特点, 本着准确、贴切、方便计量的原则设置。

#### 3) 确定企业定额指标

确定企业定额指标是企业定额编制的重点和难点。企业定额指标的编制,应根据企业 采用的施工方法、新材料的替代以及机械设备的装备和管理模式,结合搜集整理的各类基础资料进行确定。确定企业定额指标包括确定人工消耗指标、确定材料消耗指标、确定机械分斑消耗指标等。

### 4) 编制企业定额项目表

定额项目表是企业定额的主体部分,由表头和人工栏、材料栏、机械栏组成。表头部分表述各分项工程的结构形式、材料规格、施工做法等;人工栏是以工种表示的消耗工日数及合计;材料栏是按消耗的主要材料和辅助材料依主次顺序分列出的消耗量;机械栏是按机械种类和规格型号分列出的机械台班耗用量。

#### 5) 企业定额的项目编排

定额项目表中, 大部分是以分部工程为章, 把单位工程中性质相近、材料大致相同的 施工对象编排在一起。每章再根据工程内容、施工方法和使用的材料类别的不同, 分成若 于个节(即分项下程)。在每节中、根据施工要求、材料类别和机械设备型号的不同、细分 成不同子目。

- 6) 企业定额相关项目说明的编制
- 企业定额相关的说明包括:前言、总说明、目录、分部(或分章)说明、工程量计算规 则、分项工程工作内容等。
  - 7) 企业定额估价表的编制

企业根据投标报价工作的需要,可以编制企业定额估价表。企业定额估价表是在人工、 材料、机械台班3项消耗量的企业定额的基础上。用货币形式表达每个分项工程及其子目 的定额单位估价计算表格。

企业定额估价表的人工、材料、机械台班单价是通过市场调查,结合国家有关法律文 件及规定, 按照企业自身的特占来确定的。

### 5 评审、修改及组织实施企业定额

通过对比分析、专家论证等方法,对定额的水平、适用范围、结构及内容的合理性 以及存在的缺陷进行综合评估。并根据评审结果对定额进行修正、最后定稿、刊发并组 织牢施。

# € 思考颢与习颢

- 1. 什么是定额?
- 2. 按定额反映的生产因素,建设工程定额可以分为哪几种?
- 3. 按编制程序和用途,建设工程定额可以分为哪几种?
- 4. 什么是施工定额? 什么是劳动定额? 它的表现形式可以分为哪两种?
- 5. 什么是预算定额? 预算定额与施工定额有什么区别?
- 6. 预算定额中的人工工日消耗暑由哪两部分组成,什么是基本用工,其他用工包括什 么? 什么是人工幅度差?
  - 7. 预算定额的材料消耗量包括哪两部分? 预算定额中的材料分成哪 4 类?
  - 8. 预算定额中的机械幅度差包括哪些内容?
  - 9. 预算定额有哪些组成内容?
  - 10. 预算定额表由哪几部分组成?
- 11、根据《浙江省市政工程预算定额》(2010版),试确定[1-323]定额子目中人工的消 耗量、轻型井点井管的40、胶管的50的消耗量、污水泵的100的消耗量。
- 12. 定额项目表中的人工费是如何计算的? 材料费是如何计算的? 机械使用费是如何 计算的?
  - 13. 定额项目表中的基价是如何计算的?
  - 14. 预算定额的套用有哪几种基本方式方法?
  - 15. 什么是概算定额? 概算定额与预算定额有什么区别?
  - 16. 什么是企业定额? 企业定额与预算定额有什么不同?

HAR THE PERSON NAMED IN POST OF PERSON NAMED IN POST O



# 市政工程定额计价模式 下的计量与计价

HAR THE PERSON NAMED IN POST OF PERSON NAMED IN POST O

# 第4章《通用项目》预算定额 应用

### 本章学习要点

- 1. 预算定额总说明。
- 2. 通用项目工程量计算规则、计算方法
- 3. 通用项目定额的套用和换算。





某工程雨水管道平面图、管道基础图如下、管道采用钢筋混凝土管,基础采用钢筋混凝土条形基础。管道沟槽开挖采用挖掘机在沟槽边挖土,土质为三类土。计算这段管道沟槽开挖的总土方量,并确定套用的定额子目及其基价。在管道沟槽开挖土方计算时应注意什么? 定额套用时要注意什么?





- (1)《浙江省市政工程预算定额》(2010版)(以下简称本定额)共分8册,包括第一册《通 用项目》、第二册《道路工程》、第三册《桥涵工程》、第四册《隧道工程》、第五册《给水 工程》、第六册《排水上程》、第七册《燃气与集中供热工程》、第八册《路灯工程》。
  - (2) 全部使用国有资金或国有资金为主的工程建设项目,编制招标控制价应执行本定额。
- (3) 本定额人工按用工的技术含量综合为一类人工、二类人工,其内容包括基本用工、超运距用工、人工幅度差和辅助用工。其中上石方工程人工为一类人工,单价为 40 元/工日,其余为二类人工,单价为 43 元/工日。
- (4) 本定额中的材料消耗包括主要材料、辅助材料,材料消耗已计入相应的损耗,包括:现场运输损耗(从 L地仓库、现场集中堆放点或现场加工点到操作地点或安装点的现场运输过程中的损耗)、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。

本定额中的周转性材料已按规定的材料周转次数摊销计入定额。

用量少或价值小的材料合并为其他材料费,以其他材料费的形式表示。

本定额材料单价按《浙江省建筑安装材料基期价格》(2010版)取定。

- (5) 本定额中的施工机械台班消耗量已包括机械幅度差内容。机械台班单价按《浙江 省施工机械台班费用定额》(2010 版)取定。
- (7)本定额中现浇混凝上项目分为现拌混凝土、商品混凝土。商品混凝土定额中已按结构部位取定泵送或非泵送,如果实际施工方式与定额所列方式不同时,除混凝土单价换管外,人工、机械调整如下。
- ① 泵送商品混凝土调整为非泵送商品混凝土;定额人工乘以系数 1.35,并增加相应普通混凝土;已额人工乘以系数 1.35,并增加相应普通混凝土子目中垂直运输机械的含量。
- ② 非泵送商品混凝上调整为泵送商品混凝上;定额人工乘以系数 0.75,并扣除定额子目中垂直运输机械的含量。

# 特别提示

泵送商品混凝土、非泵送商品混凝土的材料单价不同、在换算时应注意混凝土单价的 换算。

【例 4-1】 某污水厂工程, 某一现浇钢筋混凝土池体的池壁牛腿现场浇筑, 混凝土强度等级为 C20, 施工时采用泵送商品混凝土, 确定套用的定额子目及基价。

【解】套用的定额子目: [6.658]H

该子目中采用的 C20 非泵送商品混凝土单价为 285 元/m3

C20 泵送商品混凝土单价为 299 元/m3

该子目中垂直运输机械(15t 履带式起重机)的含量为 0.499 台班

换算后基价=3 423+(299-285)×10.150-0.499×515.34 $\approx$ 3 308(元/10 $m^3$ ) 注, 冤误商品混凝十调整为非冤误商品混凝十的例题详见第 3 章【例 3-9】

- (8) 本定额中未列商品混凝土的子目,实际采用商品混凝土时,按相应的现拌混凝土 定额执行,除混凝土单价换复外。人工、机械调整如下。
- ① 采用泵送商品混凝土的:定额人工乘以系数 0.4,并扣除定额子目中混凝土搅拌机、水平及垂直运输机械台班含量。
- ② 采用非泵送商品混凝上的: 定额人工乘以系数 0.55, 并扣除定额子目中混凝上搅拌 机、水平运输机械台班含量。

【例 4-2】 某排水管道工程, 检查井井室盖板现场预制时采用非泵送的商品混凝土, 混漏土强度等级为 C20, 确定套用的定额子目及基价。

【解】 套用的定额子目: [6-337]H

该子目中采用的 C20(40) 现涤现拌混凝土单价为 192.94 元/m3

C20 非泵送商品混凝土单价为 285 元/m3

该子目中混凝土搅拌机(350L 混凝土搅拌机)台班含量为 0.589 台班

该水平运输机械(机动翻斗车1t)台班含量为0.800台班

換算后基价=3 590+(285 192.94)×10.150-0.589×96.72 0.800×109.73  $\approx 4380(\bar{\pi}/10m^3)$ 



- (9) 本定额中各类砌体所使用的砂浆均为普通现拌砂浆,若实际使用预拌(干混或湿拌)砂浆,按以下方法调整。
- ① 使用于混砂浆砌筑的,除将规拌砂浆数量同比例调整为干混砂浆外,另按相应定额中每立方米砌筑砂浆和除02 厂日,灰浆搅拌机台班数量乘以系数 0.6。
- ② 使用湿拌砂浆砌筑的,除将现拌砂浆数量同比例调整为湿拌砂浆外,另按相 应定额中每立方米砌筑砂浆扣除 0.45 厂厂,并扣除灰浆搅拌机台班数量。
- 【例 4-3】 某桥梁工程浆砌块石桥台,采用 M7.5 干混砂浆砌筑,确定套用的定额子目及基价。

【解】套用的定额子目: [3-153]H

该子目中采用的 M7.5 水泥砂浆单价为 168.17 元/m3

M7.5 干混砂浆单价为 405.45 元/m3

该子目中灰浆搅拌机(200L 灰浆搅拌机)台班含量为 0.310 台班

換算后基价=2 266+(405.45-168.17)×3.670-3.670×0.2×43-0.310×(1-0.6)×58.57
≈ 3 098(元/10m³)

- (10) 本定额中混凝土及钢筋混凝土预制桩、小型预制构件等制作的工程量计算, 应按施工图构件净用量另加15%损耗率。
- (11) 本定额中, 钢模板(含钢支撑)的问库维修费己按其材料单价的8%计入消耗量; 钢模板(含钢支撑)、木模、脚手架的场外运费己按机械台班形式计入定额子目,不另外单独计算。
  - (12) 本定额中用括号"( )"表示的消耗量均未让入基价。
- (13) 本定额中注有"××以内"或"××以下"的均包括"××"本身; 注有"××以外"或"××以上"的均不包括"××"本身。



《通用项目》是浙江省市政工程预算定额(2010版)的第一册,包含上石方工程, 打拔工具桩,围堰工程,支撑工程,拆除工程,脚手架及其他工程,护坡、挡上墙, 地下连续墙,地基加固、围护及监测,共9章;此外还包括附录。

### 4.2.1 土石方工程



七石为 L程定额包括人 L挖七力, 人 L挖沟槽、基坑七方, 人 L清理七堤基础, 人 L挖土堤台阶, 人 L装、运上方, 人 L挖淤泥、流砂, 人 L 平整场地、填土夯实、原土夯实, 推土机推上, 挖掘机挖土, 装载机装松散土, 装载机装运上方, 自卸汽车运土, 抓铲挖掘机挖淤泥、流砂, 烟带式挖掘机挖淤泥、流砂, 机械平整场地、

\_\_\_\_

填上夯实、原土夯实,人工凿石,机械凿石,人工打眼爆破石方,机械打眼爆破石方,明 挖石方运输,推上机推石渣,挖掘机挖石渣,自卸汽车运石渣等相应子目。

XIV、XV、XVI 共 16 类。 其中 I、II 类对应本定额中"一、二类土", III 类对应本定额中"三类土", IV 类对应本定额中"四类土", 从一类上到四类土、土壤的紧固系数越来越大。

其中 V 类对应本定额中"松石", VI、VII、VIII、类对应本定额中"次坚石", IX、X 类对应本定额中"普坚石", XI、XIII、XIII、XIV、XV、XVI 类对应本定额中"特坚石"。从松石到特坚石,岩石的紧固系数越来越大。

#### 2. 干湿土的划分及换算说明

- (1) 下、湿土的划分首先以地质勘探资料为准,含水率≥25%为湿土;或以地下常水位 为准,常水位以上为干土,以下为湿土。
- (2) 挖运湿土时,人工和机械乘以系数 1.18(机械运湿土除外),干、湿土工程量分别计算。采用井点降水的土方应按干土计算。

# 特别提示

机械或人工挖湿土, 套用定额时需换算; 人工运湿土, 套用定额时也需换算; 机械运湿土时, 套用定额不需要换算, 采用井点降水时, 由于是先把地下水位降到沟槽(基坑)底标高以下一定的安全距离后再开挖土方, 所以采用井点降水的土方应按干土计算。

【例 4-4】 人工挖沟槽三类湿土,挖深 5m,确定套用的定额子目及基价。

【解】套用的定赖子目: [1-10]H

换算后的人工消耗量= $50.8000 \times 1.18=59.944($ 工日) 换算后基价= $59.944 \times 40 \approx 2.398($ 元/ $100m^3$ )

或 换算后的基价=2 032+2 032.00×(1.18-1) ~ 2 398(元/100m³)

### 3. 十方的不同体积及换算

- (1)(挖、运)土、石方体积均以天然密实体积(自然方)计算,回填上按碾压夯实后的体积(实方)计算。
  - (2) 土方体积换算见表 4-1。

表 4-1 十方体积换算表

单位: m3

虚方体积	天然密实体积	碾压夯实后体积	松填体积
1.00	0 77	0 67	0.83
1.30	1.00	0.87	1.08
1.50	1 15	1.00	1.25
1.20	0.92	0.80	1.00





虚方体积是指挖出以后或回填以前松散的土方体积。松填体积是指用于回填、未经夯实、自然堆放的土方体积。

【例 4-5】 某道路工程,挖土方量为 1800 m³,填土方量为 500 m³,挖、填土考虑现场平衡,试计算其土方外运量。

【解】挖、运土方体积均以自然方计算;填土方体积以实方计算

故需把本例中的填土方体积转换为自然方

查表 4-1 可知, 实方:自然方=1:1.15

本例中填土所需自然方=500×1.15=575(m3)

则土方外运量 1800-575-1225(m3)

- 4. 沟槽、基坑土石方、一般土石方、平整场地的划分
- (1) 开挖底宽≤7m, 且底长大于3倍底宽, 按沟槽上石方计算。
- (2) 开挖底长≤3 倍底宽, 且底面积≤50m², 按基坑士石方计算。
- (3) 厚度≤30cm 的就地挖、填土按平整场地计算。
- (4) 超出上述范围的土石方,接一般土石方计算。

# 特别提示

常见的市政工程中,管道工程的土石方开挖通常按挖沟槽土石方计算;道路工程的土石方开挖通常按挖一般土石方或平整场地计算;桥梁工程的土石方开挖通常按挖基坑土石方计算。

- 5. 沟槽土石方(挖、填)
- 1) 沟槽挖方
- (1) 工程量计算规则及计算方法。
- ① 除有特殊工艺要求的管道节点开挖土石方工程量按实计算外,其他管道接口 作业坑和沿线各种井室所需增加开挖的七方工程量,按沟槽全部土方量的2.5%计算。 根据上述工程量计算规则,管道沟槽挖方可按下式计算:

$$V_{12} = S \times L \times (1 + 2.5\%)$$
 (4-1)

式中 V拉——沟槽挖方, m3;

S 某管段沟槽开挖平均断面面积, m2;

L——沟槽升挖长度,即管段的长度,m。

# 知识链接



如某管段的沟槽开挖断面示意图(图 4.1)所示, 计算该管段沟槽开挖平均断面面积, 寓首先确定沟槽开挖的断面尺寸, 包括: 沟槽底宽(B+2b)、沟槽边坡(1:m)、管段的沟槽平均挖深 H.

【参考图文】




图 4.1 沟槽开挖断而示音图

图中, B为管道结构宽, b为管沟底部每侧工作面宽度。图示管道沟槽挖方可按下式计算:

$$V_{\kappa} = (B+2b+mH)\times H\times L\times (1+2.5\%)$$
 (4-2)

V+---挖干土的方量,m³

H。--湿土的深度, m。

- ② 管道结构宽的确定。
- 根据管道基础结构图、结合施工方法按以下规则确定管道结构宽;
- (a) 管道无管座时, 管道结构宽按管道外径计算;
- (b) 管道有管座时, 管道结构宽按管道基础外缘(不包括各类垫层)计算;
- (c) 构筑物结构宽按基础外缘计算;
- (d) 如设挡土板,结构宽每侧加 100mm。

# 特别提示

營道采用網筋混凝土条形基础时,基础基础外缘的宽度就是平基的宽度。 沟槽开挖如设挡土板,则管沟底部每侧增加 100mm.



- (a) 按施工组织设计确定的管沟底部每侧工作面宽度计算;
- (b) 如施工组织设计未明确的,可按表 4-2 计算。







(4-4)

【参考图文

结表

	混凝土管道	混凝土管道基		构筑物	
Telli Essentia	基础 90	础>90°	2.3.472.2	无防潮层	有防潮层
1 000 以内	500	500	400	400	
2 500 以内	600	500	400	400	600

# 知识链接

UPVC、HDPE 等塑料管沟槽开挖底宽的确定。

- (1) 设计中有规定的,按设计规定的底宽计算。
- (2) 设计未明确的,根据沟槽有无支撑,分别按下面规则确定。
- ① 沟槽无支撑:沟槽底宽按管道结构宽每侧加 30cm 工作面计算。
- ② 沟槽有支撑: 按表 4-3、根据管径、挖深确定沟槽底窗、

麦 4-3 有支撑沟槽开挖底宽

单位, mm

一 售役 深度/m	-JW10U	- JNEE	_nog/	F. HI	nou		_Noc-	080
≤3.00	800	900	,1 000	1 100	1 200	1 300	1 500	1 700
≤4.00	_	1 100 5	1 200	1 300	1-400	1 500	1 700	1 900
>4.00	_	7/1	V_	1 400	1 500	1 600	1 800	2 000

- ④ 沟槽边坡的确定。
- (a) 按施工组织设计确定的沟槽边坡计算:
- (b) 如施工组织设计未明确的, 可按表 4-4 计算。

4-4 放坡系数

Zerokowa Sale	放坡起点深				
2	18 18 id/m	在海槽坑爬作业	在海情玩迎上作业	沿海槽方向作业	人工开栏
·、 类上	1.2	1:033	1:075	1:033	1:050
- 类 上	1.5	1:025	1:050	1:025	1:033
四类上	2.0	1:010	1:033	1:010	1:025

# 特别提示

如在同一断面内遇有数类土壤, 其放坡系数可按各类土占全部深度的百分比加权计算。

【例 4-6】 某沟槽开挖断面如图 4.2 所示, 试计算沟槽开挖的放坡系数。

【解】放坡系数  $m = \frac{1.5}{2.3} \times 0.5 + \frac{0.8}{2.3} \times 0.33 \approx 0.44$ 

沟槽开挖边坡为: 1:0.44



图 4.2 沟槽开挖断面图

⑤ 管道十字或斜向交叉,沟槽挖上交接处产生的重复工程量不扣除。

管道走向相同,在施工过程中采用联合槽开挖时,沟槽挖土交接处产生的重复工程量 应扣除,如图 4.3 所示。




图 4.3 联合槽开挖断面示意图

⑥修建机械上下坡的便道上方量并入上方工程量内。 (行 ) 采用爆破开挖时,开挖坡面每侧允许超挖量; 松、次坚石 20cm, 普、特坚石 15cm。工作面宽度与石方超挖量不得重复计算, 石方超挖仗计算坡面超挖, 底部翻挖不计。

### 特别提示

- (1) 石方爆破开挖工作面宽度与石方超挖量不得重复计算。
- (2) 石方爆破开挖底部超挖不计。
- (3) 人工凿石不得计算超挖量。
- (2) 定额套用及换算说明。
- ① 机械挖沟槽、基坑土方中如需人工辅助开控(包括切边、修整底边), 机械挖土按实 挖土方量计算, 人工挖土土方量按实套用相应定额乘以系数 1.25, 挖上深度按沟槽、基坑 总深确定, 垂直深度不再折合水平运输距离。

# 知识链接

按照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008)的规定,管道在沟槽开 挖时,严禁扰动槽底原状土。在采用挖掘机开挖沟槽时,为防止扰动槽底原状土,距离槽 底 20~30cm,用人工辅助开挖。

【例 4-7】 某排水工程 W1~W3 管段沟槽放坡开挖,采用挖掘机挖土并装车开挖(沿沟槽方向作业),人工辅助清底。土壤类别为三类于土;该管段原地面平均标高为 3.80m,槽



底平均标高为 1.60m, 施工组织设计确定沟槽底宽(含工作面)为 1.8m, 沟槽全长为 70m, 机械挖土挖至槽底标高以上 20cm 处, 其下采用人工开挖。试分别计算机械挖 +及人工校+数量, 并确定套用的定额子目及基价。

【解】沟槽开挖深度-3.80-1.60=2.20(m)

土壤类别为三类土, 需放坡, 查表 4-4 可知放坡系数为 0.25。 土石方总量  $V_n = (1.8 + 0.25 \times 2.2) \times 2.2 \times 70 \times 1.025 \approx 370.95 (m^3)$ 

(1) 人工辅助开挖方量  $V_{\text{AT}} = (1.8 + 0.25 \times 0.2) \times 0.2 \times 70 \times 1.025 \approx 26.55 \text{(m}^3\text{)}$ 

套用的定额子目: [1-9]H

换算后基价=1695×1.25≈2119(元/100m3)

(2) 机械挖方量 V === 370.95-26.55 ≈ 344.4(m3)

套用的定额子目: [1-60] 基价=3 812 元/1 000m<sup>3</sup>

② 在支撑下挖土,按实挖体积人工乘以系数1.43,机械乘以系数1.20。先开挖 后支撑的不属于支撑下挖土。

# 知识链接



而污水管道沟槽开挖时常用的支撑形式主要有铜板桩支撑、竖撑、横撑。铜板 桩支撑施工时先将板桩打入沟槽底以下一定的入土深度,再进行沟槽开挖。竖撑、 横撑施工时,先开挖部分土方,随挖随支,逐步设置支撑到沟槽底。

【参考图文】

【例 4-8】 某管段采用挖掘机挖沟槽土方、土质为一、二类干土、不装车、沟槽 采用钢板桩支撑、确定套用的定额子目及基价。

【解】套用的定额子目: [1-56]H

换算后基价=2 124+192.00×(1.43-1)+1 931.64×(1.2-1)=2 593(元/1 000m3)

③ 挖上机在垫板上作业,人工和机械乘以系数 1.25, 搭拆垫板的人工、材料和铺机摊销费按每 1.000m³增加 230 元计算。

【例 4-9】 挖掘机在垫板上挖三类土、不装车、确定套用的定额子目及基价。

【解】套用的定额子目: [1-57]H

换算后基价=2 458+192.00×(1.25-1)+2 265.54×(1.25-1)+230 ≈ 3 302(元/1 000m3)

④ 人工挖沟槽、基坑上方,一侧弃上时,乘以系数 1.13。

【例 4-10】 人工挖沟槽,三类湿土、深 5m,一侧弃土,确定套用的定额子目及基价。

【解】套用的定额子目: [1-10]H

換算后基价=2 032×1.18×1.13 ≈ 2 709(元/100m3)

⑤ 人工挖沟槽或基坑内的淤泥、流砂,按"人上挖淤泥、流砂"套用定额,挖深超过1.5m时,超过部分工程量按垂直深度每1m折合成水平距离7m增加工日,深度按全高计算。

【例 4-11】 人工挖沟槽淤泥,挖深 4.3m,确定套用的定额子目及基价。

【解】(1) 挖深不超过 1.5m 的部分。套用的定额子目为[1 35]

基价=2.530(元/100m3)

(2) 挖深超过 1.5m 的部分。

挖深 4.3m 折合成水平运距-4.3×7=30.1(m)

套用的定额子目: [1-35]+[1-36]+[1-37]

基价=2 530+994+481=4 005(元/100m3)

- ⑥ 挖密实的钢渣, 按挖四类上人工乘以系数 2.50, 机械乘以系数 1.50。
- ⑦ 人工凿沟槽、基坑石方按"人工凿石"定额乘以系数1.4。
- ⑧ 挖掘机挖石方爆破后的石渣, 定额中人工含量乘以系数 2.0。
- 2) 沟槽回填方
- (1) 工程量计算规则及计算方法。

管沟回填土应扣除各种管道、基础、垫层和构筑物(主要是沿线检查井)所占的体积。 沟槽间填工程量按下式计算。

$$V_{\text{HM}} = V_{\text{HZ}} - V_{\text{Sym}} \tag{4-5}$$

VI

式中 V ~ 一管道沟槽的挖方量(包括沿线检查并), m3:

- (2) 定额套用及换算说明。
- ① 槽、坑 侧填土时, 乘以系数 1.13。
- ② 定额中所有填土(包括松填、夯填、碾压)均是按就近 5m 内取土考虑的,超过 5m 按以下办法计算;就地取余松土或堆积土回填者,除按填方定额执行外,另按运土方定额 计算上方运输费用,外购上方者,应按实计算上方外购费用。

### 6. 基坑土石方(挖、填)

- 1) 基坑挖方
- (1) 工程量计算规则及计算方法。

基坑挖方工程量按以下通用公式计算:

$$V_{12} = (S_{1} + S_{+} + 4S_{+})/6 \times H$$
 (4-6)

式中  $S_{\pm}$ 、 $S_{\mp}$ 、 $S_{\pm}$  基坑上顶面、下顶面、中截面的面积, $m^2$ ;

H---基坑挖深, m。

矩形基坑挖方工程量按以下通用公式计算:

(方形)
$$V_{\text{#}}=(B+2b+mH)\times(L+2b+mH)\times H+\frac{m^2H^3}{3}$$
 (4-7)

(週形)
$$V_{12} = \frac{\pi H}{3} \left[ (R+b)^2 + (R+b) \times (R+b+mH) + (R+b+mH)^2 \right]$$
 (4-8)

式中 V:----挖土体积, m3;

B---结构宽, 即基坑内构筑物的基础宽度, m;

L——结构长度,即基坑内构筑物的基础长度,m:

R——结构半径,即基坑内构筑物的基础半径,m:

m---放坡系数:

b——每侧工作面宽度, m(构筑物底部设有防潮层时, 每侧工作面宽度取 0.6m; 不

设防潮层时,每侧工作面宽度取 0.4m);

H----基坑挖深, m。

(2) 定额套用及换算说明。

基坑挖方定额的套用方法与沟槽挖方基本相同。

- 2) 基坑回填方
- (1) 工程量计算规则及计算方法。

基坑回填上应扣除基坑内构筑物、基础、垫层所占的体积。

基坑回填工程量的计算与沟槽回填土工程量的计算方法相同。

(2) 定额套用及换算说明。

基坑回填定额的套用方法与沟槽回填基本相同。

- 7. 一般土石方(挖、填) 1) 工程量计算规则及计算方法
- 一般土石方工程挖方、填方工程量的计算通常采用模截而法或方格网法计算。
- (1) 横截面法计算。

常见的市政道路工程路基模截面形式有填方路基、挖方路基、半填半挖路基和不填不 按路基,如图 4.4 所示。

根据路基横截面图(道路逐桩或施工横断面图)可以计算每个截面处的挖方/填方面积,取两邻截面挖方/填方面积的平均值乘以相邻截面之间的中心线长度,计算相邻两截面间的 挖方/填方工程量,合计可得整条道路的挖方/填方工程量。



图 4.4 路基橫截面形式

横截面法计算公式如下:

$$V = \frac{(F_1 + F_2)}{2} \times L \tag{4-9}$$

式中 V---挖方量或填方量, m3;

 $F_1$ 、 $F_2$ ——相邻两个横断面的挖方或填方面积, $\mathbf{m}^2$ ;

L--相邻两横断面的距离。m。



市政道路工程的挖方、填方通常为一般土石方工程,计算工程量时,可以依据道路工

程施工图中的逐桩或施工器断面图或上方计算表进行。

【例 4-12】 某道路工程, 十方计算表见表 4-5, 计算 0+000~0+050 段填方量、挖方量、

One:	土方面	ī叙/m²	平均面积/m²		土方		- m³
CMAR.	挖方	填方	挖方	填方		挖方	填方
0+000	11.5	3.2	12.15	1.60	50	(57.5	80
0+050	14.8	0.0	13.15	1.00	50	657.5	80
0-050	19.0	0.0	11.50	3.05	40	460	122
0+090	8.2	6.1	77.00	5100		100	
			10.80	3.05	45	486	137.25
0+135	13.4	0.0					
			_			1 /02 6	220.26

表 4-5 土方量计算表

【解】 $V_{12} = \frac{(11.5 + 14.8)}{2} \times 50 = 657.5 \text{ (m}^3\text{ )}$  $V_{\text{sg}} = \frac{(3.2+0)}{2} \times 50 = 80 \text{ (m}^3)$ 

特别提示

在市政城市道路下、均铺设了排水管道、如原地面标高高于设计道路上路基标高时、 如图 4.5 所示, 挖着不能重复计算。



图 4.5 排水工程与道路工程挖、填方工程量示意图

### (2) 方格网法计算。

合计

大面积挖填方可采用方格网法计算,方格网法计算控(填)方量的步骤如下。

① 根据场地大小,将场地划分为 10m×10m 或 20m×20m 的方格网。根据地形起伏情 况或精度要求,可选择适当尺寸的方格网,有5m×5m、10m×10m、20m×20m、50m×50m、 100m×100m 的方格。方格越小, 计算的准确性就越高。

将各方格网加以编号, 可标注在方格网中间。将各角点加以编号, 可标注在角点左 下方。

② 确定每个方格网的 4 个角点的原地面标高、设计标高, 计算出各个角点的施工高度。 在方格网各角点右上方标注原地面标高、在方格网各角点右下方标注设计路基标高,

并计算方格网各角点的施工高度、将其标注在角点左上方。

施工高度 h=原地面标高 设计路基(开挖线)标高

施丁高度为正数需挖方: 施丁高度为负数需填方。

(4-10)

③ 计算确定每个方格网络条边上零点的位置,并将同一方格网内的零点连接得到零 线。零点即施工高度为零的点、即方格网边上不填不挖的点。零线将方格网划分为挖方区 域、填方区域。

如图 4.6 所示, 方格网边长为 a, 图中标示其中一条边的两个角点的施工高度为 h, h(h), ho一个为正值、一个为负值),则该边上零点位置的计算公式如下:

$$x = \frac{|\mathbf{h}_1|}{|\mathbf{h}_1 + |\mathbf{h}_2|} \times a \tag{4-11}$$

式中 x---角点至零点的距离, m:

h. h .---- 相邻两角点的施工高度, m:

一方格网的边长, m。






图 4.6 零点位置计算示意图

知识链接

当某个方格网某一边线上的 2 个角点施工高度同为正值或同为负值、则在该边线上不 存在零点: 当方格网装一边线上的 2 个角点施工高度一个为正值,另一个为负值,则在该 边线肯定存在零点。

方格网的 4 个角点施工高度可能存的不同情况、零线将方格网划分成挖方区域、填方 区域存在以下不同的情况: ①四点控: ②一点填、三点控: ③两点填、两点控: ④三点填、 一点挖: ⑤四点填。各种情况分别如图 4.7(a)、(b)、(c)、(d)、(e)所示。




图 4.7 方格网挖方、填方区域划分示意图

(4-12)

④ 计算各方格网挖方或填方的体积。

$$V=F\times H$$

式中 V——各方格网挖方或填方的体积, $m^3$ ;

F——各方格网挖方或填方区域的底面积, $m^2$ ;

H——各方格网挖方或填方区域的平均挖深或平均填高, m。

- ⑤ 合计各方格网挖方或填方的体积,可得到整个场地的挖方或填方工程量。
- 2) 定额套用及换算说明
- (1) 人工挖(一般)土方, 挖深超过 1.5m 应计算人工垂直运输 上方的费用, 超过部分工程量按垂直深度每 1m 折合成水平距离 7m 增加工日,深度按全高计算。
  - (2) 人工挖(一般)上方,砾石含量在30%以上密实性上壤按四类上乘以系数1.43。

【例 4-13】 某工程场地方格网如图 4.8 所示,方格网边长 20m, 计算其挖、填土方的工程量。




图 4.8 某工程方格网示意图(单位: m)

### 【解】(1) 计算零点位置。

方格 A: h1=-0.15m, h2=0.24m, a=20m

代入式(4-11)得: 
$$x = \frac{20 \times 0.15}{0.15 + 0.24} = 7.7$$
(m)  
 $a - x = 20 - 7.7 = 12.3$ (m)

方格 D: 
$$x = \frac{20 \times 0.44}{0.44 + 0.23} = 13.1 \text{(m)}$$
,  $a - x = 20 - 13.1 = 6.9 \text{(m)}$ 

方格 B、 C、 E、 F 的各边均无零点。

将各零点标示图上,并将零点连成线,如图 4.8 所示。

(2) 计算方格十方量(表 4-6)。



### 表 4-6 方格十方量计算

方格编号	底面图形及位置	挖方/m <sup>3</sup>	填方/m³
A	三角形(填) 梯形(挖)	$\frac{20+12.3}{2} \times 20 \times \frac{0.23+0.24}{4} = 37.95$	$\frac{0.15}{3} \times \frac{20 \times 7.7}{2} = 3.85$
В	正方形(挖)	$20^{7} \times \frac{(0.23 + 0.24 + 0.47 + 0.54)}{4}$	
С	正方形(挖)	$20^2 \times \frac{(0.54 + 0.47 + 0.90 + 0.94)}{4} = 285$	
D	梯形(挖、填)	$\frac{12.3 + 6.9}{2} \times 20 \times \frac{0.23 + 0.24}{4} = 22.56$	$\frac{7.7 + 13.1}{2} \times 20 \times \frac{0.15 + 0.44}{4} = 30.68$
E	正方形	$20^2 \times \frac{(0.23 + 0.24 + 0.47 + 0.27)}{4} = 121$	· /.
F	正方形	$20^2 \times \frac{(0.47 + 0.27 + 0.94 + 1.03)}{4} = 271$	
	小 计	885.51	34.53

### 8. 平整场地

- 1) 工程量计算规则及计算方法
- 按平整场地的面积计算。
- 2) 定额套用

按人工平整场地或机械平整场地不同的施工方式套用定额。

### 9. 土石方运输

1) 工程量计算规则及计算方法

土石方运输的工程量按挖方工程量减填方工程量计算。

$$V_{\text{\tiny NG}} = V_{\text{\tiny PL}} - V_{\text{\tiny PL}} \times 1.15$$

(4-13)

 $V_{v}$ 的值为正,则有多余七方需外运; $V_{v}$ 的值为负,则需运入七方用于回填。

- 2) 定额套用及换算说明
- (1) 土石方运距应以挖土重心与填土重心或弃土重心最近距离计算,挖土重心、填土 重心、弃土重心按施工组织设计确定。如遇下列情况应增加运距;
- ① 人力及人力车运士、石方上坡坡度在 15%以上, 推土机重车上坡坡度大于 5%, 斜 道运距按斜道长度乘以表 4-7 中对应的系数计算。

表 4-7 推土机、人力及人力车系数

项 目		Hr:	± 4/1.		人力及人力车
坡度/%	5~10	15 以内	20 以内	25 以内	15 以上
系 数	1.75	2	2.25	2.5	5



按表 4-7 调整后的斜道远距用于确定套用的定额子目;斜道运上石方工程量按斜道长

度计算其方量(体积)。

【例 4-14】 推士机推士上坡,三类土, 斜道长度为 20m, 坡度为 12%, 确定套用的定额子目及基价。

【解】斜道运距=20×2=40(m)

套用的定额子目: [1-48]

基价=3 008 元/1 000 m3

【例 4-15】 人力(双轮翻斗车)运湿土、斜道长 50m、坡度 20%、确定套用的定额子目及基价。

【解】斜道云距=50×5=250(m)

套用的定额子目: [1-30]H+[1-31]H×4

换算后基价=461.20×1.18+91.20×1.18×4≈975(元/100m)

② 采用人力垂直运输上、石方,垂直深度每米折合水平运距 7m 计算。

【例 4-16】 人力垂直运输土方深度 3m, 另加水平距离 5m, 试计算其运距。

【解】人力运土运距=3×7+5=26(m)

(2) 自卸汽车运土、运石渣的运距与定额不一致时,可按每增 1km 定额子目进行调整 换算。

【例 4-17】 某道路工程需土方外运、运距是 6km、采用 12t 自卸汽车运输,试确定自卸汽车运土的定额子目及基价。

【解】套用的定额子目: [1-68]+[1-69]×5

换算后基价=5 269+1 264×5=11 589(元/1 000m3)

(3) 人工装土汽车运土时,汽车运土 1km 以内定额中自卸汽车含量乘以系数 1.10。

【例 4-18】 某道路工程需土方外运, 运距是 6km, 用人工将土方装到 12t 自卸汽车上 外运, 试确定自卸汽车运土的定额子目及基价。

【解】套用的定额子目: [1-68]H+[1-69]×5

换算后基价=5 269+7.760×(1.10-1)×644.78+1 264×5=12 089(元/1 000m3)

- (4) 推土机推土的平均土层厚度小于 30cm 时, 其推土机台班乘以系数 1.25。
- 10. 其他
- (1) 人工挖土堤台阶工程量,按控前的堤坡斜面积计算,运上应另行计算。
- (2) 夯实上堤按设计断面计算。清理上堤基础按设计规定以水平投影面积计算,清理 厚度为30cm 内,废土运距按30m 计算。
  - (3) 人工夯实上堤执行人工填上夯实平地 f 目; 机械夯实上堤执行机械填上夯实平地 f 目。
  - (4)本章定额不包括现场障碍物清理,障碍物清理费用另行计算。弃上、石方的场地占用费按当地有关规定处理。

### 4.2.2 打拔工具桩

打拔工具桩定额包括竖、拆打拔桩架,陆上卷扬机打拔圆木桩,陆上卷扬机打拔槽形



钢板桩、陆上挖掘机打圆木桩、陆上挖掘机打槽形钢板桩、水上卷扬机打捞圆木桩、水上 卷扬机打拔槽形钢板桩、水上柴油打桩机打圆木桩、水上柴油打桩机打槽形钢板桩等相应 子目。



要注意工具桩与基础桩的区别。

### 1. 丁程量计算规则

- (1) 圆木桩,按设计桩长 L(检尺长)和圆木桩小头直径 D(检尺径)查《木材、立木材积 谏笪表》, 计算圆太桩体积。
  - (2) 钢板桩: 按设计桩长×钢板桩理论质量(t/m)×钢板桩根数, 计算钢板桩质量。
  - (3) 凡打断、打弯的桩,均需拔除重打,但不重复计算工程量。
- (4) 竖、拆打拔桩架次数,按施工组织设计规定计算。如无规定时,按打桩的进行方 向:双排桩每100延长米、单排桩每200延长米计算一次,不是一次者均各计算一次。
  - 2. 定额套用及换算说明
- (1) 打拔桩工程土质类别划分为甲级土、乙级土、丙级土。定额仅列甲、乙两级土的 打拔工具桩项目,如遇丙级上时,按乙级上的人工及机械乘以系数 1.43。
- (2) 定额中所指的水上作业是以距岸线 1.5m 以外或者水深在 2m 以上的打拢桩。距岸 线 1.5m 以内时, 水深在 1m 以内者, 按陆上作业考虑; 奶水深在 1m 以上 2m 以内者, 其 工程量则按水、陆各 50%计算。



岸线是施工期间最高水位时, 水面与河岸的相交线,

(3) 打拔工具桩均以直桩为准,如遇打斜桩(包括俯打和仰打),按相应定额人工、机械 乘以系数 1.35.

【例 4-19】 水上柴油打桩机打圆木桩(斜桩): 7.级土,桩长 5m,确定定额子目、基价。

【解】套用定额子目: [1-172]H

换算后的基价=3 896+(1 158.12+1 135.82)×(1.35-1)  $\approx$  4 699(元/10m<sup>3</sup>) 【例 4-20】 水上卷扬机拔圆木桩(斜桩)、桩长 6m, 丙级土, 确定定额子目、基价。

【解】套用定额子目: [1-158]H

换算后的基价  $1.461+(888.38+572.18)\times(1.35\times1.43-1)\approx2.820(元/10m^3)$ 

- (4) 简易打桩架、简易拔桩架均按木制考虑,并包括卷扬机。
- (5) 圆木桩按磁打计算。钢制桩按密打计算。如钢板桩需磁打时、按相应定额人工乘 以系数 1.05。

【例 4-21】 水上卷扬机疏打槽形钢板桩(斜桩),桩长 9m,乙级主,确定定额子目、 基价.

【解】 套用定额子目: [1 162]H

换算后的基价 2 381+535.35×(1.35×1.05 1)+765.50×(1.35 1)  $\approx$  2 872(元/10m<sup>3</sup>)

- (6) 打捞桩架90°调面及超运距移动已综合考虑。
- (7) 水上打拔工具桩按两艘驳船捆扎成船台作业,驳船捆扎和拆除费用按第三册《桥涵工程》的相应定额执行。
  - (8) 导桩及导桩夹木的制作、安装、拆除、已包括在相应定额中。
  - (9) 拔桩后如需桩孔回填的,应按实际回填材料及其数量进行计算。
- (10) 本册定额中, 圆木和槽钢为摊销材料, 其摊销次数及损耗系数分别为 15 次、1.053 和 50 次、1.064。

如使用租赁的钢板桩,则按租赁费计算,计算公式为:

钢板桩租赁费=钢板桩实际使用量×(1+损耗系数)×

考虑到钢板桩在实际施工中为可周转材料, 放钢板桩使用量应为实际投入量, 而 非定额用量。钢板桩的实际投入量及使用天数应根据现场鉴证或施工记录进行确定。

(11) 钢板桩和木桩的防腐费用等, 已包括在其他材料费用中。

### 4.2.3 围堰工程

围堰工程包括上草围堰、上石混合围堰、圆木桩围堰、钢桩围堰、钢桩围堰、钢板桩围堰、 双层竹笼围堰、筑岛填心等相应子目。

### 1. 工程量计算规则

- (1) 上草用堰、上石混合用堰: 工程量按围堰的施工斯面乘以围堰中心线的长度 计算。
- (2) 圆木桩围堰、钢桩围堰、钢板桩围堰、双层竹笼围堰: 工程量按围堰中心线的长度计算。



【参考图文

- (3) 筑岛填心: C程量按填筑体积计算。筑岛填心子目是指在围堰围成的区域内填土、砂及砂砾石。
  - (4) 围堰高度按施工工期内的最高临水面加 0.5m 计算。

河道横断面如图 4.9 所示,围堰高度计算如下。

$$H_1=5.00-2.00+0.5=3.500(m)$$

如果河底有淤泥,厚0.5m,则堰高应为 $H_2=3.5+0.5=4.00$ (m)




图 4.9 河道横断面示意图

(5) 施工围堰的尺寸按有关设计施工规范、施工组织设计的规定确定;未规定时,按定额尺寸取定。

# 市政工程计量与计价(第三版)

- ① 十草围堰的堰顶宽为1~2m、堰高为4m以内。
- ② 上石混合围堰的堰顶宽为 2m, 堰高为 6m 以内。
- ③ 圆木桩围堰的堰顶宽为 2~2.5m, 堰高为 5m 以内。
- ④ 钢桩围堰的堰顶宽为 2.5~3m, 堰高为 6m 以内。
- ⑤ 钢板桩围堰的堰顶宽为 2.5~3m, 堰高为 6m 以内。
- ⑥ 竹笼围堰竹笼间黏土填心的宽度为 2~2.5m, 堰高为 5m 以内。
- ⑦ 木笼围堰的堰顶宽度为 2~4m, 堰高为 4m 以内。
- ⑧ 堰内坡脚至堰内基坑边缘距离根据河床上质及基坑深度确定,但不得小于1m。

### 2. 定额套用及换算说明

- (1) 围堰工程 50m 范围以内取上、砂、砂砾、均不计上方和砂、砂砾的材料价格。
- (2) 取 50m 范围以外的上方、砂、砂砾,应计算上方和砂、砂砾材料的挖、运或外购费用,但应和除定额中土方现场挖运的人上(55.5 上日/100m<sup>3</sup> 新土)。

【例 4-22】 某工程采用编织袋围握(黏土外购,单价为 20 元/m³),确定套用的定额子目、基价。

【解】套用定额子目: [1-182]H

换算后的基价=6 847+93×20- $\frac{93}{100}$ ×55,5×43 ≈ 6 488(元/10m³)

- (3) 定额括号中所列黏土数量为取自然土方数量,结算中可按取土的实际情况进行调整。
- (4)编织袋围堰定额中如使用麻袋装土围筑,应按麻袋的规格、单价换算,但人工、机械和其他材料消耗量按定额规定执行。
- (5) 围堰施工中若未使用驳船,而采用搭设栈桥,则应扣除定额中驳船费用并套用相应的脚手架子目。
- (6) 围堰定额未包括施工期间发生潮汛冲刷后所需的养护工料。潮汛斧护工料费用可按当地规定另计。如遇特大潮汛发生人力不可抗拒的损失时,应根据实际情况另行处理。
  - (7) 双层竹笼围堰竹笼间黏土填心的宽度超过 2.5m,则超出部分可套筑岛填心子目。
- (8) 围堰定额中的各种圆木桩、钢桩均按水上打拔工具桩的相应定额执行,数量按实计算。定额括号中所列打拔工具桩数量仅供参考。

### 4.2.4 支撑工程

支撑工程包括木挡上板、竹挡上板、钢制挡上板、钢制桩挡上板支撑安拆等相应子目。

### 1. 工程量计算规则

支撑 L程按施 L组织设计确定的支撑面积以 m2 为单位计算。

- (1) 定额中挡土板支撑按槽坑两侧同时支撑挡上板考虑,支撑面积为两侧挡上板的面积之和。
  - (2) 放坡开挖不得再计算挡上板,如遇上层放坡、下层支撑,则按实际支撑面积计算。
- 【例 4-23】 某管道工程沟槽开挖时,采用密撑木挡上板支撑,其挡上板高度为 1.5m, 沟槽长度 40m, 计算支撑工程量。

【解】支撑工程量为 1.5×40×2 120(m2)

### 2. 定额套用及换算说明

- (1) 支撑工程定额适用于沟槽、基坑、工作坑及检查井的支撑。
- (2) 挡上板间距不同时,不做调整。
- (3) 除槽钢挡上板外,本章定额均按横板竖撑计算,如采用竖板横撑时,其人工 工日乘以系数 1.2。
- (4) 定额中挡上板支撑按槽坑两侧同时支撑挡上板考虑,支撑宽度为 4.1m 以内。 如槽坑宽度超过 4.1m 时,其两侧均按一侧支挡上板考虑。按槽坑一侧支撑挡上板面 积计算时,工日数乘以系数 1.33,除挡上板外,其他材料乘以系数 2。

【例 4-24】 沟槽开挖、宽 4.5m, 采用木档土板(密撑、木支撑)竖板模撑, 确定 定额子目、基价。

【解】套用定额子目: [1-203]H

换算后的基价=1 532+689.72×(1.33-1)+826.25×(2-1)-0.395×1 000.00 ≈ 2 191(元/100m²)

(5) 如采用井字支撑, 按疏擋乘以系数 0.61。

【例 4-25】 某井字支撑采用木档土板、钢支撑、确定定额子目、基价。

【解】套用定额子目: [1-206]H

换算后的基价=994×0.61≈606(元/100m²)

(6)钢制桩挡土板支撑定额仅包括支撑的安装、拆除费用,未包括钢制桩(槽钢)的打拔费用,钢制桩(槽钢)的打拔应按"打拔工具桩"的相应定额执行。



钢制挡土板支撑中、钢挡土板不需用打桩机械打入土体。钢制桩挡土板支撑中, 钢制桩(槽钢)需用打桩机械打入土体中, 施工完成后需用机械拔出。

### 4.2.5 拆除工程

拆除 L程包括拆除旧路、拆除人行道、拆除侧平石、拆除混凝上管道、拆除金 属管道、拆除镀锌管、拆除砖石构筑物、拆除混凝上障碍物、伐树、挖树蔸、路面 凿毛、铁刨机铣刨沥青路面等相应子目。

- 1. 工程量计算规则
- (1) 拆除旧路及人行道按实际拆除面积以 m<sup>2</sup> 为单位计算。
- (2) 拆除侧、平石及各类管道按长度以 m 为单位计算。
- (3) 拆除构筑物及障碍物按其实体体积以 m³ 为单位计算。
- (4) 伐树、挖树蔸都按实挖数以棵为单位计算。

# 知识链接

树蔸是指树伐掉主干后,留下的树根和少量树干的部分。



91



- (5) 路面凿毛、路面铣刨按施工组织设计的面积以 m<sup>2</sup> 为单位计算。铣刨路面厚度大于 5cm 时须分层铣削。
  - 2. 定额套用及换算说明
  - (1) 拆除工程定额均不包括挖土方,挖土方按"土石方工程"有关子目执行。
  - (2) 机械拆除项目中包括人工配合作业。
- (3) 拆除后的旧料应整理干净就近堆放整齐。如需运至指定地点回收利用,则另行计算运费并扣除回收价值。
  - (4) 管道拆除要求拆除后的旧管保持基本完好,破坏性拆除不得套用本章定额。
- (5) 拆除混凝上管道未包括拆除基础及垫层用工。基础及垫层拆除按"拆除工程" 相应定额执行。
- (6) 在市区建成区,结合给水、排水、燃气等管道施工需要翻挖道路面层、基层时,计算翻挖(拆除)沟槽范围内的道路面层和基层后,沟槽七方部分计算应扣除道路结构层所占体积,不得重复计算,沟槽深度按沟槽底至道路面层减去结构层厚度计算。
- (7) 本定额不适用于特殊结构拆除,如人脏、船坞等工程,发生时由承发包双方协商解决。
  - (8) 拆除工程定额中未考虑地下水因素, 若发生则另行计算。
- (9) 人工拆除二渣、三渣基层应根据材料组成情况套用无骨料多合土或有骨料多合土基层拆除子目: 机械拆除工渣、: 渣基层执行机械拆除混凝土类面层(无箭)子目。
- (10) 拆除井深在 m 以外的检查井时,人工乘以系数 1.31; 拆除石砌检查井时,人工乘以系数 1.10; 拆除石砌构筑物时,人工乘以系数 1.17。
- 【例 4-26】 某原有沥青混凝土路面 7cm 厚粗粒式沥青混凝土面层、采用铣刨机 刨除、确定定额子目及基价。
  - 【解】7cm 厚粗粒式沥青混凝土面层需分成两层: 3cm+4cm

套用定额子目: [1-295]×2+[1-296] 基价=3 959×2+245=8 163(元/1 000m²)

【例 4-27】 某改建工程、拆除原有石砌检查井、井深为 5m、确定定额子目及 基价。

【解】套用定额子目: [1-274]H 基价=584.37×1.31×1.10=842(元/10m<sup>3</sup>)

### 4.2.6 脚手架及其他工程



脚手架及其他工程包括脚手架、浇混凝土用仓面脚手、人力运输小型构件、汽车运输小型构件、汽车运水、双轮车场内运成型钢筋及混凝上(熟料),机动翻斗车运输混凝土、井点降水、湿土排水、抽水、彩钢板施工护栏等相应于目。

#### 【参考图す】

- 1. 脚手架
- 1) 工程量计算规则
- (1) 墙面脚手架 L程量按墙面水平边线长度乘以墙面砌筑高度,以 m² 为单位计算。

- (2) 柱形砌体按图示柱结构外围周长另加 3.6m 乘以砌筑高度,以 m² 为单位计算。
- (3) 浇筑混凝土用仓面脚手按仓面的水平面积以 m² 为单位计算。
- 【例 4-28】 某柱形砌体砌筑高度为 3m, 截面为 0.9m×0.6m, 砌筑时采用单排钢管脚手架, 试计算脚手架工程量, 并确定套用定额子目。

【解】工程量=[(0.9+0.6)×2+3.6]×3=19.8(m2)

定额子目编号: [1-297]

- 2) 定额套用及换算说明
- (1) 砌筑物高度超过 1.2m 时可计算脚手架搭拆费用。
- (2) 脚手架定额中钢管脚手架已包括斜道及拐弯平台的搭设。
- (3) 仓面脚手不包括斜道,若发生则另按建筑工程预算定额中脚手架斜道计算。但使 用井字架或吊机杆转运施工材料时,不再计算斜道费用。
  - (4) 对无筋或单层布筋的基础和垫层不计算仓面脚手费。
  - (5) 桥梁支架套用第三册《桥梁工程》中"桥梁支架"的相应子目。
  - 2. 坐成品、小型构件等场内运输
  - 1) 工程量计算规则
  - (1) 小型构件场内运输的工程量按构件的体积以 m3 为单位计算。
  - (2) 场内运水按其质量以1为单位计算。
  - (3) 场内运输成品钢筋按钢筋质量以 t 为单位计算。
  - (4) 场内运输混凝土按其体积以 m3 为单位计算。
  - 2) 定额套用及换算说明 //
- (1) 小型构件、半成品均指现场预制或拌制,不适用于按成品价购入,如预制人行道板、商品混凝上等。
- (2) 混凝土小型构件是指单件体积在  $0.04 m^3$  以内,质量在 100 kg 以内的各类现场预制构件。
- (3) 小型构件、半成品运输距离按预制、加工场地取料中心至施工现场使用中心的距离计算。
- (4) 桥涵工程、排水工程册定额子目中已考虑了半成品场内运输距离 150m, 实际运距 超过时, 按超出部分套用每增子目。

【例 4-29】 某排水管道平基采用现场自拌水泥混凝土,采用机动翻斗车运输,运距为 270m,确定其场内运输套用的定额子目及基价。

【解】超运距: 270-150=120(m)

定额子目编号: [1-320]

基价=18(元/10m3)

- 3. 排、降水,抽水
- 1) 工程量计算规则
- (1) 湿上排水工程量按所挖湿方量以 m3 为单位计算。
- (2) 抽水工程量按所需或实际的排水量以 m3 为单位计算。
- (3) 井点降水。





- ① 轻型井点、喷射井点、大口径井点的采用由施工组织设计确定。
- 一般情况下,降水深度 6m 以内采用轻型井点,降水深度 6m 以上 30m 以内采 用相应的喷射井占, 特殊情况下可洗用大口径井占。
  - ② 井占问距根据地质和降水要求由施工组织设计确定。
- 一般轻型井点管间距为 1.2m, 喷射井点管间距为 2.5m, 大口径井点管间距为 10m.
  - ③ 井点使用时间(天数)按施工组织设计确定。



# 知识链接

井点使用天教在编制招标控制价时可参考表 4-8 计算。

表 4-8 排水管道采用轻型井点降水使用周期

管径(mm 以内)	开槽埋管/(天/套)	管径(ming 以内)	开槽埋管/(天/套
φ 600	10	ø1 500	16
\$ 800	12	øl 800	18
φ 1 000	13	φ2 000	20
φ1 200	14		

- 注:本表适用干湿凝土管谱:塑料管开槽埋管,可按本表所示使用量乘以系数 0.7 计算。
- ④ 轻型井点、喷射井点、大口径井点的工程量均包括;井点安装、井点拆除、 并点使用的工程量。<sup>`</sup>

并点安装工程量按并直管的数量以根为单位计算。

- 并占拆除工程量按并占管的数量以根为单位计算。
- 并点使用工程量按井点的套数、井点的使用时间以"套•天"为单位计算。一 天按 24 尔时计算。
- (5) 轻型并点 50 根为一套, 尾数 25 根以内的按 0.5 套, 超过 25 根的按一套计算。 喷射井点 30 根为一套、累计根数不足一套者按一套计算: 大口径井点以 10 根为一 套,累计根数不足一套者按一套计算。
  - 2) 定额套用及换算说明
  - (1) 抽水定额适用干池塘、河道、雨堰等排水项目。
- (2) 并点降水项目适用于地下水位较高的粉砂土、砂质粉土、黏质粉土或淤泥质 夹薄层砂性上的地层。如采用其他降水方法如深井降水、集水井排水等,施工单位 可自行补充。
  - (3) 喷射井点定额包括两根观察孔制作。喷射井管包括了内管和外管。
  - (4) 井点材料使用摊销量中已包括井点拆除时的材料损耗量。
  - (5) 并占隆水过程中,如需提供资料,则水位监测和资料整理费用另过。
- (6) 井点降水成孔过程中产生的泥水处理及挖沟排水工作应另行计算。遇有天然 水源可用时, 不计水费。

- (7) 井点降水必须保证连续供电,在电源无保证的情况下,使用备用电源的费用 另计。
- 【例 4-30】 某管道工程 Y1~Y4 段开槽施工采用单排轻型井点降水、井点管间距为 1.2m; 管道平面图如图 4.10 所示,管材为钢筋混凝土管,计算该管道开挖时轻型井点的工程量,并确定套用的定额子目。



图 4.10 某管道工程 Y1~Y4 的管道平面图

### 【解】管段总长=30+40+20=90(m)

井点管根数: 90÷1.2+1=76(根)

井点安装工程量=76根,定额子目编号: [1-323]

井点拆除工程量-76 根,定额子目编号: [I-324]

井点的使用时间计算如下:

Y1~Y2 段:  $30\div1.2=25(根)$ , 为 0.5 套, 使用天数为 10 天, 使用工程量= $0.5\times10=5$  (套・天)

Y2~Y3 段: 40-1.2=34(根), 为 1 套, 使用天数为 10 天, 使用工程量=1×10=10 (套:天)

Y3~Y4段: 20-1.2=17(根), 为 0.5 套, 使用天数为 12 天, 使用工程量=0.5×12=6 (奎·天)

合计井点使用工程量=5+10+6=21(套·天)、定额子目编号: [1-325]

- 4. 彩钢板施工护栏
- 1) 工程量计算规则

彩钢板施工护栏定额子目分基础及护栏,按其垂直投影面积以 m² 计算。

2) 定额套用及换算说明

定额中彩钢板摊销按5次考虑,护栏基础为单面水泥砂浆粉刷。

### 4.2.7 护坡、挡土墙

护坡、挡上端工程包括抛石、石笼,砂石滤层、滤沟,砌护坡、台阶,压顶,浆砌, 现浇挡上墙,干砌块石基础、挡上墙,勾缝,伸缩缝等相应子目。



- (1) 抛石工程量按设计断面以 m3 为单位计算。
- (2) 块石护底、护坡按不同平面厚度以 m3 为单位计算。
- (3) 块石坡脚砌筑高度超过 1.2m, 需搭设脚手架时, 可按脚手架工程相应项目 计算, 块石护脚在自然地面以下砌筑时, 不计算脚手架费用。
  - (4) 浆砌料石、预制块的体积按设计断面以 m3 为单位计算。



【参考图文】



- (5) 浆砌台阶以设计断面的实砌体积计算。
- (6) 砂石滤沟按设计尺寸以 m3 为单位计算。
- (7) 伸缩缝按缝宽按实际铺设的面积以 m2 为单位计算。



伸縮缝工程量按实际铺设高度乘以铺设宽度计算, 铺设高度按护坡、挡土墙的基础底 到压顶顶部的全高计算、不包括基础下方的垫层的高度(厚度)。

### 2. 定额套用及换算说明

- (1) 护坡、挡土墙适用于市政工程道路、城市内河的护坡和挡土墙工程。
- (2) 石笼以钢筋和钢丝制作,每个体积按 0.5m³ 计算,设计的石笼体积或制作材料不同时,可按实际情况调整。
  - (3) 挡土墙 工程需搭脚手架的, 执行脚手架定额。
  - (4) 块石如需冲洗时(利用旧料),每立方米块石增加人工 0.24 工目、水 0.5m3。
  - (5) 护坡、挡土墙的基础、钢筋可套用第三册《桥涵工程》的相应子目。

【例 4-31】 某道路两侧挡墙结构如图 4.11 所示、挡墙设置位置、高度等基本数据见表 4-9 和表 4-10, 该档塘每 15m 设一条沉降缝、计算挡土墙各部结构的工程量。




表 4-9 挡土墙基本数据 1

单位: cm

Н	100	150	200	250
b.	0	15	20	30
$b_2$	6	13	17	21
b	77	89	106	127
В	83	117	143	173
$H_1$	63	90	130	167
$H_2$	0	25	30	48
$H_3$	17	40	50	63

表 4-10 挡土墙基本数据 2

位置	挡墙设置桩号	增高 <i>H</i> /m	平均增高位	) 间距 <i>L/</i> m	断面积 A/m²
	3+224	1.5	1.5	16	1.5×16=24
	240	1.5			
	260	1.0	1.25	20	1.25×20=25
北側			1.75	. 20	1.75×20=35
	280	2.5	2.5	20	2.5×20=50
	300	2.5		. 2.5	2.5×15=37.5
	3+315	2.5	. 2.5		
		$\sum L$	=91m, ∑A=171 5m	2	
	3+319	1.0	1.0	21	21
	340	1.0			
Ī	360	2.0	1.5	20	30
南便			1.75	15.79	27.63
	375.79	1.5	1.25	23.15	28.94
	398.94	1.0	1.23	23.13	26.54
-	3+410	1.0	1.0	11.06	11.06
1		$\Sigma L$	91m. ∑A 118.63m	2	



【解】挡土墙平均高度 
$$H - \sum_{L} A = \frac{171.5 + 118.63}{91 + 91} = 1.6 (m)$$

挡土墙总长=91+91=182(m)

根据H=1.6m,利用表 4-9 的数据。用插入法可计算挡墙的各部尺寸数据。

- (2) 浆砌块石基础: 內插法计算得  $H_2$ =0.26m,  $H_3$ =0.42m浆砌块石基础体积=(0.26+0.42)/2×1.22×182  $\approx$  75.49( $m^3$ )
- (3) 墙身: 内插法计算得  $H_1$ =0.98m,  $b_1$ =0.16m,  $b_2$ =0.138m 浆砌块石墙身体积=[(0.5+0.92)/2×0.98+0.14]×182  $\approx$  152.12(m<sup>3</sup>)
- (4) 克顶: 0.55×0.2×182≈20(m³)
- (5) 水泥砂浆勾缝(挡墙外露面的侧面积)

内插法计算得 H<sub>1</sub>=0.98m

勾缝面积=0.98×182 178.36(m2)

(6) 沉降缝计算: 根据 $\overline{H}$  = 1.6m 用插入法计算可得  $b_1$ =16cm,  $b_2$ =14cm, b=92cm, B=122cm,  $H_1$ =98cm,  $H_2$ =26cm,  $H_3$ =42cm

每条沉降缝断面积=(0.26+0.42)(2×1.22(基础)+(0.5+0.92)/2×0.98+0.14(墙身)+(0.55×0.2(京顶)=1.36(m²)

每 15m 设一条沉降缝,总数=(91/15-1)×2=10(条) 沉降缝面积=1.36m<sup>2</sup>×10=136m<sup>2</sup>



### 特别提示

例 4.31 中接道路两侧的挡土墙的平均高度计算挡墙各部的工程量,也可以按 表 4-10 中各段挡墙的高度、长度、逐段进行计算,最后合计得到该工程挡土墙的总 工程量。

### 4.2.8 地下连续墙



地下连续墙上程定额包括导墙、挖土成槽、钢筋笼制作、吊运就位、锁口管吊 拔、浇捣混凝上连续墙、大型支撑基坑上方、大型支撑安装及拆除等相应子目。

### 1. 工程量计算规则

- (1) 导墙开挖按设计长度×开挖宽度×开挖深度以m³为单位计算,浇捣混凝土按设计图示以m³为单位计算。
- (2) 成槽工程量按设计长度×乘墙厚×成槽深度(自然地坪至连续墙底加超深 0.5m),以m³为单位计算。泥浆池建拆、泥浆外运工程量按成槽工程量计算。
  - (3) 连续墙混凝土浇筑 [程量按设计长度乘×墙厚×(墙深+0.5m),以 m³ 为单位计算。
- (4) 锁口管吊拔及清底置换以段为单位(即槽壁单元槽段)计算,锁口管吊拔按连 续墙段数计算,定额中已包括锁口管的摊销费用。

### 2. 定额套用及换复说明

- (1) 活用于在黏土、砂土及冲填土等软土层地下连续墙下程,以及采用大型支撑 围护的基坑上方丁程。
  - (3) 地下连续墙导墙、挖上成槽上方的运输、回填、套用上石方工程相应定额。
  - (4) 泥浆池搭拆食用第三册《桥涵工程》相应定额、废浆处理及外运费用另计。
  - (5) 钢筋笼制作包括台模摊销费, 定额中预埋件用量与实际用量有差异时允许调整。
- (6) 大型支撑基坑开挖定额适用于地下连续墙、混凝土板桩、钢板桩等作围护的 跨度大于8m的深基坑开挖。定额中已包括湿土排水,若需采用井点降水或支撑安拆 需打拔中心稳定桩等,其费用另行计算。计取井点排水费用后,需扣除定额中的污 水泵数量,
- (7) 大型支撑基坑开挖由于场地狭小只能单面施工时, 挖土机械按表 4-11 进行 调整。

表 4-11 大型支撑基坑开挖机械调整系数

宽 度	两边停机施工、	单边停机施工
基坑宽 15m 以内	15t	25t
基坑宽 15m 以外	25t	40t

### 4.2.9 地基加固、围护及监测

地基加固、围护及监测定额包括分层注浆、压密注浆、高压旋喷桩、深层水泥 搅拌桩、插拔型钢、碎石振冲桩、地表监测孔布置、地下监测孔布置、监控测试等 相应子目。

- 1. 工程量计算规则
- 1) 分层注浆
- (1) 钻孔按设计图纸规定深度以 m 为单位计算。
- (2) 注浆数量按设计图纸注明体积计算。
- 2) 压密注浆
- (1) 钻孔按设计图纸规定深度以 m 为单位计算。
- (2) 注浆:
- ① 设计图纸明确加固上体体积的,按设计图纸注明的体积计算。
- ② 设计图纸以布点形式图示上体加固范围的,则按两孔间距的一半作为扩散半
- 径,以布点边线各加扩散半径,形成计算平面,计算注浆体积:
- ③ 如设计图纸注浆点在钻孔灌注桩之间,按两注浆孔距的一半作为每孔的扩散 半径, 依此圆桩体积计算注浆体积。
  - 3) 高压旋畸桩
  - (1) 钻孔按原地面至设计桩底底面的距离以"延长米"为单位计算。
  - (2) 喷浆按设计加固桩截面面积以 m3 为单位计算。



# 市政工程计量与计价(第三版)

- 4) 深层水泥搅拌桩
- (1) 水泥搅拌桩工程量不分单头、双头和三轴,均按单个圆形截面积乘以桩长计算, 不扣除重叠部分的面积。设计无明确规定时,桩长按设计桩顶标高至桩底长度另加 0.5m 计 等,若设计桩顶标高至杠桩前的原地面高差小于 0.5m 时,另加长度按实际计算。
  - (2) 空搅部分的长度按原地面至设计桩顶面的长度减去另加长度计算。
- (3) 采用 SMW [法围护桩施工时,水泥搅拌桩中的插、拔型钢工程量按设计图示型钢质量以 t 为单位计算。
  - 5) 碎石振冲桩

碎石振冲桩按设计桩长以 m 为单位计算。

- 6) 监测点布置
- 监测点布置工程量由施工组织设计确定。
- 7) 监控测试

监控测试以一个施工区域内监控三项或六项测定内容划分步距,以"组日"为计量单位,监测时间由施工组织设计确定。

### 2. 定额套用及换算说明

(1) 本章定额按软土地层建筑地下构筑物时采用的地基加固方法、围护工艺和监测手段进行编制。

地基加固是控制地表沉降,提高上体承载力,降低上体渗透系数的一个手段,适用于 深基坑底部稳定、隧道暗挖法施工、路基和其他建筑物基础加固等。 监测基地下构筑物建设时,反映施工对周围建筑群影响程度的测试手段。本定额适用

监测是地下构筑物建造时,反映施工对周围建筑群影响程度的测试手段。本定额适用于需监测的工程项目,包括监测点布置和监测两部分,监测单位应及时提供可靠的测试数据,工程结束后监测数据立案成册。

监测点布置分为地表和地下两部分,其中地表测孔深度与定额不同时可内插计算。

- (2) 地基加固所用的浆体材料(水泥、粉煤灰、外加剂等)用量应按设计含量调整。
- (3) 深层水泥搅拌桩。
- ① 单、双头深层水泥搅拌桩, 三轴水泥搅拌桩定额的水泥掺入量分别按加固上重 (1800kg/m³)的 13%和 18%考虑, 如设计不同时按每增减 1%定额计算。
  - ② 单、双头水泥搅拌桩定额已综合考虑了正常施工工艺所需的重复喷浆(粉)和搅拌。
- ③ 三轴水泥搅拌桩定额按 . 搅 . 喷施工工艺考虑,设计不同时,每增(减) . 搅 . 喷按相应定额的人工和机械费增(减)40%。
  - ④ 插、拔型钢定额中已综合考虑了正常施工条件下的型钢损耗和周转摊销量。
- ⑤ 二轴水泥搅拌桩设计要求全断面套打时,相应定额的人 L及机械乘以系数 1.5,其余不变。
  - ⑥ 水泥搅拌桩空搅部分费用按相应定额人工及搅拌桩机台班乘以系数 0.5 计算。
- ⑦ 深层水泥搅拌桩单位工程打桩工程量少于100m³时,打桩定额人工及机械乘以系数 1.25。
- (4) 高压旋喷桩定额已综合考虑接头处的复喷 L料。高压旋喷桩中设计水泥用量与定额不同时应调整,设计水泥用量可根据设计有关规定进行调整。

(5) 本章定额不包括泥浆处理和微型桩的钢筋费用,为配合上体快速排水需打砂井的费用另计。

### 1.2.10 附录

附录分为A、B、C三部分。

附录 A 为建筑材料的配合比和基价,包括砂浆、混凝土、防水材料、垫层及保温材料、耐酸材料、干湿砂浆的配合比及基价。

附录 B 为工、料、机单价取定表。

附录 C 为机械台班单独计算的费用,包括: 塔式起重机、施工电梯基础费用;特、大型机械安装拆卸费用;特、大型机械场外运输费用。

# 4.3 土石方工程定额计量与计价实例

土石方工程通常是市政道路、排水、桥滴工程的组成部分,土石方计量与计价通常是 道路、排水、桥涵等市政专业上程计量与计价的一部分。

【例 4-32】 某市风华路土方工程,起讫桩号为 0+040~0+180,该路段内有填方、也有挖方,施工横断面如图 4.12 所示、土质为三类土、余方要求外运至 5km 处的弃置点,填方密实度要求达到 95%。试按定额计价模式采用工料单价法编制本土方工程的投标报价,

### 1. 确定施工方案

- (1) 挖土: 主要采用挖掘机挖土并装车, 机械作业不到的地方用人工开挖, 人工挖方量按总挖方量的5%考虑; 用机动翻斗车运土进行场地土方平衡, 由土方计算表可知土方平衡场内运距在180m内。
- (2) 填土:采用内燃压路机碾压密实,每层厚度不超过30cm,并分层检验密实度,保证每层密实度≥95%。
  - (3) 余方弃置: 采用自卸汽车运土, 运距 5km。
  - 2. 人材机单价及管理费、利润、风险费率及施工组织措施各项费率的取定
- (1) 本工程人工、材料、机械台班单价按《浙江省市政工程预算定额》(2010 版)中的单价取定。
- (2) 管理费按人工费+机械费的 20%计取,利润按人工费+机械费的 10%计取,风险费用暂不考虑。
- (3)农民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险费暂不考虑。本工程无创标化工程要求,本工程不得分包,本工程无暂列金额、计日工。
  - (4) 各项组织措施费的费率取《浙江省建设工程施工费用定额》(2010版)的中值。





### 图 4.12 某市风华路施工横断面图

### 3. 分部分项工程项目计量与计价

(1) 分部分项工程项目计量,即计算分部分项工程项目的工程量。

先采用横截面法计算挖方量、填方量,根据计算结果并考虑场内土方平衡,再计算确 定余方外运或缺方内运的工程量。本道路土方工程挖方、填方工程量计算见表 4-12。

桩号段	挖方/m³	填方/m³
0+040~0+060	$V = \frac{47.443 + 32.724}{2} \times 20 = 801.67$	$V = \frac{0.238 + 2.257}{2} \times 20 = 24.95$
0+060~0+080	$V = \frac{32.724 + 0.448}{2} \times 20 = 331.72$	$V = \frac{2.257 + 15.041}{2} \times 20 = 172.98$
0+080~0+100	$V = \frac{0.448 + 1.379}{2} \times 20 = 18.27$	$V = \frac{15.041 + 13.501}{2} \times 20 = 285.42$
0+100~0+120	$V - \frac{1.379 + 0.000}{2} \times 20 - 13.79$	$V - \frac{13.501 + 18.148}{2} \times 20 - 316.49$
0+120~0+140	$V - \frac{0.000 + 0.000}{2} \times 20 - 0.00$	$V - \frac{18.148 + 19.815}{2} \times 20 - 379.63$
0+140~0+160	$V - \frac{0.000 + 0.000}{2} \times 20 - 0.00$	$V - \frac{19.815 + 26.035}{2} \times 20 - 458.50$

+ 4-12 按方 值方工程器计算表

徒老

桩号段	挖方/m³	填方/m³
0+140~0+160	$V = \frac{0.000 + 0.954}{2} \times 20 = 9.54$	$V = \frac{26.035 + 14.271}{2} \times 20 - 403.06$
合 计	1 174.99	2 041.03

#### 余方外运方量 V=2 041.03-1 174.99×1.15=689.79(m3)

根据挖方、填方的总工程量,根据工程施工方案,计算出机械挖方量、人工挖方量, 考虑场内上方的平衡,其中人工所挖上方均用于回填,部分机械挖方量用于回填、部分机 械挖方量外运。

本道路土方工程分部分项项目工程量计算见表 4-13。

表 4-13 分部分项工程项目工程量计算表

序号	分部分项工程项目	工程量计算式
1	挖掘机挖土并装车(一类土)	2 041,03 95%=1 938.98(m³)
2	人工挖土方(三类土)	2 041 03×5%=102.05(m³)
3	机动翻斗车运上(运距 180m 内)	$(174.99 \times 1.15 \approx 1.351.24 (m^3))$
4	填上(压路机碾压密实)	1 174.99m³
5	自卸车运土(运距 5km)	2 041.03-1 174.99×1.15=689.79 (m³)

(2)分部分项工程项目计价,即计算直接工程费(人工费+材料费+施工机具使用费)。 根据《浙江省市政工程预算定额》(2010 版),先确定各分部分项工程对应的定额子目编号,再确定其工料单价,然后计算直接工程费。

计算结果见表 4-14。

表 4-14 市政工程预算书

名称: 某市风华路十方工程 第1

工程	名称:某	市风华路十方工程	第1页 共1						
序号			1	3.02	. 单价 /元	人工费 /元	材料费 /元	机械费 /元	元,元
1	1-60	挖掘机挖土井装车 (三类土)	1 000m <sup>3</sup>	1.938 98	3 812	372.28	0.000	7 019.26	7 391 54
2	1-2	人工挖土方(三类土)	100m <sup>3</sup>	1.020 5	682	695.57	0.00	0.00	695.57
3	1-32	机动翻斗车运上(运 距 180m 内)	100m <sup>3</sup>	13.512 4	1 238	4 886.08	0.00	11 846.86	16 732.94
4	1 82	填上(压路机碾压密实)	1 000m <sup>3</sup>	1.174 99	2 350	225.60	17.33	2 518.53	2 761.46
5	1 68+ 1 69×4	自卸车运上(运距 5km)	1 000m³	0.689 79	10 325	0.00	24.42	7 096.84	7 121.26
		合 计				6 179.53	41.75	28 481.49	34 702.77

(4-15)



#### 4. 施丁技术措施项目计量与计价

(1) 施工技术措施项目计量,即计算施工技术措施项目的工程量。

本十方 厂程 挖 十 上 要 采 用 挖 掘 机 讲 行 , 填 方 压 宝 采 用 压 路 机 讲 行 , 施 厂 技 术 措 施 上 要 考虑大型机械讲出场及安拆, 工程量如下。

1m3以内挖掘机进出场: 1 台次

压路机进出场: 1台次

(2) 施工技术措施项目计价,即计算施工技术措施费。

根据《浙江省市政工程预算定额》(2010版), 先确定施工技术措施项目对应的定额子 日编号, 再确定其工料单价, 然后计算施工技术措施费。

施工技术措施费=∑(技术措施项目工程量×工料单价)

(4-16)

本土方 [程施 [技术措施费计算结果见表 4-15。

表 4-15 市政工程预算书

序号	<b>16</b> 1	4.1	单生	<b>B</b> I	****		材料養 /元	- 机械费 - /元	- Arthor
1		技术措施							
2	3001	1m³以内挖掘机场 外运输	台次	1	2 954.58	516	1 115.31	1 323 27	2 954.58
3	3010	压路机场外运输	台次	1	2 560.33	215	1 022.06	1 323.27	2 560.33
		合 i	+			731	2 137.37	2 646.54	5 514.91

#### 5. 计算施工组织措施费

施工组织措施费=Σ(取费基数×各项施工组织措施费率)

(4-17)

本土方下程的取费基数计算如下。

取费基数=6 179.53+28 481.49+731+2 646.54=38 038.56(元)



取费基数是预算定额分部分项工程费中的人工费、机械费之和、包括分部分项项目和 施工技术措施项目中的人工费、机械费之和。

根据工程的实际情况,考虑计取安全文明施工费、施工扬尘污染防治增加费、工程定 位复测费、夜间施工增加费、已完工程及设备保护费、行车行人干扰增加费议几项施工组 织措施,各项施工组织措施费费率按《浙江省建设工程施工费用定额》(2010版)规定的费 **率范围的中值确定**。

本上方工程施工组织措施费计算结果见表 4-16。

表 4-16 组织措施项目费计算表

序 号	项目名称	单 位	计 算 式	金额/元
1	安全文明施工费	项	38 038 56×10.61%	4 035.89
2	施工扬尘污染防治增加费	项	38 038.56×2.00%	760.77

Ante	-	ı	-	*
邪	4	ŀ	3	₹

				头 农
序 号	项目名称	单 位	计 算 式	金額/元
3	工程定位复测费	项	38 038.56×0.04%	15.22
4	夜间施工增加费	項	38 038.56×0.03%	11.41
5	己完工程及设备保护费	项	38 038.56×0.04%	15.22
6	行车、行人干扰增加费	项	38 038.56×2.50%	950,96
7	合计	項	(1+2+3+4+5+6)	5 789.47

#### 6. 计算企业管理费、利润、风险费用

本土方工程企业管理费、利润计算如下:

企业管理费~38 038.56×20%≈7 607.71(元)

利润=38 038.56×10% ≈ 3 803.86(元)

风险费用=0

#### 7. 计算规费、税金,并计算工程造价

税金=(预算定额分部分项工程费+施工组织措施费+企业管理费+利润+

规费+总承包服务费+风险费+暂列金额)×相应费率 (4-21)

工程造价=预算定额分部分项工程费+施工组织措施费+企业管理费+

利润+规费+总承包服务费+风险费+暂列金额+税金 (4-22)

本土方工程的工程造价计算结果见表 4-17。

表 4-17 单位(专业)工程费用计算程序表

序号		费用名称	费用计算表达式	金额/元
	预算定	额分部分项工程费	∑(分部分项 L程量× L料单价)	40 217.68
	其中	1. 人工費+机械费		38 038.56
. 1	施工组	L织措施费	2+3+4+5+6+7	5 789.47
		2. 安全文明施工费	1×10.61%	4 035.89
		3. 施工扬尘污染防治增加费	1×2.00%	760.77
	其	4. 工程定位复测费	1×0.04%	15.22
		5. 夜间施工增加费	1×0.03%	11.41
	中	6. 已完工程及设备保护费	1×0.04%	15.22
		7. 行车、行人干扰增加费	1×2.50%	950.96
=	企业管	理费	1×20%	7 607.71
四	利润		1×10%	3 803.86
Ŧi	规费		8+9	2 776.81
	th chr	8. 排污费、社保费、公积金	1×7.30%	2 776.81
	其中	9. 农民工工伤保险费		0.00

**维**表

序号	费用名称	费用计算表达式	金额/元
六	危险作业意外伤害保险费	_	0.00
Ł	总承包服务费	-	0.00
八	风险费	(一+二+三+四+五+六+七)×0%	0.00
九	暂列金额		0.00
+	税金	(一+二+三+四+五+六+七+八+九)×3.577%	2 153.19
+-	建设工程造价	(一+二+三+四+五+六+七+八+九+十)	62 348.72

#### ( 思考题与习题 )

#### 一、简答题

- 1. 在奎用定额时,如何区分沟槽、基坑、平整场施了一般土石方?
- 2. 挖、运湿土应该如何套用定额?
- 3. 施工时先挖土再设支撑、能否按支撑下挖土进行定额的换算套用?
- 4. 采用井点降水的土方是按干土计算,还是按湿土计算?
- 5. 土石方工程定额中把土分成哪几类?把岩石分成哪几类?
- 6. 打拔工具桩时,水上作业与陆上作业是如何区分的?
- 7. 某管道沟槽开挖时采用钢板桩支撑、挖土方时应该如何套用定额?
- 8. 打拔工具桩时、坚、拆打拔桩架的次数如何计算?
- 9. 打拔工具桩时, 土质级别如何划分? 与"土石方工程"中土壤的分类有何不同?
- 10. 打拔工具栖遇丙级土时,定额怎么套用?
- 11. 如槽坑宽度超过 4.1m, 其挡土板支撑如何套用定额?
- 12. 木档七板支撑采用竖板、横撑的形式时、如何套用定额?
- 13. 人工拆除三渣基层套用什么定额子目? 机械拆除三渣基层套用什么定额子目?
- 14. 用风镐凿除 15cm 厚的钢筋混凝土面层套用什么定额子目? 用镐头机凿除 15cm 厚 的钢筋混凝土面层套用什么定额子目?
  - 15. 什么是混凝土小型构件?
  - 16. 某基坑挖土时采用轻型井点降水、其工程量包括哪些内容?如何计算?
  - 17. 彩钢板施工护栏工程量包括哪些内容?如何计算?
  - 18. 浇混凝土用仓面脚手工程量如何计算?
  - 19. 护坡、挡土墙砌筑高度超过多少时。可以考虑脚毛架费用?
  - 20. 某档土墙设二毡三油伸缩缝、套用什么定额子目?
  - 21. 大型支撑基坑开挖定额适用条件是什么?
- 22. 地下连续墙工程成槽工程量计算时,如何确定成槽深度?连续墙混凝土浇筑工程量如何计算?
  - 23. 单头水泥搅拌桩设计水泥掺入量与定额不同时,如何进行定额的换算套用?

- 24. 三轴水泥搅拌桩施工工艺与定额不同时、如何进行定额的接算套用?
- 25. 水泥搅拌桩空搅部分的长度如何计算? 费用如何套用定额计算?
- 26. 定额计价模式下,工程造价的计算的基本步骤是什么?

#### 二、计算题

- 1. 某排水管道工程,检查井垫层现场浇筑施工时采用非泵送的商品混凝土、混凝土强度等级为C15,确定套用的定额干目及基价。
- 菜现浇钢筋混凝土方沟、顶板施工时采用泵送商品混凝土、混凝土强度等级为C20、确定套用的定额子目及基价。
- 某桥梁工程承台混凝土现场浇筑时,采用非泵送商品混凝土,混凝土强度等级为 C20,确定套用的定额子目及基价。
- 4. 菜Y1~Y3 而水管道长70m,采用 D600 钢筋混凝土管道、135°C15 钢筋混凝土条形基础。已知原地面平均标高为 4.300m, 沟槽底平均标高为 1.200m, 地下常水位标高为 3.300m,条形基础宽度为 0.88m,土质为三类土,采用挖掘机在沟槽边作业,距离槽底 30cm用人工辅助清底,诚计算该管道沟槽开控的工程量,并确定套用的定额子目及基价。
- 5. 某 WI~W2 污水管道长 30m, 采用 DN400UPVC 管道、砂基础, 管道外径为 450mm, 已知原地面平均标高为 3.600m, 沟槽底平均标高为 2.200m, 土质为一二类土,采用挖掘机 在垫板上沿泊槽方向作业,该计算沟槽开挖的工程量,并确定套用的定额干目及某价。
- 6. 菜道路路基工程、已知挖土 2500m³,其中可利用 2000m³,需填土用 4000m³,现 场挖、填平衡。试计算余土外运量和雄土缺方量。
- 7. 已知某桥梁承台长 10m、宽 4m、原地面标高为 6.800m、承台底标高为 2.800m、拟 采用垂直开掠、钢板桩飞撑、试计算承台施工时的掠方量。
- 8. 某土方工程采用 90kW 履带式推土机推土上坡、已知斜道坡度为 8%, 斜道水平距 离为 40m, 推土厚度为 0.5m、宽度为 40m, 土质为二类土, 确定推土机推土套用的定额子 目及基价。
- 9. 双轮翻斗车运土方上坡、坡度为17%、斜道长度为80m、确定套用的定额于目及基价。
- 10. 某工程有 500m³ 3余土方需外运 5km, 用人工将土方装至自卸汽车上, 再用自卸车外运, 试确定该工程土方外运套用的定额子目及基价, 并计算直接工程费(人工费+机械费+材料费),
- 11. 某土方工程采用方格网法计算挖填工程量、方格网的边长为 20m, 某方格网 4 个 角点(顺时针方向)的施工高度分别为 0.5m、 1.2m、 0.6m、0.8m, 计算该方格网的挖方量 和填方量。
  - 12、人工挖基坑流砂、挖深 5m、确定挖深超过 1.5m 部分套用的定额子目及基价。
- 13. 某工程卷扬机拔 6m 长圆木桩, 距现有河岸线 1.3m, 水深 0.9m, 丙级土, 确定套用的定额子目及基价。
  - 14. 陆上卷扬机打 10m 长槽形钢板桩, 斜桩、丙级土, 确定套用的定额子目及基价。
- 15. 菜桥梁承台施工时采用編织樂園堰,施工期间最高水位标高为5m,围堰处河床标高为1.0m,堰顶宽1.5m,堰内边坡为1:1,堰外边坡为1:2,围堰中心线长30m,围堰



所雲黏上外购, 单价为 18 元/m3、计算该围堰的工程量并确定套用的定额平目及基价。

- 16. 某管道沟槽开挖时采用木挡土板竖板、樯撑(密排、木支撑)、已知沟槽长 30m、 窗 2.6m, 挖深为 3m, 确定套用的定额子目及基价, 并计算该支撑工程人工, 木挡土板的 总用量。
- 17. 某桥梁桥台开挖采用钢制挡土板竖板、横撑(密排、钢支撑)、已知沟槽长 211m、 宽 2m, 挖深为 3m, 试计算该支撑工程人工、钢挡土板的总用量。
  - 18. 拆除井深 4.5m 的原有石砌检查井、确定套用的定额子目及基价。
- 19. 用沥青铣刨机铣刨原有 7cm 厚粗粒式沥青混凝土面层、确定套用的定额子目及 基价,
- 20. 某柱形砌体,截面尺寸为1.0m×0.8m,砌筑高度为2.8m,砌筑时采用单排钢管脚 手架, 计算脚手架工程量, 并确定套用的定额子目及基价。
- 21. W1~W6 污水管道采用开槽埋管, 已知 W1~W3 管径为 D500, 管长 50m; W3~ W6 管径为 D600, 管长 80m, 管道均采用钢筋混凝土管、135° 钢筋混凝土条形基础, 沟槽 开挖财设单排轻型井点隆水。 试计算该轻型井点的容装、拆除及使用的工程量。
- 22. 某排水管道条形基础的管座采用现场自拌混凝土,采用机动翻斗车运输,运距为 500m,确定其场内运输查用的定额子目及基价。
- 23. 大型支撑基坑开挖时,由于场地狭小只能单而开挖,开挖帘度为12m、挖深为6m, 确定基坑开挖套用的定额子目及基份
- 24. 某工程三轴水泥搅拌桩施工采用三搅三喷、搅拌桩的工程量为 89m3、确定套用的 定额子目及基价。

# 第5章《道路工程》预算定额 应用

#### 本章学习要点

- 1. 路基处理工程量计算规则、计算方法、定额的套用和换算。
- 2. 道路基层工程量计算规则、计算方法、定额的套用和换算。
- 3. 道路面层工程量计算规则、计算方法、定额的套用和换算。
- 4. 人行道及其他工程量计算规则、计算方法、定额的套用和换算。





某道路工程, 长 200m, 道路横断面为 4m 人行道+18m 车行道+4m 人行道, 车 行道采用水泥混凝土路面、其平面图、路面结构图、板块划分示意图、伸缩缝结构 图等如图 5.3 所示,如何计算水泥混凝土路面的相关工程量?有哪些项目要计算?如 何计算?

《道路工程》册是《浙江省市政工程预算定额》(2010版)的第二册,包括路床(槽) 整形、道路基层、道路面层、人行道侧平石及其他, 共 4 章, 适用于城镇范围内新 建、改建、扩建的市政道路工程,不适用于城市基础设施中的大、中、小修及养护 丁程。

- (1) 定额中施工中用水均考虑以自来水为供水来源,如采用其伸水源,允许调整 换算.
- (2) 半成品、材料及其规格、质量和配合比与定额不同时可以调整换算,但人工、 机械消耗量不变。
- (3) 定额中使用的半成品材料(除沥青混凝土、商品混凝土等采用成品价购入的 以外)均不包括其运至施工作业地所崇的运费, 计算时, 泰用第一册《通用项目》的 相关定额》>1
- (4) 道路工程中如遇到土石方工程、拆除工程、档土墙及护坡工程等,可套用第 一册《通用项目》的相关定额。
  - (5) 定额中的工序、人工、机械、材料等均是综合取定的。
  - (6) 定额的多合土项目按现场袢和考虑,部分多合土项目考虑了厂拌。
- (7) 定额凡使用石灰的子目,均不包括消解石灰的工作内容。编制预算中,应先 计算出石灰总用量, 然后套用消解石灰子目。
  - (8) 道路 L程中的排水项目,可按《排水 L程》的相应定额执行。

#### 5.2 路基处理



路基处理包括路床(槽)整形、路基盲沟、基础弹软上处理(掺石灰、改换片石、石

灰砂桩、袋装砂井、塑料排水板、上下布、上下格栅、水泥稳定土、路基填筑)等相关子目。

#### 5.2.1 工程量计算规则

(1) 路床(槽)碾压宽度应按设计道路底层宽度加上加宽值计算,加宽值无明确规定时按底层两侧各加25cm 计算,人行道碾压加宽按一侧计算。

"无明确规定"是指无设计注明或施工组织设计无明确规定。

#### 知识链接

路床碾压检验一般指车行道部位土路基。

人行道整形碾压一般指整人行道部位土路基的整形、碾压。

【例 5-1】 某道路长 300m, 采用沥青混凝土面层、道路横断面如图 5.1 所示, 计算该 道路路床整形、碾压的工程量,并确定套用的定额子目。




图 5.1 道路横断面示章图

【解】车行道部位:路床(槽)整形碾压工程量=(17.5+0.5×2+0.25×2)×300=5 700(m²)

定额子目编号: [2-1]

人行道部位: 路床(槽)整形工程量=(6+0.25)×300×2=3 750(m2)

定额子目编号: [2-2]

### 特别提示

车行道结构层底宽根据车行道宽度、车行道结构计算确定。图 5.1 所示沥青混凝土路面车行道宽度包括平石宽。

人行道结构层底宽根据人行道宽度、人行道结构计算确定。图示人行道宽度包括侧 石宽。

- (2) 路基盲沟工程量按盲沟长度以 m 为单位计算。
- (3) 石灰砂桩工程量按设计桩断面×设计桩长以 m3 为单位计算。





- (4) 袋装砂井及塑料排水板工程量按设计深度以 m 为单位计算。
- (5) 铺设上 「合成材料(上 下布、上 下格棚) 
  「程量按设计图示尺寸以 m² 为单位计算。
  - (6) 路基填筑按填筑体积以 m3 为单位计算。

#### 5.2.2 定额套用及换算说明

- (1) 路床(槽)整形项目的内容包括平均厚度 10cm 以内的人工挖高填低、整平路床,使之形成设计要求的纵横坡度,并应经压路机碾压密实。
- (2) 上边沟成型项目综合考虑了边沟挖上的上类和边沟两侧边坡培整面积所需的挖土、培上、修整边坡及余上抛出沟外的全过程所需人工。边坡所出余上弃运路基 50m以外。
- (3) 混凝土滤管盲沟定额中不含滤管外滤层材料,发生时套用第六册《排水工程》 相应子目。
  - (4) 砂石盲沟定额断面按 40mm×40mm 确定,设计断面不同时,定额按比例换算。
- (5) 铺设上工合成材料定额中未考虑块石、钢筋锚固因素,如实际发生可按实际 计算有关费用。

定额中上工布按 300g/m² 取起,如实际规格为 150g/m²、200g/m²、400g/m²时, 定额人工分别乘以系数 0.7、0.8、1.2。

定额中上工布按针缝计算,如采用搭接,上工布乘以系数 1.05。

- (6) 袋装砂井直径按 7cm 计算, 如砂井直径不同时, 可按砂井截面积比率调整中(相)砂用量, 其他不变。
- 【例 5-2】 某道路工程路基采用土工布加筋处理,土工布采用斜铺,搭接连接, 土工布规格为 200g/m²,试确定定额宁目及基价。
  - 【解】套用的定额子目为: [2-18]H

基价=1 036+(0.8-1)×107.5+(1.05-1)×107.500×8.58  $\approx$  1 061(元/100m<sup>2</sup>)

# 5.3 道路基层

道路基层按位置分为底基层(底层)、上基层。定额中上基层包括石灰粉煤灰上基层、石灰粉煤灰碎石基层、石灰上碎石基层、粉煤灰上渣基层、水泥稳定碎石基层、水泥稳定碎石砂基层、沥青稳定基层等相关了目。定额中底基层包括砂砾石底层、卵石底层、碎石底层、块石底层、矿渣底层、塘渣底层、砂底层、石屑底层等相关子目。

#### 5.3.1 工程量计算规则

(1) 道路基层 L程量按设计道路基层图示尺寸以 m² 为单位计算。

## 知识链接

## 特别提示

放坡铺设的道路基层的工程量按中截面的面积计算。

- (2) 道路工程多合土养生面积计算, 按设计基层的顶层面积以 m2 为单位计算。
- (3) 道路基层工程量计算不扣除各种并所占的面积。

#### 5.3.2 定额套用及换算说明

- (I) 混合料基层多层次铺筑时,其顶层需进行养生,养生期按 7 天考虑,其用水量已综合在顶层多合上养生淀额内,使用时不得重复计算水量。
- (2) 各种底、基层材料消耗中如作面层封顶时不包括水的使用量,当作为面层封顶时 如需加水源压,加水量可另行计算。
  - (3) 基层混合料中的石灰均为生石灰的消耗量, 上为松方用量。
- (4) 本章定额中未包括搅拌点到施工点的熟料运输,发生时套用第一册《通用项目》相应的熟料运输定额。
- (5) 多合土基层电各种材料是按常用的配合比编制的,当设计配合比与定额不符时, 有关的材料消耗量可以调整,但人工和机械台班的消耗量不得调整。

## 知识链接

多合土基层配合比与定额不同时,有关的材料消耗量调整的计算公式如下:

$$C_i = C_d \cdot L_i / L_d \tag{5-4}$$

式中 C: 按设计配合比调整后的材料用量;

Ca—定额配合比中的材料用量:

Li——设计配合比中该材料的百分比;

Ld——定额配合比中该材料的百分比。

【例 5-3】 莱道路工程采用机拌石灰、粉煤灰、碎石基层,厚 20cm,设计配合比为: 石灰:粉煤灰:碎石=8:18:74,试确定该基层套用的定额子目及基价。

【解】套用的定额子目为: [2-39]H

定额合比为: 石灰:粉煤灰:碎石=10:20:70

按设计配合比调整的石灰、粉煤灰、碎石的消耗量如下:



粉煤灰消耗量=9.820× $\frac{18\%}{20\%}$ =8.838(t) 碎石消耗量=25.718× $\frac{74\%}{200\%}$ =27.188(t)

基价=543.52+3.168×230.00+8.838×120.00+27.188×49.00+6.3×2.95+10.88+122.29
≈ 3.817(元/100m²)

成老

基价 \*4 045+(3.168~3.960)×230.00+(8.838~9.820)×120.00+(27.188~25.718)×49.00  $\approx$  3 817(元/100m<sup>2</sup>)

- (6) 水泥稳定基层等如采用厂拌,可套用厂拌粉煤灰三渣基层相应子目; 道路基层如采用沥青混凝上摊铺机摊铺,可套用厂拌粉煤灰三渣基层(沥青混凝上摊铺机摊铺)相应子目,材料换算,其他不变。
- 【例 5-4】 某道路工程采用厂拌 6%水泥稳定碎石基层、厚 18cm,采用沥青摊铺 机摊铺,厂拌 6%水泥稳定碎石试的单价为 110 元/m、确定定额子目及基价。

【解】套用的定额子目为: [2-49]H-[2-50]A×2

基价=1 939+(110-87)×20.400-[91+(110-87)×1.020]×2≈2 179(元/100m²)

- (7) 定额中设有"每增减"的子目,适用于压实厚度 20cm 以内,压实厚度在 20cm 以上的应分两层结构层铺筑。
- 【例 5-5】 某路拌粉煤灰三渣基层,铺筑压实厚度为 38cm, 试确定定额子目及基价。
  - 【解】根据道路施工规范、基层压实厚度在 20cm 以上的应分两层结构层铺筑、 查用的定额于自为: [2-45]×2-[2-46]×2 基价=2 889×2-136×2=5 506(元(100m))

#### 知识链接

塘滏底层摊铺子目的最大厚度为25cm,当实际摊铺厚度与定额厚度不同时,采 用内插法计算确定定额子目及基价。

【例 5-6】 某工程人机配合铺筑 35cm 厚塘渣底层,试确定定额子目及基价。

【解】 套用的定额子目为: [2-101]+([2-101]-[2-100])×2 基价=1 522-(1 522-1 220)×2=2 126(元/100m²)

# 5.4 道路面层

#### 5.4.1 工程量计算规则

- (1) 沥青混凝土、水泥混凝土及其他类型路面工程量按设计图示尺寸以 m<sup>2</sup> 为单位计算。
- ① 带平石的面层应扣除平石面积。



沥青混凝土路面工程、图示车行道的宽度包括两侧平石的宽度、在计算沥青混凝土路 面面积时应扣除平石面积。

- ② 不扣除各类并所占面积。
- ③ 应包括交叉口转角增加的面积。

道路面层 T 程量=设计长度×设计宽度+交叉口转角增加面积 (5-5)



交叉口转角增加面积如图 5.2 阴影所示, 计算公式如下:

道路針交时、每个转角的路口面积=
$$R^2 \left( \tan \frac{\alpha}{2} - 0.00873 \alpha \right)$$
 (5-7)

#### 式中 R---转角半径:

α--特角对应的中心角,以角度计。




图 5.2 交叉口转角面积示章图

(2) 透层、粘层、封层工程量,按实际喷洒沥青油料的面积以 m2 为单位计算。



诱层油一般喷洒在基层顶面, 让油料渗入基层后方可铺筑沥青混凝土面层, 使基层与 沥青面层之间良好粘接。

粘层油一般喷洒在双层式或三层式热拌沥青混合料路面的沥青面层之间,使沥青面层 与面层之间粘成整体、提高道路的整体强度。

封层油一般用于路面结构层的连接与防护、如喷洒在需要开放交通的基层上、或在旧 路上喷洒进行路面修复,使道路表面密封,防止雨水侵入道路、保护路面结构层、防止表

#### 面磨耗层损坏。

- (3) 水泥混凝土路面钢筋、模板、养生、刻防滑槽、伸缩缝工程量计算规则。
- ① 模板 L程量根据施工实际情况,按与混凝土接触面积以 m² 为单位计算。
- ② 钢筋工程量按钢筋质量以 t 为单位计算。

式中 G--钢筋质量, kg:

d---钢筋直径, mm:

L---钢筋长度, m。

- ③ 伸缩缝嵌缝 L程量按设计缝长×设计缝深以 m² 为单位计算。
- ④ 锯缝机锯缝工程量按设计图示尺寸以"延长米"计算,即按缝长计算。
- ⑤ 路面刻防滑槽工程量按设计图示尺寸以 m² 为单位计算。
- ⑥ 路面养生工程量按设计图示尺寸以 m² 为单位计算。

【例 5-7】 某水泥混凝土道路工程如图 5.3 所示,胀缝设置 4 道、水泥混凝土路面采用 非泵送商品混凝土、分 4 幅浇筑、每幅宽度 4.5m、纵向施工缝如图 5.3(e)所示上部锯切槽口、切槽深度为 8cm、水泥混凝土路面采用养护液养护、计算主路水泥混凝土路面相关的工程量(交叉口兹围槽不计算)、并确定套用的定额子目及基价。

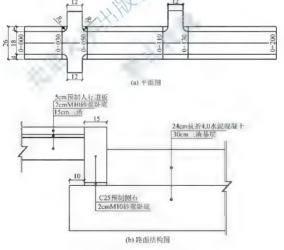


图 5.3 水泥混凝土道路工程图




图 5.3 水泥混凝土道路工程图(续)

- (1) 路面基础数据
- 主路直线段面积-200×18=3 600(m2)
- (2) 水泥泥凝土路面工程量=3 600m2
- 套用的定额子目为: [2-195]+[2-196]\*4
- 基价=6 882+334×4=8 218(元/100m2)
- (3) 水泥混凝土路面养生工程量=3 600m2
- 套用的定额子目为: [2-206]
- 基价=270(元/100m²)
- (4) 水泥混凝土路面刻防滑槽工程量=3 600m2
- 套用的定额子目为: [2-204]
- 基价=263(元/100m²)
- (5) 水泥混凝土路面模板 L程量=0.24×200×5=240(m²)
- 套用的定额子目为: [2-197]
- 基价=3 164(元/100m2)
- (6) 水泥混凝土路面钢筋工程量
- ① 纵缝拉杆:  $\phi$ 16 螺纹钢质量=0.73×(5×2+9)×200/5×0.00 617×16<sup>2</sup> ≈ 876(kg)
- ② 胀缝传力杆: \$\phi 28 圆钢质量=\frac{11}{4}\times 0.45\times 4\times 0.00 \text{ 617}\times 28^2 \approx 383(kg)
- 套用的定额子目为: [2 208]H
- [2 208]子目中圆钢占的比例: 0.22/(0.22+0.8)=21.57%
- 螺纹钢占的比例: 0.8/(0.22+0.8)=78.43%

## 市政工程计量与计价(第三版)

本工程中國钢占的比例: 383/(383+876)=30.42% 螺纹钢占的比例: 876/(383+876)=69.58%

#### 特别提示

水泥混凝土路面钢筋的圆钢综合、螺纹钢综合的含量如与定额含量不同时、按实调整、

本 厂 程 阅 钢、 螺纹钢 的 含量 与 定额 不一致。 需 按 比 例 调 整 圆 钢、 螺纹钢 的 消 耗 量。

调整后圆钢的消耗量=1×30.42%×(1+2%)=0.310(t)

螺纹钢的消耗量=1×69.58%×(1+2%)=0.710(t)

调整后基价=4 207+(0.310-0.220)×3 850+(0.710-0.800)×3 780

#### $=4213(\pi/t)$

- (7) 水泥混凝土路面锯缝工程量
- ① 横向缩缝: 锯缝机锯缝工程量=(200/5-1-4)×18=630(m)
- ② 纵向施工缝: 锯缝机锯缝工程量=200×3=600(m)

合计锯缝机锯缝工程量=630+600=1 230(m)

奪用的定额子目为: [2-203]

基价=40 元/10 延长米

- (8) 伸缩缝嵌缝工程量
- ① 缩缝嵌缝工程量=630×0.08=50.4(m2)
- 套用的定额子目为: [2-201]

基价=547 元/10m2

- ② 伸缝嵌缝工程量
- (a) 伸鋒(胀鋒)嵌油浸木層板工程量=(0.24-0.04)×18×4=14.4(m2)
- 奪用的定额子目为: [2-198]
- 基价=658 元/10m2
- (b) 伸缝(胀缝)嵌沥青玛蹄脂工程量=0.04×18×4=2.88(m2)

伸缝(纵向施工缝)嵌沥青玛蹄脂工程量=600×0.08=48(m2)

合计伸缝(胀缝)嵌沥青玛蹄脂工程量=2.88+48=50.88(m2)

套用的定额子目为: [2-199]

基价=990 元/10m2

#### 5.4.2 定额套用及换算说明

- (1) 黑色碎石路面所需要的面层熟料实行定点搅拌时,其运至作业面所需的运费不包括在该项目中,需另行计算。
- (2) 喷酒沥青油料定额中,分别列有石油沥青和乳化沥青两种油料,应根据设计要求 套用相应项目。如果设计与定额的喷油量不同、沥青油料含量换算。



定额喷油量见表 5-1。

Par Miles		用油量	/(kg/m²)	
PW.	777.広	石油沥青	乳化沥青	
诱层油	无机结合料与粒料基层	1.04	1.34	
15年 月長 70日	半刚性基层	0.8	0.89	
ab 17 11	新建或旧沥青面层上	0.39	0.44	
粘层油	旧水泥混凝土路面上	0.375	0.40	
41 P 14	上封层	1.04	0.91	
封层油	下封层	0.114	0.97	

- 注: 沥青稳定类半刚性基层上摊铺沥青混凝土面层不需要喷洒透层油。
- (3) 粗、中粒式沥青混凝土路面在发生厚度"增减 0.5cm"时,定额子目按"每增减 1cm"子目减半套用。
- 【例 5-8】 某沥青混凝土路面工程, 道路结构如图 5.4 所示, 沥青混凝土面层均采用沥青摊铺机摊铺, 确定沥青混凝土面层及粘层油, 透层油套用的定额子目及基价。




图 5.4 某沥青混凝土道路结构图

【解】(1) 4cm 细粒式沥青混凝上面层 套用的定额子目为: [2 191]+[2 192]×2



基价=2.368+411×2=3.190(元/100m²)

(2) 5.5cm 中粒式沥青混凝土面层 套用定额子目: [2 184]+[2 186]/2 基价=3 509+687×0.5≈3 853(元/100m²)

(3) 6cm 粗粒式沥青混凝土面层 套用定额子目: [2-175] 基价=3 766 元/100m<sup>2</sup>

(4) 乳化沥青粘层油

套用定额子目: [2-150]H

查表 5-1 可知, 定额喷油量为 0.44kg/m²

接设计喷油量调整后的乳化沥青消耗量= $\frac{0.52}{0.44}$ ×46.000=54.364(kg)

基价=222+(54.364-46.000)×4.50=260(元/100m2

(5) 乳化沥青透层油

套用定额子目: [2-148]H

查表 5-1 可知, 定额喷油量为 0.89kg/m2

接设计喷油量调整后的乳化沥青消耗量= $\frac{1.10}{0.89}$ ×93.000=114.944(kg)

基价=435+(114.944-93.000)×4.50=534(元/100m2)

- (4) 水泥混凝土路面综合考虑了前台的运输工具及有筋、无筋等不同所影响的工效。水泥混凝土路面中不包括钢筋用量。如设计有钢筋时,套用水泥混凝土路面钢筋制作项目。
  - (5) 水泥泥凝土路面厚度与定额不同时, 按每增予目换算。
- 【例 5-9】 某道路水泥混凝土路面工程,机动车道面层厚度为 23cm,非机动车道面层厚度为 18cm,采用抗折 4.0 非泵送商品混凝土,确定套用的定额子目及基价。

【解】① 18cm 厚度路面: [2-195]-[2-196]×2 基价=6 882-334×2=6 214(元/100m²)

② 23cm 厚度路面: [2-195]+[2-196]×3

基价=6 882+334×3=7 884(元/100m²)

(6) 水泥混凝土路面以平口为准,如设计为企口时,混凝土路面浇筑定额人工乘以系数1.01。

【例 5-10】 现浇水泥混凝土路面,厚度为 24cm,采用现拌混凝土,混凝土抗折强度为 5.0MPa, 确定套用的定额子目及基价。

【解】套用定额子目: [2-193]H+[2-194]H×4

抗折强度 4.0MPa 的路面混凝土材料单价为 219.75 元/m³

抗折强度 5.0MPa 的路面混凝土材料单价为 242.55 元/m³

基价=5 571+(242.55-219.75)×20.300+[259+(242.55-219.75)×1.015]×4 ≈ 7 162(元/100m²)

【例 5-11】 现浇现拌水泥混凝土路面 4.5MPa,厚度 20cm,采用企口形式,确定套用的定额子目及基价。

【解】套用定额子目: [2 193]H

抗折强度 4.0MPa 的路面混凝土材料单价为 219.75 元/m³ 抗折强度 4.5MPa 的路面混凝土材料单价为 228.78 元/m³

基价 5 571+964.92×(1.01 1)+(228.78 219.75)×20.300≈5 764(元/100m2)

(7) 混凝上路面定额不包括搅拌点至施工点的熟料运输,发生时套用第一册《通用项目》相应熟料运输定额。

# 5.5 人行道及其他

人行道平侧石及其他包括人行道基础、人行道板安砌、铺草坪砖、石材面层安砌、 广场砖铺设、侧平石垫层、侧平石空砌、现浇侧平石、砌筑树池、消解石灰等相应子目。



#### 5.5.1 工程量计算规则

(1) 人行道板、草坪砖、石材面层、广场砖铺设按设计图示尺寸以 m² 为单位计算。 不扣除各类非所占面积, 但应扣除侧石, 树池及单个面积大于 0.3m² 的矩形落板等的面积。





交叉口转弯处人行道的长度 
$$L=\frac{R_1+R_2}{2}\times\frac{\alpha}{180}\pi$$
 (5-9)

式中 L--人行道的长度, m;

 $R_1$ ——人行道内侧半径, m;

 $R_2$ ——人行道外侧半径,m;

α-特角对应的中心角,以角度计。

【例 5-12】 某道路丁字路口如图 5.5 所示,已知人行道宽 5m,人行道内侧侧石宽 15cm,人行道外侧无侧石,计算该交叉口左侧转弯处人行道板安砌的工程量。

【解】该处人行道内侧转弯半径=15m

该处人行道外侧转弯半径=10m

该处人行道长度= $\frac{15+10}{2} \times \frac{90}{180} \pi = 19.63$ (m)

该处人行道板安砌工程量=19.63×(5-0.15)=95.21(m2)

#### 特别提示

图 5.5 所示人行道的宽度包括侧石宽度, 计算人行道板安砌工程量时, 应扣除侧石所占的面积。






图 5.5 某道路丁字路口示意图

- (2) 侧平石安砌、砌筑树池等项目按设计长度以"延长米"为单位计算,不扣除侧向 讲水口长度。
  - (3) 现浇侧石项目按现浇混凝土体积以 m³ 为单位计算。
  - (4) 侧平石垫层按垫层体积以 m3 为单位计算。
  - (5) 消解石灰按石灰的质量以 t 为单位计算。

#### 5.5.2 定额套用及换算说明

- (1) 采用的人行道板、侧平石、花岗石等砌料材料与设计不同时,应进行调整换算,除定额另有说明外;从工和机械不变。
- (2) 各类垫层配合比、厚度如与设计不同时,材料、搅拌机械应进行调整,人工不变。 【例 5-13】 英道路工程采用 250mm×250mm×50mm 人行道板,下设 3cm 厚 M10 水泥砂浆垫层,确定套用的定额子目及基价。
  - 【解】套用定额子目: [2-215]H

M7.5 水泥砂浆材料单价为 168.17 元/m<sup>3</sup> M10 水泥砂浆材料单价为 174.77 元/m<sup>3</sup>

定额子目中砂浆垫层厚度为 2cm, 按设计厚度调整水泥砂浆, 灰浆搅拌机消耗量如下:

水泥砂浆消耗量=
$$\frac{3}{2}$$
×2.120=3.180(m³)  
灰浆搅拌机消耗量= $\frac{3}{2}$ ×0.350=0.525(台班)

基价=3 346+(3.180×174.77-2.120×168.17)+(0.525-0.350)×58.37  $\approx 3.555(\bar{\pi}/100\text{m}^2)$ 

- (3) 人行道板安砌项目中的人行道板如采用异型板,其定额人工乘以系数 1.1,材料消耗量不变。人行道砖人字纹铺装按异型考虑。
- 【例 5-14】 某人行道采用彩色人行道板、梅花形铺设,人行道板单价为 55 元/m²,人行道板下设 3cm 厚 M10 水泥砂浆垫层、15cm 厚 C15 混凝上基础,试确定人行道板安砌的

定额子目及基价。

【解】 套用定额子目: [2-215]H

子目中人行道板的材料单价为 20 元/m2

梅花形铺设按异型考虑、其定额人工乘以系数 1.1

基价=3 346+898.70×(1.1 1)+[3.180×174.77 2.12×168.17+(55 20)×103.00]+ (0.525-0.350)×58.57

 $\approx 7.250(\pi/100\text{m}^2)$ 

- (4) 侧石高度大于 40cm 的,按高侧石定额套用。
- (5) 预制成品侧石安砌中,如其弧形转弯处为现场浇筑,则套用现浇侧石子目。
- (6) 现场预制侧平石制作定额套用第三册《桥涵工程》的相应定额子目。
- (7) 石材面层安砌定额中板材厚度按 4cm 以内编制,如设计厚度在 6cm 以内时,定额 人工乘以系数 1.2。
- (8) 广场砖铺贴定额中的"拼图案"指铺贴不同颜色或规格的广场砖形成环形、菱形等图案,如图 5.6 所示; 分色线性铺装按"不拼图案"定额套用,如图 5.7 所示。




图 5.6 广场砖拼图案铺装

图 5.7 广场砖分色线性铺装

【例 5-15】 图 5.8 所示为 200m 长的道路工程。求: (1)侧石长度; (2)水泥混凝土路面面积; (3)人行道板安砌面积(包括分隔带铺筑面积)。


【解】(1) 侧石长度

- ① 人行道内侧侧石长度=(200-40)×2+π×10×2=382.8(m)
- ② 中央分隔带侧石长度=(40-4)×4+2π×2×2=169.12(m)


侧石总长度=382.8+169.12=551.92(m)

- (2) 水泥混凝土路面面积
- ① 主线直线段面积=200×20=4 000(m2)
- ② 支路直线段面积=20×10×2=400(m2)
- ③ 交叉口转角增加面积 0.214 6×102×4-85.84(m2)





(a) 道路平面示意图(路口转角半径R-10m, 分隔带半径r-2m)



(b) 有分隔带段水泥混凝土路面结构图(单位: cm)


#### 图 5.8 道路平面图和结构图

- 中央分隔带面积(含侧石)=(36×4+π×2²)×2=313.12(m²)
   水泥混凝土路面面积=4 000+400+85.84-313.12=4 172.72(m²)
- (3) 人行道板安砌面积
- ① 人行道的面积(含侧石)=(200-40)×10×2+π×102=3 514(m2)
- ② 中央分隔带面积(含侧石)=(36×4+π×22)×2=313.12(m2)

人行道板安砌面积=3 514+313 12-382 8×0 15-169 12×0 15=3 744 33(m2)

### 5.6 道路工程定额计量与计价实例

【例 5-16】 某市风华路道路工程、为城市次干道、F 2016年3月10日 3月16日进行工程招投标活动。风华路起途桩号为0+560-0+800、于桩号0+630处与风情路正交、风情路实施至切点外20m、风华路路幅宽为34m、风情路路幅宽26m、详见图5.9 道路平面图、图5.10 道路标准横断面图。风华路路给构层采用沥青混凝土面层、粉煤灰三渣基层、排渣整层,详见图5.11 道路结构图,风情路道路结构同风华路。已知该道路工程挖方量为2900m<sup>3</sup>,填方量为1200m<sup>3</sup>,土质条别为三类土。

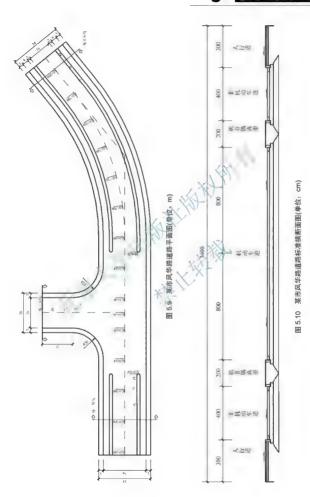

125



试按定额计价模式采用工料单价法编制本工程的投标报价,本工程风险费用暂不考虑, 农民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险费暂不考虑,本工程无创标化工程要求,本工程不得分包,本工程无暂列金额、计日工。

#### 知识链接

定额计价模式计算工程造价(投标报价)的基本顺序如下。

- (1) 确定工程的施工方案。
- (2) 计算工程相关的基础数据,如道路的侧平石长度、道路的车行道路面面积、人行道面积等。
- (3)根据施工图纸,结合施工方案,确定分部分项的项目,并按定额的计算规则计算工程量,并确定套用的定额子目。
- (4)根据施工方案、结合工程的实际情况、确定施工技术(/单价)措施项目、并按定额的 计算规则计算工程量、并确定套用的定额子目。
  - (5) 根据施工方案,结合工程的实际情况,确定施工组织(/总价)措施项目。
  - (6) 确定人、材、机单价,判定工程类别、确定各项费率。
  - (7) 按照费用计算程序, 计算工程造价。(通常采用计价软件计算确定工程造价)

#### 【解】1. 确定本道路工程的施工方案。

- (1) 挖方采用挖掘机进行,多余的土方直接装车用自卸车外运,运距为 5km; 场内平衡的土方用机动翻斗运至需回境的路段用于回填,填方用内燃压路机碾压密实。
  - (2) 塘渣垫层采用人机配合铺筑。
  - (3) 粉煤灰三渣基层施工时两侧支立钢模板,顶面采用酒水养护。
- (4)人行道基础混凝土采用现场拌和、拌和机设在桩号 0+700 处、拌制后混凝土采用机动翻斗车运至施工点、混凝土浇筑时支立钢模板。
  - (5) 水泥砂浆采用砂浆搅拌机在施工点就地拌制。
  - (6) 沥青混凝土、人行道板、平石、侧石均采用成品。
  - (7) 沥青混凝土采用沥青摊铺机摊铺。
- (8) 配备以下大型机械:  $1 m^3$  履带式挖掘机 1 台、90kW 内履带式推土机 1 台、压路机 2 台。
  - 2. 计算本道路工程的基础数据。
  - 1) 侧(平)石长度 L
  - (1) 人行道(内侧)侧(平)石长度

$$L_{\text{AH4}} = 240 + 240 - 60 + \frac{2\pi \times 20}{4} \times 2 + 20 \times 2 = 522.80 \text{(m)}$$

(2) 机非隔离带侧(平)石长度

 $L_{RS} = (30 \cdot 1) \times 4 + 2 \times \pi \times 1 + (130 - 1) \times 4 + 2 \times \pi \times 1 = 644.56(m)$ 

合计: 侧(平)石长度 L= L Afriel+ L Man = 522.80+644.56=1 167.36(m)

2) 人行道面积(含侧石)

$$S_{\text{ A} \in \mathfrak{A}(\text{chw})} - 240 \times 3 + 40 \times 3 + 140 \times 3 + 20 \times 3 \times 2 + \frac{2\pi \times 20 + 17}{4} \times 3 \times 2 = 1.554.27 (\text{m}^2)$$

## 市政工程计量与计价(第三版)

- 3) 车行道面积(含平石)
- (1) 主路直线总面积(含机非隔离带) S + \*\*\* = 28×40=6 720(m²)
- S \* スラーウス コリカ かまか = 20×(20+20)+0.214 6×20\*×2=971.68(m\* (3) 机非隔离帯面积
- $S_{\text{MRR}}$ =(30-1)×3×2+(130-1)×3×2+ $\pi$ ×1<sup>2</sup>×2=954.28(m<sup>2</sup>) 合计: 车行道面积(含乎石) $S_{\frac{4+3}{6}(2+5)}$ =6720+971.68·954.28-6737.40(m<sup>2</sup>) 3. 计算分部分项的项目工程量、并确定套用的定额子目、见表5-2。

表 5-2 分部分项项目工程量计算表

	农 3-2 万部万坝坝日土柱至订异农							
序号	. minawa ka	<b>単</b> 位	A STATE OF THE STA		定額 子目			
1	挖掘机挖 1. 并装车( . 类土)	m³	2 900-1 200×1.15	1 520	1-60			
2	挖掘机挖土不装车(三类土)	m³	1 200×1.15	1 380	1-57			
3	机动翻斗车运土(运距 200m 内)	m³	1 200×1.15	1 380	1-32			
4	填上碾压(内燃压路机)	m³	已知条件	1 200	1-82			
5	自卸车运土方(运距 5km)	m³	2 900-1 200×1.15	1 520	1-68+ 1-69×4			
6	路床碾压检验	m <sup>2</sup>	6 737.40+1 167.36×(0.15+0.1+0.1+0.4 +0.25)	7 904.76	2-1			
7	40cm 厚塘渣垫层	m²	6 737.40+1 167.36×(0.15+0.1+0.1+0.2)	7 379.45	2-101×4-2-100×3			
8	30cm 粉煤灰飞灌基层	m²	6 737.40+1 167.36×(0.15+0.1)× 20/30	6 931.96	[2-47-2-48×5]×2			
9	: 渣基层顶面洒水养护	m²	等于车行道面积(含平石)	6 737.40	2-51			
10	透层油(乳化沥青, 1.10kg/m²)	m <sup>2</sup>	6 737.40-1 167.36×0.3	6 387.19	2-14 <sub>H</sub>			
11	7cm 粗粒式沥青混凝土面层	m²	同透层油面积	6 387.19	2-175+2-176			
12	粘层油(乳化沥青, 0.52kg/m²)	m <sup>2</sup>	6 387.19×2	12 774.38	2-149 <sub>H</sub>			
13	4cm 中粒式沥青混凝土面层	m <sup>2</sup>	同透层油面积	6 387.19	2-183			
14	3cm 细粒式沥青混凝土面层	m²	同透层油面积	6 387.19	2-191			
15	人行道整形碾压	$m^2$	1 554.27+522.80×0.25	1 684.97	2-2			
16	人行道 12cm 厚 C15 混凝 上 基础	m²	1 554.27-522.80×0.15	1 475.85	2-211+2-212×2			
17	机动翻斗车运输混凝土 (200m)	m³	1 475.85×0.12	177.10	1-319			
18	250mm×250mm×50mm 人行 道板人字纹安装(3cm 厚 M7.5 水泥砂浆)	m <sup>2</sup>	1 554.27 522.80×0.15	1 475.85	2-215 <sub>H</sub>			

44.4

序号	分部分项项目名称	道位	N/M ST	W.H	定額 子目
19	15mm×37mm×100mm C30 混凝土侧石安砌	m	522.80+644.56	1 167.36	2-228
20	30mm×30mm×12mm C30 混 凝土平石安砌	m	522.80+644.56	1 167.36	2-230
21	侧平石垫层(2cmM7.5 水泥砂浆)	m³	1 167.36×0.15×0.02+1 167.36×0.3×0.02	10.51	2-227

4. 确定技术措施项目,并计算工程量、确定套用的定额子目,见表 5-3。

表 5-3 技术措施项目工程量计算表。

序号	技术措施项目名称	单位	世史		定額 子目
1	粉煤灰三渣基层模板	m²	1 167.36×0 3	350.21	2-197
2	人行道基础混凝土模板	m²	$(240+240-60+\frac{2\pi\times17}{4}\times2+20\times2)\times0.12$	61 61	2-197
3	lm'履带式挖掘机进出场	台班	根据施工方案确定	1	3001
4	90kW 内腹带式推土机进出场	台班	根据施工方案确定	1	3003
5	压路机进出场 二	台班	根据施工方案确定	2	3010

#### 5. 确定组织措施项

根据本工程的实际情况, 考虑计取以下施工组织措施项目: 安全文明施工费、工程定 位复测费、夜间施工增加费、行车行人干扰增加费、已完工程及设备保护费。

- 6. 确定人、材、机单价、判定工程类别、确定各项费率。
- (1) 粉煤灰三產基层单价为 120 元/m3, 塘渣垫层单价为 35 元/t, 30cm×30cm×12cm C30 混凝土平石单价为 13 元/m,一类人工工日单价为 65 元,二类人工工日单价为 70 元,其他 人、材、机单价按《浙江省市政工程预算定额》(2010版)计取。
  - (2) 城市次干道为二类道路工程。
- (3) 企业管理费、利润、各项组织措施费的费率按《浙江省建设工程施工费用定额》(2010 版)及浙江省有关规定的费率范围的低值计取;规费、税金按《浙江省建设工程施工费用定 额》(2010版)的规定计取。
  - 7. 计算定额计价模式下,本道路工程的工程造价详见表 5-4~表 5-12。

#### 表 5-4 投标报价扉页

某市风华路道路工程

预算价

预算价

(小写): 1 646 540 元

#### 市政工程计量与计价(第三版)

	(大写):	壹佰陆拾肆万	陆仟伍佰肆拾元整		
发包人:		承包人:		工程造价 咨询人:	
	(单位盖章	)	(单位盖章)		(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:			法定代表人 或其授权人:		
	(造价人员	签字盖专用章)		(造价人	、员签字盖专用章)
编制人:			复核人:		
	(造价人员	签字盖专用章)		(造价工程	程师签字盖专用章)
编制时间:	2016.3.15		复核时间:		
		#	£ 5-5 总说明	11	

L 程名称: 某市风华路道路 L 程

第1页 共15

#### -、「程極况

某市风华路道路 L程, 为城市次 L道, 风华路起论桩号为 0+560~0+800. 于桩号 0+630 处与风情路 正交, 风情路实施至切点外 20m. 风华路路幅宽 34m. 风情路路幅宽 26m。

风华路道路结构层采用沥青混凝土面层、粉煤灰。流基层、塘渣垫层、风馆路道路结构同风华路。 已知该道路1,程校方量为2,900m³, 埠方量为1,200m°, 上质类别为三类土。

#### 二、工程施工方案

- (1) 挖方采用挖掘机进行。多余的1方直接装车用户卸车外运、运览为 5km;场内平衡的1.方用机 动翻斗运至需同堆的路段用于回填。填方用内燃压路机碾压密实。
  - (2) 塘渣垫层采用人机配合铺筑。
  - (3) 粉煤灰三流基层施工时两侧支立钢模板,顶面采用洒水养护。
- (4)人行道基础混凝土采用现场拌和,拌和机设在桩号 0+700 处,拌制后混凝土采用机动翻斗车运车施工点,湿凝土浇筑时支立钢樓板。
  - (5) 水泥砂浆采用砂浆搅拌机在施工点就地拌制。
  - (6) 沥青混凝土、人行道板、平石、侧石均采用成品。
  - (7) 沥青湿凝上采用沥青摊铺机摊铺。
  - (8) 配备以下大型机械: 1m3 履带式挖掘机 1 台、90kW 内履带式推上机 1 台、压路机 2 台。

#### 三、人、材、机价格取定

粉煤灰:: : 查基层单价为 120 元/m³, 塘濱墊层单价为 35 元/t, 30mm×30mm×12mm C30 混凝土平石单价为 13 元 m, ·类人工工日单价为 65 元, :类人工工日单价为 70 元, 其他人、材、机单价按《浙江省市政工程预算定额》(2010 版)计取。

#### 四、费率取定

企业管理费、利润、各项组织措施费的费率按《浙江省建设工程施工费用定额》(2010 版)及浙江省 有关规定的费率范围的低值计取;规费、税金按《浙江省建设工程施工费用定额》(2010 版)的规定计取。 五、编制依据

- (1)《浙江省市政工程预算定额》(2010版)。
- (2)《浙江省建设工程施工费用定额》(2010版)。
- (3) 浙建站计[2013]64号 关于《浙江省建设工程费用定额》(2010版)费用项目及费率调整的通知。
- (4) 建建发[2015]517号 关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知。

#### 表 5-6 工程项目预算汇总表

#### 工程名称:某市风华路道路 L程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额/元
1	市政	1 646 540.21
1.1	道路	1 646 540.21
	合 计	1 646 540

#### 表 5-7 单位(专业)工程预算费用计算表

单位(专业) [程名称: 市政 道路

1页 共1页

序号		费用名称	计算公式	金额/元
-	fy. 37 i.	它额分部分项上程量	按口价规则规定计算	1 489 180.62
	其中	1. 人工费+机械费	Σ(定额人工费+定额机械费)	208 933.12
	施工组	且织措施费	· **	28 414.90
		2. 安全文明施工费(含扬尘防治 增加费)	1×11.54%	24 110.88
	44 mlm	3. 工程定位复测费	1×0.03%	62.68
	其中	4. 夜间施工增加费	1×0.01%	20.89
		5. 已完工程及设备保护费	1×0.02%	41.79
		6. 行人、行车于抗增加费	1×2% V.XXT	4 178.66
=	企业管	行理费 、ノンク	1×18.2%	38 025.83
四	利润	2/2	1×9%	18 803.98
£	规费	(Z-' ×	12+13	15 252.12
	12. 排	能污费。社保费、公积金	1×7.3%	15 252.12
	13. %	<b>文民工工伤保险费</b>	按相关规定计算	0.00
六	危险作	<b>宇业意外伤害保险费</b>	按相关规定计算	0.00
七	总承包	<b>见服务费</b>		0.00
	14	总承包管理和协调费	分包项目工程造价×0%	0.00
	15. Æ	总承包管理、协调和服务费	分包项目工程造价×0%	0.00
	16. 5	甲供材料设备管理服务费	甲供材料设备费×0%	0.00
Л	风险影	世	(一+二+三+四+五+六+七)×0%	0.00
九	暂列金	定额	(一+二+三+四+五+六+七+八)×0%+ 创标化工地增加费	0.00
+	计税/	下计费	计税不计费	0.00
+-	不计和	说不计费	不计税不计费	0.00
+:	税金		( '+ '+ '+ 三+ 四+ 五+ 六+ 七+ 八+ 九+ †)×3.577%	56 862.76
+:	建设	工程造价	-+:++四+五+六+七+八+九+十+ ++十-	1 646 540.2



表 5-8 工程预算书(分部分项项目)

Jones Jones					-		单价组成		
1						±≡¥	THE	Media	46
-	09-1	<b>25幅长控一类中,装有</b>	1 000m	1.520	3 932.07	312.00	0.00	3 620.07	\$ 976.75
2	1 57	挖墙机,挖、类土, 不读4	1 000m³	1.380	2 577.54	312.00	0.00	2 265.54	3 557.01
3	1 32	机动翻斗车运士, 远别: 200m 内	100m³	13 800	1 464.35	587.60	0.00	876.75	20 208.03
4	1 82	内然压路机、填土碾压	1 000m <sup>3</sup>	1.200	2 470.16	312.00	14.75	2 143,41	2 964.19
NO.	1 68:1 69~4 换	自卸汽车运士, 这别: Skm	1 000m³	1.520	10 323 75	0.00	35.40	10 288 35	15 692.10
9	2-1	路床碾压检验	100th <sup>2</sup> /	79.408	123.55	22.68	0.00	100.87	9 810.81
7	2 101~14 换	人机配合铜装原液度, 厚度 25cm J-4	100m <sup>2</sup>	73.795	8 030.35	273.00	7 210.76	546.59	592 595.66
00	2 100・J 3 換	人机配合铺装塘港底层, 厚度 20cm J× 3	100m²	73 795	4 832.97	181.65	4 326,41	324.91	356 646.60
6	2 47+2 48× 5 换	粉煤灰;液基层, J. 撑, 厚度 15cm	100m²	69.320	2 260.60	352.80	1 856.30	51.50	156 703.89
10	2-47+2-48×-5 换	粉煤灰液基层, J. 拌, 厚度 15cm	100m²	69.320	2 260.60	352.80	1 856.30	51.50	156 703.89
=	2 51	消水不清水	100m²	67.374	24.57	4.90	4.35	15.32	1 655.38
12	2 14811	透层乳化沥青, 半侧件基层	100m²	63 872	534 77	2.52	\$19.96	12.29	34 156.78
13	2 175+2 176×1 換	机械排储粗料式沥青混凝土路面, 厚度 7cm	10005	63.872	4 408.13	76.65	4 053.26	278.22	281 555.64
14	2 15011	特异乳化沥青, 加春异	100m²	127.744	262.81	8.40	245 85	8.56	33 572.35
15	2 183	机械排储中粒式沥青混凝;路面, 厚度 4cm	100m²	63.872	2 845.46	53.90	2 640.80	150.76	181 744.94
16	2 191	机模排铺组料式沥青泥漆土路面, 厚度 3cm	100m <sup>2</sup>	63 872	2 389 01	53.20	2 187.33	148 48	152 590.61
17	2-2	人行道整形碳压	100m²	16.850	119.98	108.50	0.00	11.48	2 021.63
90	2 211+2 212×2 換	人行,道池猴+基础,厚度 12cm	100m <sup>2</sup>	14 759	3 414 73	850.92	2 411 88	151.93	50 396.29
6	1 319	机动翻斗车运水泥泥灌上(熟料), 运群 200m	10m³	17.780	146.42	102.20	0.00	44.22	2 593.10

	ì	ı		
۰	7			
	ŧ		٤	

1							单价组成		
£						人工法	材料费	机瓶费	, and a
20	20 2 215 换	人行道钣人字纹安砌, M7.5 水建砂浆垫层, 厚度 3cm	100m²	14.759	4 244.69	1 609.30	4 244.69 1 609.30 2 604.64	30.75	62 645.26
21	2 228	370mm~150mm~1 000mm 混模 1.例在安朗	100m	11.674	11.674 2 422.37 676 90 1 745.47	676 90	1 745.47	0.00	28 277.78
22	2 230	300mm-300mm-120mm 混谜上半右交函	100m	11.674	1 691.63	357 00	1 334 63	00'0	19.747.41
23	23 2-227	侧平石 M7.5 砂浆粘接层	'm'	10 510	268.46	95 76	172 70	00.00	2 821.51
		<b>本</b> 東小 中	111						1 461 344.41

单位(主	导业)工程名(	单位(专业)工程名称; 市政 道路			7.7.				第1月 共1页
			A.		+		单价组单		
like a					X	YTY,	材料要	和概念	
-	2 197	<b>粉煤及,香棉层橄板</b>	100m²	3 502	4 023.02	2 226.00	1 535 01	262 01	14 089 02
2	2 197	人行。道親議上基帥模板	100m²	0.616	4 023.02	2 226.00	1 535.01	262 01	2 478 58
m	3001	聚带式控制机 1mi 以内	平平	1.000	3 359.57	840 00	1 196.31	1 323 26	3 359 57
4	3003	被带式推士。81,90kW以内	台班	1.000	2 450.90	420,00	707.64	1 323.26	2 450.90
S	3010	月路机	台班	2.000	2 729.07	350.00	1 055.81	1 323.26	5 458,14
							3		
				本页小计					27 836 21
				43					27 836.21

#### 表 5-10 主要材料价格表

单位(专业) [程名称: 市政-道路

第1页 共1页

序号	材料编码	材料(设备)名称	into 254		X.E	1-0.2	aranz.
1	0401031	水泥	42 5	kg	49 430.022	0.33	16 311.91
2	0403043	黄砂(净砂)	综合	ŧ	253.155	62.5	15 822.19
3	0407001	塘渣		ŧ	6 027.830	35	210 974.05
4	0407071	厂拌粉煤灰 渣		m <sup>3</sup>	2 121.180	120	254 541 57
5	0433071	细粒式沥青商品 混凝土		m³	193.532	713	137 988.21
6	0433072	中粒式沥青商品 混凝土		m³	258.042	648	167 211.52
7	0433073	粗粒式沥青商品 混凝土		vm3 1	451.574	568	256 494.22
8	1155031	乳化沥青	100	kg	14 286.356	4.5	64 288.60
9	3305061	人行道板	250mm×250mm×50mm	m <sup>2</sup>	1 520.126	20	30 402.51
10	3307001	混凝土平石	300mm×300mm×120mm	m	I 184.870	13	15 403.32
11	3307011	道路侧石	370mm×150mm×1 000mm	m	1 184.870	17	20 142.80
12	1201011	柴油(机械)	LYV	kg	9.175.428	6.35	51 913.97
13	8021201	现浇现拌混凝土	C15(40)	m <sup>3</sup>	179.759	183.249 5	32 940.66
			合 计				1 274 435.53

#### 表 5-11 主要工日价格表

**首位于大小工程少数**。 在數 48

A 1 W 11 1 W

序号	工种	单位	数量	单价/元
1	类人 L	LH	144 432	65
2	二类人工	LH	1 927.211	70

#### 表 5-12 主要机型台班价格表

单位(专业)工程名称: 市政 道路

第1页 共1页

序号	机械设备名称	单位	数量	单价/元
1	履带式推上机 75kW	台班	7.617	576.516 5
2	履带式推上机 90kW	台班	2.708	705.633 5
3	平地机 90kW	台班	13.800	459.544
4	履带式单斗挖掘机(液压)1m3	台班	6.230	1 078.38

继老

				失化
序号	机械设备名称	单位	数量	单价/元
5	内燃光轮压路机 8t	台班	30.730	268.336 5
6	内燃光轮压路机 12t	台班	24.557	382.671 5
7	内燃光轮压路机 15t	台班	55.892	478.822 5
8	汽车式沥青喷洒机 4 000L	台班	1.916	620.473
9	沥青混凝土推铺机 8t	台班	19.928	789.950 5
10	汽车式起重机 5t	台班	4.453	330.21
11	载货汽车 4t	台班	0.659	282.438
12	自卸汽车 12t	台班	23.712	644.776 5
13	平板拖车组 40t	台班	À4.000	993.049 5
14	机动翻斗车 lt	台班 /	/ 131.700	109.730 5
15	洒水汽车 4 000L	台班~~	4.327	383.056
16	双锥反转出料混凝土搅拌机 350L	/台联 厂	5.889	96.726 1
17	灰浆搅拌机 200L	沙门台班	7.748	58.572 9
18	木工圆锯机 \$ 500	八台班	19.479	25.386
19	木工平刨床 300mm	台班	19.479	12.774 4
20	混凝土振捣器平板式 BLL	台班 。。	5.889	17.556

## 思考题与习题

#### 一、简答题

- 1. 计算道路工程路床(槽)碾压工程量时,碾压宽度如何确定? 计算人行道整形碾压工 程量时,碾压窗度如何确定?
  - 2. 土工布规格与定额不同时,如何进行定额的换算套用?
  - 3. 多合土基层中, 各种材料的设计配合比与定额配合比不同时, 如何套用、换算定额?
  - 4. 道路(上)基层厚度超过 20cm 时,如何套用定额?
  - 5. 道路底层(下基层)厚度超过 20cm 时,如何套用定额?
  - 6. 水泥混凝土路面伸缩缝工程量如何计算? 模板工程量如何计算?
  - 7. 水泥混凝土路面施工时,需考虑计算哪些分项工程的工程量和费用?
  - 8、 粘层油、透层油、封层油有什么区别与不同?
- 9. 如设计采用的人行道板、侧平石的垫层强度等级、厚度与定额不同时,如何套用 定额?
  - 10. 人行道板安砌工程量计算时,应考虑扣除哪些面积?
  - 11. 现浇侧平石的模板工程量如何计算?
  - 二、计算题
  - 1. 某道路工程长 1km,设计车行道宽度为 18m,设计要求路床碾压宽度按设计车行道



额子目及基价。

宽度每侧加宽 40cm 计,以利于路基的压实。计算该工程路床整形碾压的工程量,并计算该工程的直接工程费(人工费+机械费+材料费)。

- 2. 菜道路工程采用机拌的石灰、粉煤灰、碎石基层、厚 20cm,设计配合比为石灰: 粉煤灰、碎石 9:18:73,已知道路长 800m,基层宽 26m,该段道路范围内各类井的面积为 100m<sup>2</sup>。试计算石灰、粉煤灰、碎石基层的工程量、并确定该基层套用的定额子目及 基价。
- 3. 某道路工程采用 35cm 厚粉煤灰三渣基层,采用厂拌三渣,确定套用的定额子目及 基价。
- 4. 某道路工程采用 40cm 厚塘渣底层,采用人机配合铺筑、确定套用的定额子目及 性於
- 基价。 5. 某道路工程水泥混凝土路面采用抗析 4.5MPa 混凝土、设计为企口、确定奎用的定
- 6. 某道路水泥混凝土路面工程中,胀缝传力杆钢筋(圆钢)总质量为 100kg,纵缝拉杆钢筋(螺纹钢)总质量为 870kg,确定路面钢筋套用的定额子目及基价。
- 7. 某道路路面工程,在中粒式沥青混凝土施工后,在其上喷洒乳化沥青,喷油量为 0.55kg/m²,再施工细粒式沥青混凝土,确定喷洒乳化沥青套用的定额子目及基价。
- 8. 某道路工程人字纹安砌人行道板,采用 250mm×250mm×50mm 人行道板,下设 3cm 厚 M10 水泥砂浆垫层,确定人行道板安砌套用的定额子目与基价。



# 第6章《排水工程》预算定额 应用


#### 本章学习要点

- 1. 管道铺设工程量计算规则、计算方法、定额的套用和换算。
- 2. 管道基础、垫层工程量计算规则、计算方法、定额的套用和换算。
- 3,检查井垫层、基础、砌筑、抹灰、井室盖板、井圈、井盖等工程量计算规则、计算 方法、定额的套用利速算。
  - 4. 排水工程模板、钢筋工程量计算规则、计算方法、定额的套用和换算。





某工程雨水管道平面图、管道基础图如下、管道采用钢筋混凝土管,基础采用钢筋混凝土条形基础,检查并采用砖砌、检查井利面示意图如下,现要计算这投管道垫层、基础相关的工程量,并计算该投管道检查井相关工程量,有哪些项目需要计算?如何进行计算?

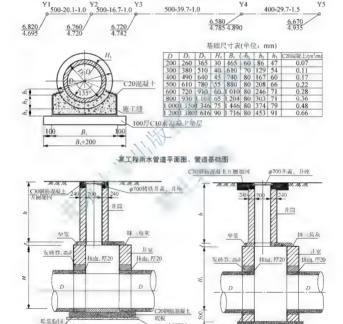

某工程雨水检查井剖面图

C10素混凝土

200

原浆稳固

200

C20钢的 是最主席板 C10 东混版十些层

200

200



《排水 [程》册包括管道铺设,井、渠(管)道基础及砌筑,不开槽施 [管道 [程,给排水构筑物,给排水机械设备安装,模板、钢筋及井字架 [程,共6章。

#### 1. 《排水工程》册适用范围

本册定额适用于城镇范围内新建、改建和扩建的市政排水管渠 L程, 净水/ 、污水/ 、 排水泵站的给排水构筑物和专用给排水机械设备。

本册定向钻进适用于污水及雨水管道穿越,不适用于给水及燃气管道施工;不适用于排水工程的日常修理及维护工程。

#### 2. 《排水工程》册定额与建筑工程定额、安装工程定额的关系

- (1) 管道接口、井、给排水构筑物需要做防腐处理的、执行《浙江省建筑工程预算定额》(2010 版)或《浙江省安装工程预算定额》(2010 版)的相关子目。
- (2) 给排水构筑物 E程中的杂站上部建筑工程以及本册定额中未包括的建筑工程执行 《浙江省建筑工程预管定额》(2010 版)。
  - (3) 给排水机械设备安装中的通用机械设备应执行《浙江省安装工程预算定额》(2010版)。
  - 3. 《排水工程》册其他说明
- (1) 本定额中所称管径:混凝土管、钢筋混凝土管均指内径,钢管、塑料管指公称直径。如实际管径、长度与定额取定不同时,可进行调整换算。
- (2) 本定额各项目涉及的混凝上强度等级和砂浆标号与设计要求不同时, 可进行换算, 但数量不变。
  - (3) 本册定额各章所需的模板、钢筋(铁件)加工、井字架执行本册定额第6章的相应子目。
- (4)本册定额所涉及的土石方开挖、运输、脚手架、支撑、围堰、打拔桩、降排水、拆除等工程、除各亳节另有说明外,可套用第一册《通用项目》的相应定额执行。
- (5) 本定额是按无地下水考虑的,如有地下水,需降(排)水、湿上排水时执行第一册《通 用项目》的相应定额,需设排水自沟时执行第二册《道路工程》的相应定额。



管道铺设包括混凝上管道铺设、塑料排水管铺设、排水管道接口、管道闭水试验等相 应子目。



#### 6.2.1 工程量计算规则

- (1) 管道铺设,按井中至井中的中心扣除检查井长度,以"延长米"为单位计算工程量。
  - ① 每座矩形检查井扣除长度按管线方向井室内径计算。
  - ② 每座圆形检查井扣除长度按接管线方向井室内径每侧减 15cm 计算。
  - ③ 雨水口井所占长度不予扣除。



排水管道接入检查井时,管口通常与井内壁齐平

# 特别提示

矩形检查井井室内尺寸有管线方向,垂直于管线方向两个尺寸, 扣除检查井长 度时取管线方向的内尺寸计算。

【例 6-1】某段管线工程,J1 为矩形检查井 1 750mm×1 000mm,主管为 DN1 200, 支管为 DN500, 单侧布置, 具体如图 6.1 所示, 计算该检查井处应扣除的长度。




图 6.1 某段管线工程图 1

【解】DN1 200 管在 J1 处应扣除长度=Im

DN500 管在 J1 处应扣除长度=1.75/2=0.875(m)

【例 6-2】 某段管线工程, J2 为圆形检查井ø1 800, 主管为 DN1 200, 支管为 DN500, 单侧布设, 具体如图 6.2 所示, 计算该检查井处应扣除的长度。




图 6.2 某段管线工程图 2

- 【解】DN1 200 管在 J2 检查井处应扣除长度=1.8-0.15×2=1.5(m) DN500 管在 J2 外应扣除长度=1.8/2-0.15=0.75(m)
- 【例 6-3】 某管道平面图如下,已知 Y1~Y4 均为圆形检查井,Y1、Y2 井内径为 1.1m, Y3、Y4 井内径为 1.3m, 试计算各管段管道铺设的工程量。

# 知识链接

管节数量-管道铺设长度/每节管道长度(根据计算结果进 1,取整數) (6-2) 每节管道长度按实计算,通常 UPVC、HDPE 等塑料管道每节管长为 6m; 铜筋混凝土管管径 < 600mm,每节管道长度通常为 3m; 铜筋混凝土管管径 > 800mm,每节管道长度通常为 2m.

(3) 管道闭水试验, 以实际闭水长度计算, 不扣除各种井所占长度。

#### 6.2.2 定额套用及换算说明

- (1) 如在无基础的槽内铺设混凝上管道,其人工、机械乘以系数 1.18。
  - (2) 如遇有特殊情况必须在支撑下串管铺设,其人工、机械乘以系数 1.33。



# 知识链接

串管铺设: 指在沟槽两侧有挡土板且有钢(木)支撑下的管道铺设。

- (3) 管道铺设定额, 若管材单价已包括接口费用, 则不得重复套用管道接口相关子目。
- (4) 排水管道接口定额中,企口管膨胀水泥砂浆接口和石棉水泥接口适于 360°, 其他接口均是按管座 120°和 180°列项的。如管座角度不同,根据相应材质的接口做法按表 6-1 进行调整。

序号	项目名称	实做角度	调整基数或材料	调整系数
1	水泥砂浆接口	90°	120° 定额基价	1 33
2	水泥砂浆接口	135°	120° 定额基价	0.89
3	钢丝网水泥砂浆接口	90°	120° 定额基价	1.33
4	钢丝网水泥砂浆接口	135°	120° 定额基价	0.89
5	企口管膨胀水泥砂浆接口	90° . Y	定额中1:2水泥砂浆	0.75
6	企口管膨胀水泥砂浆接口	120°1	定额中1:2 水泥砂浆	0.67
7	企口管膨胀水泥砂浆接口	135°	定额中1:2水泥砂浆	0.625
8	企口管膨胀水泥砂浆接口	180°	定额中1:2 水泥砂浆	0.50
9	企口管石棉水泥接口。	90°	定额中1:2水泥砂浆	0.75
01	企口管石棉水泥接口 🖔	120°	定额中1:2 水泥砂浆	0.67
11	企口管石棉水泥接口	135°	定额中1:2 水泥砂浆	0.625
12	企11管石棉水泥接口	180	定额中1:2水泥砂浆	0.50

表 6-1 管道接口调整系数表

【例 6-4】 排水管道管径 500mm, 采用 135° 水泥砂浆接口, 确定套用定额的定额子目及基价。

#### 【解】套用定额子目: [6-53]H

基价= 72×0.89 ≈ 64(元/10 个口)

- 【例 6-5】 DN600 钢筋混凝土平口管道(135°管基),接口采用 1:2.5 水泥砂浆抹带接口(内外抹口),已知 10 个接口的内抹口周长为 18.84m,确定套用的定额子目及基价。

#### 【解】套用定额子目: [6-54]H

基价 81×0.89+(0.042×210.26+9.22×43.00)× $\frac{18.84}{100}$  ≈ 148(元/10 个口)

(6) 本章各项所需模板、钢筋加工,执行本册定额第6章的相应项目。

注: 现浇混凝土处套环、变形缝接口, 通用于平口、企口管。

# 6.3 井、渠(管)道基础及砌筑

井、渠(管)道基础及砌筑定额包括井垫层、井砌筑及抹灰、井盖(箅)制作安装, 渠(管)道垫层及基础、渠道砌筑、渠道抹灰及勾缝、渠道沉降缝,钢筋混凝土盖板、 过蒙的预制安装,排水管道出水口,方沟闭水试验等相应于目。

#### 6.3.1 工程量计算规则

#### 1. 渠(管)道垫层及基础

(1) 渠(管)道垫层、基础按设计图示尺寸按实体积以 m3 为单位计算。

## 知识链接

常用的钢筋混凝土管道通常采用钢筋混凝土条形基础,如图 6.3 所示,基础分为 两个部位; 施工缝(图中虚线)以下为"平基",施工缝以上为"管座"。在管道基础工 程量计算时,需分别计算平基、管座的工程量,分别套用相应的定额子目。



【参考图文




图 6.3 钢筋混凝土条形基础剖面图



# 特别提示

排水管道接入检查井时、管口通常与井内壁齐平、所以在计算管道垫层、基础的实际 体积时、垫层、基础的长度应扣除检查井的长度。

【例 6-6】 某工程雨水管道平面图、管道基础图如图 6.4 所示、管道采用钢筋混凝土 管,基础采用钢筋混凝土条形基础。已知 Y1~Y5 均为 1 100mm 的 6 砌检查井、 管道垫层、基础均采用现浇现拌泥凝土。 计算 Y2~Y3 段管道垫层、管道基础的 L程量、 并确定套用的定额子目及其基价。

【解】V2~V3 段管道管径为 D500, 井中到井中长度为 16.7m

(1) 管道垫层。

工程量=(0.88+0.2)×0.1×(16.7-1.1)=1.68(m3)

套用定额子目: [6-268]

基价=2 410 元/10m3



图 6.4 某工程雨水管道平面图、管道基础图

工程量=0.88×0.08×(16.7-1.1)=1.10(m3)

套用定额子目: [6-276]H

C15(40)现浇现拌混凝土单价为 183.25 元/m3

C20(40)现浇现拌混凝土单价为 192.94 元/m3

基价=2 843+(192.94-183.25)×10.150 ≈ 2 941(元/10m3)

② 管座。

工程量 (0.22 0.88×0.08×1)×(16.7-1.1)=2.33(m3)

季用定额子目: [6-282]H

C25(40)现浇现拌混凝土单价为 207.37 元/m3

C20(40)现浇现拌混凝土单价为 192.94 元/m3

基价=3 265+(192.94 207.37)×10.150 ≈ 3 119(元/10m3)

- (2)沟槽回填塘渣或砂等按沟槽挖方工程量扣除各种管道、基础、垫层及沿线井室等构筑物所占的体积计算。
  - 2. 井垫层

井垫层按设计图示尺寸按实体积以m³为单位计算。

- 3. (井、渠道)砌筑及抹灰、勾缝
- (1) 各类井的井深按井底基础以上至井盖计算。

# 知识链接

井深=井盖顶标高-井基础顶标高 (6-3)

井基础顶标高也就是井底板顶标高。

(a)

检查井位于路面范围内时、井盖顶与路面齐平、故井盖顶标高等于设计路面标高;检查井位于绿化带等非路面范围时、井盖顶通常高出地面 2-3cm。

在排水管道施工图纸中,通常不标示井底板顶标高。而标示检查井处管内底标高,需 根据管内底标高计算井底板顶标高。

流槽井剖面如图 6.5(a)所示, 落底井剖面如图 6.5(b)所示, 井深计算公式如下:

检查井为落底井时: 井底板顶标高 检查井处管内底标高-落底高度 (6-4)

检查井为流槽井(不落底井)时:井底板顶标高-检查井处管内底标高-管壁厚-

0.02( 坐菜厚度) (6-5)C30钢筋混凝土川圈加固 φ700 并益、 非座 Ø700特供月新 开简 抹 角灰 抹上角灰 开室 发砖券,高 抹面, 厚20 发砖券, 同岛 抹血,厚20 抹血,厚20 T 230網筋混凝土 暗卷编团 C10太混凝土 原浆稳固 20部9前,混起土地 200 200 C10系混起土垫 200 200

图 6.5 矩形检查井剖面示意图

(b)





(2) 砌筑按体积(不扣除管径 500mm 以内管道所占体积)以 m3 为单位计算。

(3) 并砌筑流槽工程量并入井室砌体工程量内计算。

### 特别提示

石砌流槽、混凝土流槽工程量另行单独计算,

- (4) 抹灰、勾缝按面积以 m2 为单位计算。
- (5) 井壁(墙) 凿洞工程量按凿除面积以 m<sup>2</sup> 为单位计算。



并砌筑体积计算时, 应扣除管径 500mm 以上管道所占体积,

如图 6.5 所示的矩形检查井、下部井室部位为矩形、上部井筒部位为圆形、在计 算井砌筑工程量时, 应分别计算井室砌筑(矩形)工程量、井筒砌筑(圆形)工程量、并 分别套用相应的定额不目。



## 知识链接

在计算并砌筑体积、井抹灰面积时、需先确定井深、进而确定井室高度、井筒 高度、从而计算井室砌筑体积、井筒砌筑体积及井抹灰面积。

在计算确定井深后、通常按设计要求最小高度确定井室高度, 再按下式计算井 简高度。

流槽井井筒总高度=井深-井室盖板厚度-井室高度-管壁厚-

0.02 沿桨厚度)

(6-6)

落底井井简总高度=井深-井室盖板厚度-井室高度(会落底高度) (6-7)

> 井筒砌筑高度=井筒总高度-井園及井盖高度 (6-8)

#### 4. 井盖(算)制作、安装

- (1) 井盖(算)、井圏制作按实体积以 m3 为单位计算。
- (2) 井盖(箅)安装按安装的套数计算。

#### 5. 渠道沉降缝

渠道沉降缝工程量应区分材质按沉降缝铺设长度或嵌缝的断面面积计算。



- (1) 钢筋混凝土盖板、过梁的制作按实体积以 m3 为单位计算。
- (2) 钢筋混凝土盖板、过梁的安装按实体积以 m3 为单位计算。
- 7. 排水管道出水口

出水口工程量按其数量以"处"为单位计算。

#### 8. 方沟闭水试验

方沟(包括存水井)闭水试验的工程量,按实际闭水长度的用水量以 m3 为单位 计算。



#### 6.3.2 定额套用及换算说明

- (1) 井、集(管)道基础及砌筑各项目均不包括脚手架,当井深超过 1.5m 时,执行本册第 6 章井字脚手架项目;砌墙高度超过 1.2m,抹灰高度超过 1.5m 时所需脚手架执行《通用项目》的相应定额。
- (2) 各项目所需模板的制作、安装、拆除,钢筋(铁件)的加工均执行本册第 6 章的相应 项目。
- (3) 小型构件是指单件体积在 0.04m³ 以内的构件。凡大于 0.04m³ 的检查井过梁,执行 混器十过梁制作、安装项目。
  - (4) 混凝土枕基和管座不分角度均按相应定额执行。
  - (5) 管道基础伸缩缝套用《通用项目》相关定额。
  - (6) 嵌石混凝土定额中的块石含量按 25%计算, 如与实际不符, 应进行调整。
- (7) 石砌体均按块石考虑,如果用片石时,石料与砂浆用量分别乘以系数 1.09 和 1.19, 其他不变。
  - (8) 砖砌检查井降低执行《通用项目》拆除构筑物相应定额。
  - (9) 井砌筑中的爬梯可按实际用量, 套用本册第6章中钢筋、铁件相应于目。
  - (10) 井室不分内、外抹灰,均套用井抹灰子目。
  - (11) 拱(弧)形混凝土盖板的安装,按相应体积的矩形板定额人工、机械乘以系数 1.15 执行。
    - (12) 干砌、浆砌出水口的平坡、锥坡、翼墙等接《通用项目》的相应项目执行。
  - (13) 定额中砖砌、石砌一字式、门字式、八字式适用于 DN300~DN2 400 不同覆土厚度的出水口,按《给排水标准图集》(2002)合订本 S2 编制。如设计不同,可做换算。

【例 6-7】 根据图 6.6、图 6.7、图 6.11~图 6.15、计算 Y2、Y3 检查并砌筑的工程量并确定套用的定额子目。

【解】先确定井的平面尺寸及类型,并计算井深,然后确定井室、井筒高度,最后计算 砌筑工程量。

(1) 根据图 6.6、图 6.7、图 6.14、图 6.15 可知: Y2 为 1 100×1 100 流槽井

Y2 井深=5.715-3.269+ $\frac{0.61-0.5}{2}$ +0.02=2.521(m)

根据图 6.15 各部尺寸表, 取定 Hi=1.8m

则井室砌筑高度=1.8+ $\frac{0.61-0.5}{2}$ +0.02=1.875(m)

则井室砌筑工程量=2.18×1.875+0.35=4.44(m3)

(注:流槽井流槽砌筑的工程量并入井室砌筑工程量中)





图 6.6 某市中华路排水管道平面图

图 6.7 雨水管道纵断面图



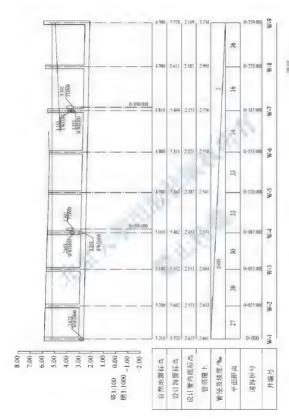

说明, 管径单位为mm, 其余以mir, 国家 85高程。



									ľ				
	D'		B	び	Ü	Ü	(	(	(	t.	布米管道書	基础工程量	obeř
	mm	mm	mm	шш	шш	mm	Э	9	9	(70混器	①第Cm	2) (ii) (5) m	30部以m
019	780	55	880	()8	208	99	5Ф10	Φ8@200	4@10	0.224	5.00	8.005	4.00
720	016	09	1 010	98	246	71	9Ф10	Φ8@200	4Ф10	0.282	00.9	9.165	4.00
930	1 104	9	1 204	80	303	71	7Ф10	$\Phi 8 = 200$	4 <b>Φ</b> 10	0.356	7.00	10.71	4.00
150	1 346	75	1 446	80	374	79	8Ф10	Φ8@200	4Φ10	0.483	8.00	12.84	4.00
380	1616	06	1716	80	453	91	9Ф10	Φ8@200	4 <b>Φ</b> 10	0.658	9.00	15 29	4.00
1 730	2 008	115	2 200	001	548	124	10Ф10	Φ8@200	4Ф10	1.045	10.00	19.05	8.00

基础尺寸

图 6.9 钢筋混凝土管道条形基础结构图



/mm
我
歌
必形
· K
FL
一種
道草
ám

管道规格	粉	DN200	DN200 DN300	DN400	DN500	DN600
Din		250	335	450	530	630
H,<3000		1 000	0011	1 200	1 300	1 400
3000 ≤ H,<4000	養塚	1 200	1 300	1 400	1 500	1 600
4000≤H,<4500	NEW B	1 300	1 400	1 500	1 600	1 700
4500 \$H;<6000				1		
导向管道自径初始变形布	沙形带	9	10	13	91	20
辱向管道自径允许变形量	会形革	10	15	20	25	30

注: 尤支撑时沟槽宽度8可减小300mm。




,H東溪酔肉

# 1、 检查并图尺寸酸说明外均为毫未

- 2. 誊水检查并构宽
- (1)報查并分为時轉施另檢查并和方影检查并。
  - 2)整查并分集底并和不募属并再制。
- (3) 同污交汇并采用高底开,并内商水管断开,污水管变过
- 5. 美用条件.
- (1) 淡時報 萬 B
- (2) 土容重 千容重 18kh / m³, 物容重 20kN /m³.
- (5) 鬼下水性 島面下 1.0m.
- (4) 整合并兼任是北岸底,并有场场设计等行2. Om的产额储存基件的 及序数大12. Om的一些中指的整定模型等的 O. 6 ~ 2. Om, 4. f. O. 6m 或大三3.5m 的现在还有特别
- (5) 地基承載加> 80kPa.
  - (つ) &serving OUNI 4. A新
- (1) 好傷检查并明 M1○ 水泥砂瓷砌筑 MC、○ 机硫, 整倍并则粉液面及株二焦系用 1 2 水泥砂浆材宽, 屏 2○ mm.

- (2) 製脂液液土物件 取制与激激均系用C20返後上,解像 Φ HPB300衰敏像 中HPB3309衰級 Φ HRB3358後艦
- (3) 認義主義於 C10.
- 5.检查才配用Φ7○○的双关节酶基式铸铁方差及并盖板。
- 6. 權查产品解釋表用解數是接工區或, 非与主一整的第一节哲子廣半节長 曾子表現於正成業株
- 為工法素事項
- (1) 類制或預益蓋極必發保证底面平差式流,不得有毒或無面 (2) 安装持每與主款,并盖顶極要引与器面平。
- 學图中已控明於,其金藝展而法与強人主營基础發展相同。
- 异吸及接受效整品表验证者或后的至该数x寸20mm 且4寸60mm;直更 C30型及是证,按子指数置而每件每点支配器的基本。
- "一",四子检查并基础大等分位于家壳是上,惟全并基础地盖案处理、处理方法同营基下的系统。

图 6.11 检查井结构设计说明

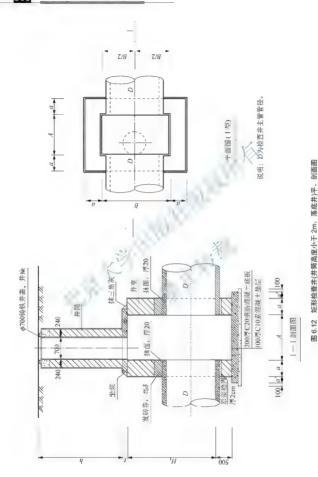

154

各部尺寸

							1
井筒高度	h/mm	600-2 000	600-2 000	600-2 000	009-1-009	1 600-2 000	
井室高度	H <sub>1</sub> /mm	1 800~1 900	1 800-1 900	1 800~2 100		1 800~2 300	
井松厚度	а/шш	370	370	370	370	86	1 1.
井室半面尺寸	A×B//mm×mm)	1 100×1 100	1100-7250	1 100×1 500		100×1 /20	
普 径	D/mm	009≫	800	1 000	000	1 200	

1	12%
1	7
\	搬
	壁
	1_

井室平面尺寸	井室砂浆抹面 井筒砖砌体 井筒砂浆抹面	本面 项板数量	井盖井座数量
a/mm /(m <sup>1</sup> /m)	(m²/m) (m²/m)	/块	/接
370 2.18	K		-
370 2.29	ý	-	_
370 2.47	12.0	-	-
370 2.66	3	-	-
490 3.75		-	-

图 6.13 矩形检查井(井简高度小于 2m, 落底井)各部尺寸及工程数量表

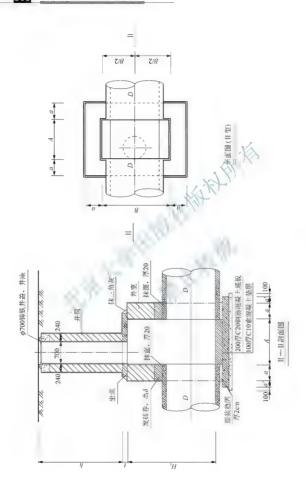


图 6.14 矩形检查井(井筒高度小于 2m, 流槽井)平、剖面图

井盖井座数量 /套 \_ 流槽砂浆抹面 井筒砖砌体 井筒砂浆抹面 顶板数量 /注 /(m2m) 16.5 0.77 (m/m) 2.14 2.76 3.38 4.00 ~E 流槽砖砌体 0.35 0.58 1.13 0.83 "H

图 6.15 矩形检查井(井简高度小于 2m, 流槽井)各部尺寸及工程数量表

2.66 2.47

1 200 1 000 800

#室半面尺寸	1100~1500 370 1800~2400 600~2	1100×1250 370 1800-2400 600-2	1100×1500 ( < 1,370 1800-2600 600-2	1 100~1 750 370 1 800~2 800 600~2	
井室平面尺寸 A~B/(mm/mm)	1 100 1 100	1 100×1 250	1 100×1 500 (	1 100 × 1 750	
管 径 D/mm	009≶	800	1000	1200	

T程数量表

井室砖砌体 井室砂浆抹面 (m,m)/ 11.76 12.36 13.36 14.36

井壁厚度 a mm 370 370 370 370

并室平面尺寸  $A \times B/(mm \times mm)$ 1 100×1 100 1 100/1 250 1 100×1 500 1 100×1 750

> D/mm 009≶

(m/m)/ 2.18 2.29

000 000 000 0000

西康 ulu 井筒高度 h=2.521 1.875 0.12=0.646(m)

井筒砌筑高度=0.646 0.25-0.04=0.356(m)

则井简砌筑工程量=0.71×0.356=0.25(m3)

(2) 根据图 6.6、图 6.7、图 6.12、图 6.13 可知: Y3 为 1 100×1 250 落底井

Y3 井深=5.580-2.879+0.5=3.201(m)

根据图 6.13 各部尺寸表, 取定 Hi=1.8m

则井室砌筑高度=1.8+0.5=2.3(m)

则井室砌筑工程量=2.29×2.3- $\frac{\pi}{2}$ ×0.93<sup>2</sup>×0.37=5.02(m<sup>3</sup>)

(注:需可扣除 D>500 的管道所占的体积)

井筒高度 h=3.201-2.3-0.12=0.781(m)

井简砌筑高度=0.781-0.25-0.04=0.491(m)

则井筒砌筑工程量-0.71×0.491-0.35(m³)

合计: 井室砌筑工程量=4.44+5.02=9.46(m³)

套用定额子目: [6-231]

井筒砌筑工程量=0.25+0.35=0.60(m

套用定额子目: [6-230]

【例 6-8】 M10 水泥砂浆砌筑片石渠道墙身、片石单价 26.16 元/t、确定套用的定额子目及基价。

【解】套用定额子目: [6-293]H

砌筑水泥砂浆 M7.5 的单价: 168.17 元/m

砌筑水泥砂浆 M10 的单价: 174.77 元/m3

采用用片石砌筑,石料与砂浆用量分别乘以系数 1.09 和 1.19,其他不变。

基价=2 295+(174.77×3.670×1.19=168.17×3.670)+(26.16×18.442×1.09=40.50×

/ 18.442)≈2 220(元/10m³)

【例 6-9】 矩形雨水井为砖砌井,采用 M10 砂浆砌筑、确定雨水井井室套用的定额子目及基价。

【解】套用定额子目: [6-231]H

基价=2 651+(174.77-168.17)×2.286≈2 666(元/10m³)

## 6.4 不开槽施工管道工程

不开槽施工管道工程定额包括人工挖工件坑、交汇坑土方,安拆顶进后座及坑内平台,安拆敞开式顶管设备及附属设施,安拆封闭式顶管设备及附属设施,敞开式管道顶进,封 闭式管道顶进,安拆中继间,顶进触变泥浆减阻,压浆孔封拆,钢筋混凝上沉井洞口处理, 钢管顶进,铸铁管顶进,方(拱)涵顶进,水平定向钻牵引管道等相应子目,适用于雨、 污水管(涵)以及外套管的不开槽理管工程。

#### 6.4.1 工程量计算规则

- (1) 工作坑上方区分挖上深度,以挖方体积计算。
- (2) 各种材质管道的顶管工程量, 按实际顶进长度以"延长米"计算。
- (3) 触变泥浆减阻每两井间的工程量,按两井之间的净距离以"延长米"计算。
- (4) 安拆中继间 [程量按不同顶管管径以"套"计算。
- (5) 水平定向钻牵引工程量按井中到井中的中心距离以"延长米"计算,不扣除 井所占长度。





- (8) 安拆敞开式/封闭式顶管设备及附属设施工程量, 按设备套数以"套"计算。
- (9) 压浆孔封拆工程量按压浆孔数量以"孔"计算。
- (10) 钢筋混凝土沉井洞口处理工程量、按洞口数量以"个"计算。

#### 6.4.2 定额套用及换算说明

- (1) 工作坑垫层、基础执行本册第 2 章的相应项目,人工乘以系数 1.10, 其他不变。
- (2) 如果钢管、铸铁管需设置导向装置,方(拱)涵管需设滑板和导向装置时,另行计算。
- (3) 工作坑人工挖土方按上壤类别综合考虑。工作坑回填土, 视其回填的实际做法, 执行《通用项目》的相应定额子目。
- (4) 工作坑内管(涵)明敷,应根据管径、接口的做法执行本册第 1 章的相应项目, 人工、机械乘以系数 1.10, 其他不变。对于管道下的基础,应根据本册第 2 章套用 相关子目。
- (5) 本章定额是按无地下水考虑的,如遇地下水时,排(降)水费用根据实际情况按相应定额另行计算。
- (6) 顶进施工的方(拱)涵断面大于 4m<sup>2</sup>时,按第三册《桥涵工程》箱涵顶进部分 有关定额或规定执行。
  - (7) 工作井如设沉井, 其制作、下沉等套用本册第4章的相应项目。
- (8) 本章定额未包括上方、泥浆场外运输处理费用,发生时可执行第一册《通用项目》的相应定额或其他有关规定。
- (9) 单位 工程中, 管径 ≠1 650 以内敞开式顶进在 100m 以内、封闭式顶进(不分管径)在 50m 以内时, 顶进定额中的人工费与机械费乘以系数 1.30。
- 【例 6-10】 某敞开式顶管施工,管径 ø 1 200,管道顶进长度 90m, 挤压式顶进, 试确定套用定额子目及基价。



【参考图立】



#### 【解】 套用定额子目: [6 504]H

基价=155 144+(11 434.78+13 385.97)×(1.30-1)≈162 590(元/100m)

(10) 顶管采用中继间顶进时,各级中继间后面的顶管人工与机械数量乘以表 6-2 所列系数分级计算。

表 6-2 中继间顶讲人工费、机械费调整系数表

中继间顶进分级	一级顶进	二级顶进	三级顶进	四级顶进	超过四级
人工费、机械费调整系数	1.20	1.45	1.75	2.1	另计

【例 6-11】 某 ø 1 500 封闭式顶管工程,总长度为 200m,采用泥水平衡式顶进,设置 4 级中继间顶进,如图 6 16 所示,求某人工用量和顶管设备合排用量.

【解】1号中继间前面的顶管套用定额子目: [6-517]

1号中继间后面的顶管套用定额子目: [6-517]H

頂进总人工用量=
$$\left(\frac{45}{100} + \frac{34}{100} \times 1.2 + \frac{30}{100} \times 1.45 + \frac{56}{100} \times 1.75 + \frac{35}{100} \times 2.1\right) \times 258.126$$
  
 $\approx 776.443(工日)$   
項管设备用量= $\left(\frac{45}{100} + \frac{34}{100} \times 1.2 + \frac{30}{100} \times 1.45 + \frac{56}{100} \times 1.75 + \frac{35}{100} \times 2.1\right) \times 15.940$ 

≈ 47.948(



图 6.16 某顶管工程图

- (11) 安、拆顶管设备定额中,已包括双向顶进时设备调向的拆除、安装以及拆除后设备转移至另一顶进坑所需的人工和机械台班。
- (12) 安、拆顶管后座及坑内平台定额已综合取定,适用于敞开式和封闭式施工方法, 其中钢筋混凝土后座模板制作、安装、拆除执行本册第6章的相应定额。
- (13) 顶管工程中的材料是按50m水平运距、坑边取料考虑的,如因场地等情况取用料水平运距超过50m时,根据超过距离和相应定额另行计算。
  - (14) 全挤压不出土顶管定额适用于软土地区全封闭顶进施工项目。

- (15) 水平定向钻牵引管道定额适用于排水工程塑料管(HDPE)牵引项目,如采用 其他管材、需另行补充。
  - (16) 水平定向钻牵引如使用钢筋辅助管道拖位、钢筋制安套用本册相应定额。
- (17) 水平定向钻牵引定额未包括管材接口材料及连接费用,发生时按本册第 2章相应定额执行。

# 6.5 给排水构筑物

给排水构筑物定额包括沉井、现浇钢筋混凝土池、预制混凝土构件、折(壁)板制作安装、滤料铺设、防水工程、施工缝、井池渗漏试验管相应 戶目。

#### 6.5.1 工程量计算规则

#### 1. 沉井

- (1) 沉井垫木按刃脚底中心线以"延长米"为单位计算。灌砂、垫层按体积以m<sup>3</sup>为单位计算。

- (2) 沉井制作工程量按混凝土体积以 m³ 计算。
- ① 刃脚的计算高度,从刃脚踏面至井壁外凸(内凹)口计算,如沉井井壁没有外凸(内凹)口,则从刃脚踏面至底板顶面为准。
  - ② 底板下的地梁并入底板计算。
  - ③ 框架梁的工程量包括切入井壁部分的体积。
  - ④ 井壁、隐墙或底板湿凝土中, 不扣除单孔面积 0.3m2以内的孔洞所占体积。
- (3) 沉井制作的脚手架安、拆,不论分几次下沉,其工程量均按井壁中心线周长 与隔墙长度之和乘以井高计算。井高按刀脚顶面至井壁顶的高度计算。
- (4) 沉井下沉的上方工程量,按沉井外壁所围的平面投影面积乘以下沉深度(预制时刃脚底面至下沉后设计刃脚底面的高度),并乘以上方回淤系数1.03 计算。

#### 2. 钢筋混凝土池

- (1) 钢筋混凝上各类构件均按图示尺寸,以混凝上实体积计算,不扣除单孔面积 0.3m<sup>2</sup>以内的孔洞体积。
- (2) 各类池盖中的进入孔、透气孔盖以及与盖相连接的结构,工程量合并在池盖 中计算。
- (3) 平底池的池底体积,应包括池壁下的扩大部分;池底带有斜坡时,斜坡部分 应按坡底计算,锥形底应算至壁基梁底面,无壁基梁者算至锥底坡的上口。
- (4) 池壁计算体积时应区分不同厚度,如上薄下厚的壁,以平均厚度计算。池壁高度应自池底板面算至池盖下面。

# 市政工程计量与计价(第三版)

- (5) 无梁盖柱的柱高, 应自池底上表面算至池盖的下表面, 并包括柱座、柱帽的体积。
- (6) 无梁盖应包括与池壁相连的扩大部分的体积; 肋形盖应包括主、次梁及盖部分的体积; 球形盖应自油壁顶面以上,包括边侧梁的体积在内。
- (7) 沉淀池水槽,指池壁上的环形溢水槽及纵横 U 形水槽,但不包括与水槽相连接的矩形梁,矩形梁可执行梁的相应项目。

#### 3. 预制混凝土构件

- 1) 预制
- (1) 预制钢筋混凝上滤板按图示尺寸区分厚度以  ${\bf m}^3$  为单位计算,不扣除滤头套管所占体积。
- (2) 除钢筋混凝上滤板外,其他预制混凝上构件均按图示尺寸以 $m^3$ 为单位计算,不扣除单孔面积 $0.3m^2$ 以内孔洞所占体积。
  - 2) 安装
  - (1) 钢筋混凝土滤板、铸铁滤板安装工程量按面积以 m<sup>2</sup> 为单位计算。
  - (2) 其他预制混凝土构件按体积以 m3 为单位计算。

#### 4. 折板、壁板制作安装

- (1) 折板安装区分材质均按图示尺寸以m<sup>2</sup>为单位计算。
- (2) 稳流板安装区分材质不分断而均按图示长度以"延长米"为单位计算。
- (3) 壁板制作安装按图示尺寸以 m² 为单位计算。

#### 5. 滤料铺设

各种滤料铺设均按设计要求的铺设平面乘以铺设厚度以 m³ 为单位计算, 锰砂、铁矿石 滤料以 t 为单位计算。

#### 6. 防水工程

- (1) 各种防水层按实铺面积,以 m<sup>2</sup> 计算,不扣除单孔面积 0.3m<sup>2</sup> 以内孔洞所占体积。
- (2) 平面与立面交接处的防水层,其上卷高度超过 500mm 时,按立面防水层计算。

#### 7. 施工缝

各种材质的施工缝填缝及盖缝均不分断面按设计缝长以"延长米"为单位计算。

#### 8. 井、池渗漏试验

井、池的渗漏试验区分井、池的容量范围,按水容量以 m3 为单位计算。

#### 6.5.2 定额套用及换算说明

#### 1. 沉井

- (1) 沉井 L 程系按深度 12m 以内,陆上排水沉井考虑的。水中沉井、陆上水冲法沉井 以及离河岸边近的沉井,需要采取地基加固等特殊措施者,可执行第一册《通用项目》相 应子目。
- (2) 沉井下沉项目中已考虑了沉井下沉的纠偏因素,但不包括压重助沉措施,若发生可另行计算。
  - (3) 沉井制作不包括外掺剂, 若使用外掺剂时可按当地有关规定执行。
  - (4) 沉井井壁及隔墙的厚度不同如上薄下厚时,可按平均厚度执行相应定额。

#### 2. 现浇钢筋混凝土池类

- (1) 池壁遇有附壁柱时,按相应柱定额项目执行,其中人工乘以系数 1.05,其他不变。
- (2) 池壁挑檐是指在池壁上向外出檐作走道板用;池壁牛腿是指池壁上向内出檐以承 抵池盖用。
  - (3) 无梁盖柱包括柱帽及柱座。
  - (4) 井字梁、框架梁均执行连续梁项目。
- (5) 混凝上池壁、柱(梁)、池盖是按在地面以上 3.6m 以内施工考虑的,如超过 3.6m 则按如下规则计算。
  - ① 采用卷扬机施工时,每10m3混凝上增加卷扬机(带塔)和人工工目见表 6-3。

表 6-3 采用卷扬机施工人工、机械调整系数表。

FJ.,	页目名称	増加 人工工日	· 增加卷扬和 (带格)自班	序号	जन्म	人工工日	増加巻扬机 (帯議)台班
-1	池壁、扁壩	8.7	0.59	3	(地產)	6.1	0.39
2	杜、梁	6.1	0.39				

- ② 采用塔式起電机施工时,每 10m³ 混凝土增加塔式起重机台班,按相应项目中搅拌机台班用量的 50%计算。
  - (6) 池盖定额项目中不包括进入孔盖板,发生时另行计算。
  - (7) 格型池池壁执行直型池壁相应项目(指厚度)人工乘以系数 1.15, 其他不变。
  - (8) 悬空落泥斗按落泥斗相应项目人工乘以系数 1.4, 其他不变。
  - 3. 预制混凝土构件
  - (1) 预制混凝土滤板中已包括了所设置预埋件 ABS 塑料滤头的套管用工,不得另计。
  - (2) 集水槽若需留孔时,按每10个孔增加0.5个工目让。
- (3)除混凝上滤板、铸铁滤板、支墩安装外,其他预制混凝上构件的安装均执行异型 构件安装项目。

#### 4. 施工缝

(1) 各种材质填缝的断面取定见表 6-4。

表 6-4 各种材质填缝断面尺寸表

序号	XOAU	新面尺寸/cm	學	项目名称	断面尽可/cm
1	建筑油膏、聚氯乙烯胶泥	3×2	4	氯丁橡胶止水带	展开宽 30
2	油浸木丝板	2 5×15	5	白铁盖缝	展开宽平面 590, 立面 250
3	紫铜板、钢板止水带	展开宽 45	6	其他	15×3

- (2) 如实际设计的施工缝断面与上表不同时,材料用量可以换算,其他不变。
- (3) 各项目的工作内容为:
- ① 油浸麻丝: 熬制沥青、调配沥青麻丝、填塞。

# 市政工程计量与计价(第三版)

- ② 油浸木丝板; 熬制沥青、浸木丝板、嵌缝。
- ③ 玛蹄脂: 熬制玛蹄脂、灌缝。
- ④ 建筑油膏、沥青砂浆; 熬制油膏沥青, 拌和沥青砂浆, 嵌缝。
- ⑤ 紫铜板、钢板止水带:铜板、钢板剪裁、焊接成型、铺设。
- ⑥ 橡胶止水带: 止水带的制作、接头及安装。
- (7) 铁皮盖板: 平面埋木砖、钉木条、木条上钉铁皮: 立面埋木砖、木砖上钉铁皮。
- 5. 井、池渗漏试验
- (1) 井池渗漏试验容量在 500m3 是指井或小型池槽。
- (2) 井、池渗漏试验注水采用电动单级离心清水泵,定额项目中已包括了泵的安装与拆除用工,不得再另计。
- (3) 如构筑物池容量较大,需从一个池子向另一个池子注水做渗漏试验,采用潜水泵时,其台班单价可以换算,其他均不变。
  - 6. 执行其他册或音节的项目
- (1) 构筑物的垫层执行本册本册第2章井、渠(管)道砌筑相应项目,其中人工乘以系数0.87。其他不变。如构筑物池底湿料土势层需要栽鸠时,其中人工不变。
  - (2) 构筑物混凝土项目中的钢筋、模板项目执行本册第6章的相应项目。
- (3) 需要搭拆脚手架时, 搭拆高度在 8m 以内时, 执行第一册《通用项目》相应项目。 搭拆高度 大于 8m 时, 执行第四册《隧道工程》相应项目。
  - (4) 泵站上部工程以及本意中未包括的建筑工程, 执行本省建筑工程预算定额。
  - (5) 构筑物中的金属构件支座安装,执行安装定额相应子目。
- (6)构筑物的防腐、內衬工程金属面,应执行安装工程预算定额相应项目,非金属面应执行建筑工程预算定额相应项目。
  - (7) 沉井预留孔洞砖砌封堵套用第四册《隧道工程》第4章相应子目。

# 6.6 模板、钢筋及井字架工程

模板、钢筋及井字架 L程定额包括现浇混凝土模板 L程、预制混凝土模板 L程、钢筋(铁件)、钢管井字架等相应 f 目。

#### 6.6.1 工程量计算规则

- (1) 现浇混凝上构件模板按构件与模板的接触面积以 m² 为单位计算。
- (2) 预制混凝 L构件模板, 按构件的实体积以 m3 为单位计算。
- (3) 砖、石拱圈的拱盔和支架均以拱盔与圈弧弧形接触面积计算,并执行《桥涵工程》的相应项目。

- (4)各种材质的地模、胎模、按施工组织设计的工程量,并应包括操作等必要的 宽度以m<sup>2</sup>计算,执行《桥涵工程》的相应项目。
  - (5) 钢管井字架区分搭设高度以"架"为单位计算,每座井计算一次。
  - (6) 井底流槽模板按浇筑的混凝土流槽与模板的接触面积计算。
- (7) 钢筋工程,应区别现浇、预制,分别按设计长度乘以单位质量,以t为单位 计算。
- (8) 先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度;后张法预应力钢筋,按设计 图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同锚具,分别按下列规定计算。
- ① 钢筋两端采用螺杆锚具时, 预应力的钢筋按预留孔道长度减 0.35m, 螺杆另计。
- ② 钢筋 ·端采用镦头插片,另 ·端采用螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔 谱长度计算。
- ③ 钢筋一端采用镦头插片,另一端采用帮条锚具时,增加 0.15m 长度;如两端均采用帮条锚具,预应力钢筋块增加 0.3m 长度。
  - ④ 采用后张混凝土自锚时, 预应力钢筋共增加 0.35m 长度。
  - (9) 钢筋混凝土构件预埋铁件,按设计图示尺寸,以t为单位计算工程量。

#### 6.6.2 定额套用及换算说明

- (1) 本章适用于本册及第五册《给水工程》中的第4章"管道附属构筑物"和第5章"取水工程"。
- (2) 定额中的现浇、预制项目均已包括了钢筋垫块或第一层底浆的工、料,以及 嵌模工日, 套用时不得重复计算。
- (3) 预制构件模板中不包括地模、胎模,需设置者,土地模可按《通用项目》平整场地的相应项目执行;水泥砂浆、混凝土砖地、胎模按《桥涵工程》的相应项目执行。
  - (4) 模板安拆以槽(坑)深 3m 为准, 超过 3m 时, 人 L增加 8%的系数, 其他不变。
- (5) 现浇混凝土梁、板、柱、墙的模板,支模高度是按 3.6m 考虑的,超过 3.6m 时,超过部分的工程量另按超高的项目执行。
- (6) 模板的倾留洞,按水平投影面积计算,小于 0.3m² 者,圆形洞每 10 个增加 0.72 工日, 方形洞每 10 个增加 0.62 工日。
- (7) 小型构件是指单件体积在 0.04m³以内的构件; 地沟盖板项目适用于单块体积在 0.3m³以内的矩形板; 井盖项目适用于井口盖板, 井室盖板按矩形板项目执行, 预留口按第 6 条"预留洞"的规定执行。
- (8) 钢筋加工定额是按现浇、预制混凝土构件、预应力钢筋分别列项的,工作内容包括加工制作、绑扎(焊接)成型、安放及浇捣混凝土时的维护用工等全部工作。





# 特别提示

现浇混凝土构件中、预制混凝土构件中的钢筋, 工程量应分开计算, 分别套用不同的 定额子目。

- (9) 各项目中的钢筋规格是综合计算的,子目中的××以内系主筋最大规格。凡小于 ø10 的构造筋,均执行 ø10 以内子目。
- (10) 定额中非预应力钢筋加工,现浇混凝土构件是按手工绑扎,预制混凝土构件是按 手工绑扎、点焊综合计算的。
- (II) 钢筋加 E中的钢筋施 E损耗, 绑扎铁线及成型点焊和接头用的焊条均已包括在定额内, 不得重复计算。
- (12) 预制构件钢筋,如用不同直径钢筋点焊在一起时,按直径最小的定额计算。如粗细筋直径比在两倍以上时,其人工增加25%的系数。
- (13) 后张法钢筋的锚固是按钢筋绑条焊,U形插垫编制的。如采用其他方法锚固,应 另行计算。
- (14) 定额中已综合考虑了先张法张拉台座及其相应的夹具、承力架等合理的周转摊销费用,不得重复计算。
  - (15) 非预应力钢筋不包括冷加工,如设计要求冷加工时,另行计算。
  - (16) 下列构件钢筋,人工和机械增加系数见表 6-5。

**麦 6-5** 构件钢筋人工、机械增加系数表

		现浇构	件姻筋X		构筑物	物钢筋	
58. NI.	- IT - T	小型构件人	<b>小型池槽</b>	炬		[2]	形
增加系数	<b>人人工厂</b> 机械	100%	152%	25	5%	50	)%

【例 6-12】 菜工程雨水管道平面图、管道基础图如图 6.4 所示、管道采用钢筋混凝土管、基础采用钢筋混凝土条形基础。已知 Y1~Y5 均为 1 100mm×1 100mm 的砖砌检查井、管道垫层、基础均采用现浇现拌混凝土、采用木模板、计算 Y2~Y3 段管道垫层、管道基础混凝土旅工时模板的工程量、并确定套用的定额子目及其基价。

#### 【解】(1) C10 素混凝土垫层

模板工程量=0.1×(16.7-1.1)×2=3.12(m2)

**奎用定额子目: [6-1044]** 

基价=2 419 元/10m2

(2) 管道基础

平基

模板工程量=0.08×(16.7-1.1)×2=2.50(m2)

套用定额子目: [6-1095]

基价=3 256 元/10m2

② 管座

模板工程量=0.208×(16.7 1.1)×2=6.49(m2)

套用定额子目: [6 1097]

基价=3 735 元/10m2

【例 6-13】 某排水管道工程,有 1 100mm×1 100mm 的砖砌检查井 10 座,采用 C20 预制混凝土井室盖板、C30 预制混凝土井圈,现场预制,采用木模板。井室盖板平面尺寸为 1 450mm×1 400mm、厚 120mm,每块井室盖板混凝土体积为 0.197m³;每块井圈混凝土体积为 0.182m³。计算该工程检查井施工时,井室盖板、井圈模板的工程量,并确定套用的定额子目及其基价。

#### 【解】(1) 井室盖板

模板工程量=0.197×10=1.97(m3)

套用定额子目: [6-1111]

基价=1 142 元/10m3

(2) 井圏

模板工程量=0.182×10=1.82(m3)

套用定额子目: [6-1121]

基价=3 139 元/10m3



# 6.7 排水工程定额计量与计价实例

【例 6-14】某市中华路排水管道工程、于 2016年3月1日—3月5日进行工程招投标活动。 雨水管道实施的起讫井号为 V1~Y3、污水管道实施的起讫井号为 W1—W4、均不包括沿线的支管及支管井、不包括雨水口及连接管、管径 D<400mm 采用承插式 UPVC 管、砂基础;管径 D>500mm 采用承插式钢筋混凝土管、钢筋混凝土条形基础,雨污水均采用砖砌矩形或方形检查井、详见下附管道平面图、纵断面图、结构图(图 6.17~图 6.24)。

已知本工程沿线土质为砂性土,地下水位于地表以下 1.3~1.5m。

试按定额计价模式采用工料单价法编制本工程的投标报价,本工程风险费用暂不考虑, 危险作业意外伤害保险费、农民工工伤保险费暂不考虑,本工程无创标化工程要求,本工程不得分包,本工程无暂列金额、计日工。

#### 【解】(1) 确定本排水管道工程的施工方案

- ① 本工程士质为砂性士即一、二类士、地下水位高于沟槽底标高,考虑采用轻型井点 降水,在雨水、污水管道沟槽一侧设置单排井点、井点管间距为1.2m,井点管布设长度超 出沟槽两端各10m.
- ② 沟槽挖方采用挖掘机在槽边作业、放坡开挖、边坡根据土质情况确定为1:0.5; 距高槽底 30cm 的土方用人工辅助清底。W1~W4 三段管道一起开挖、Y1~Y3 两端管道一起开挖,先施工污水管道,再施工雨水管道。

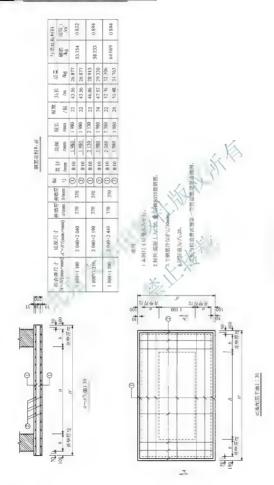


图 6.17 检查井底板结构图

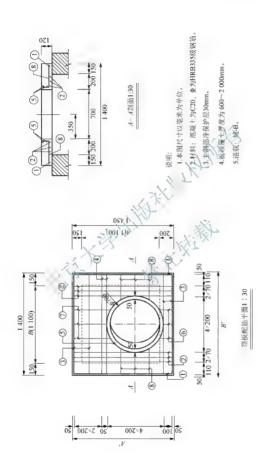


图 6.18 检查井顶板(井室盖板)平、剖面结构图

#### 钢筋及工程数量表

检查井尺寸	盖板尺寸 A'×B' /(mm×mm)	编	台	特图	根长 /mm	根数/根	共K /m	质量 /kg	每块顶板材料用量	
A×B /(mm×mm)		ij	径 /mm	/mm					钢筋 /kg	混凝 ±. /m³
Í 100×1 160	1 450×1 400	1	<b>±</b> 10	1390	1 390	2	2 780	1 715		
		2	±12	1390	1 390	6	8.340	7.406		
		3	±10	1340	1 340	4	5.360	3.307		
		4	ф12	1340	1 340	2	2.680	2.680 2.380	-	0.197
		3	912	<b>潜接42d</b>	3020	2	6.040 5.36	5.364		
		6	单10		均长 270	3	0.810	0.500		
		0	±10	50 冕 <u>均长49</u> 0	均长 620	3.	1.86	1.148		
		(8)	≥10	50 ≋ <u>±11€29</u> 0	均长 420	6	2.52	1.555		
		0	±10	1 390	1390	2	2.780	1.715		
] 100×1 250	1 450×1 550	② ±12 ③ ±10		1 390.	1 390	6	8.340	7.406		
				1.490	14 90	4 .	4 5.960	3.677		
		4	12 1 1 490		1 490	V2	2.980	2.648		
		(5)	⊉12	搭接42d	3 020	2	6.040	5.364	24.290	0224
		6	₾10	50 器/均长140	均长 270	3	0.810	0.500		
		0	110	50 氢 <u>均长49</u> 0	均长 620	3	1.86	1.148		
		8	<b>±</b> 10	50 皋 <u>均 以36</u> 5	均长 495	6	2.97	1.832		
		1	₫10	1 390	13 90	2	2.780	1.715		
1 100×1 500	1 450×1 800	2	皇12	1 390	1 390	6	8.340	7.406	25.814	0.267
		3	⊈10	1 740	1 740	4	6.960	4.294		
		<b>4</b>	±12	1 740	1 740	2	3.480	3.092		
		(5)	₾12	答. 搭接42d	3 020	2	6.040	5.364		
		6	±10	50 最 <u>均长14</u> 0	均长 270	3	0.810	0.500		
		7	<b>±</b> 10	50 ±1K.						
		8	±10							

图 6.19 检查井顶板(井室盖板)钢筋及工程数量表

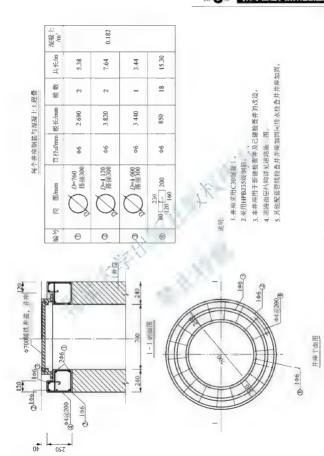


图 6.20 检查并并座(并图)结构图及工程数量表

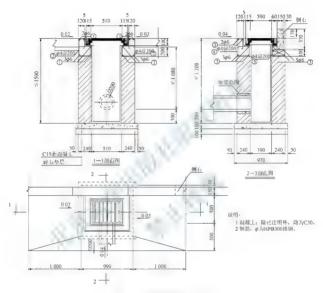


图 6.21 单算雨水口平、剖面图


钢筋明细表

主要工程数量表

						#4			南图。 720。	, 以利排水。 用砂浆填缝。
备注						超级			5周水口加内壁株面1	伝2~3cm, 并与路面接感, 以札 學账 与個石, 平石之间应用砂浆 置D300, 戸0.005。
雅	0.179	0.179	1.027	0.5	3.24	2	0.326		多児童 時, 井 ஜ.	用, 半 (石) 1 (石) 1
单位	m	"E	m³/m	, ui	m-/m	描	m,		III. 参 IU10机 K能砂线	东2~3cm,洋山照 学系 100台, 11位 ■ 10000, 110005。
材料名称	解白獎层	C15混凝土	陈砌体	10000000000000000000000000000000000000	にかず 一内側面	阿木口箅子及底座	C20帕筋混凝 +	**	送ぐ井	<ul><li>リ 対面に局限途路</li><li> 付,ト面が坐災: 施接入井方向设</li></ul>
中	_	2	E 1	4		K	9	说明:	2.算子周围尽 3.玩 固体用MI 4.勾缝、全类	5.要求曲水口 6.安装部房时 7.雨水口管:
	_	-	Z)							
表数	10		01		4	inco inco	v	10	21	12
首径 果飯	01 96		01	4	\$10 4	5	90	01 90	94 12	φ4 12
的图 肖径 果嫩	810	260	150 2000		1	275	500 STI	900	85 260 200 200 644 120 12	

注: ① 与筋造侧右折弯

图 6.22 单箅雨水口主要工程量、钢筋明细表

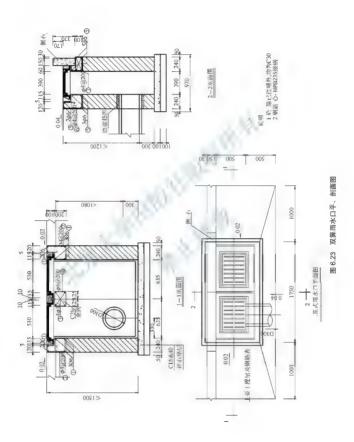

174

表 恶 聖 選 100

뇄

神

教

单位 Ē Ë

主要工程数量表

0.179 0.179 m'/m 1 027 3.24 CI

m²/m

**民**国 3.侧面 成學 · 英十

材料名称	醉石塾思	C15混凝十	時砌体	砂浆抹面内	南水口箅子及	C20年渐	25C 3A.	A. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	南水口勞由比周向 資學時,下面应坐 口管:隨接入井方		
业业	-	7	3	4	5	9	说明:	2.算 戶周 3.時間休 4.公鑑、	5.要求图水1 6.安装簿學1 7.图水口管:		
根数	10	74	01	(4.		Ś	10	12	12		
自径	184		44	010		ф	9ф	44	4		
盔	810	260	007 095 095	810	275	130	0691	260 200	150		
番九	Э	(	0	0	4	₹	(3)	9	0		

K

细

19

抑 Ë

0326

11:2本語砂浆。13年7.3cm, 并与路面接侧,以利排水。24: 尊生与側右、半右之间应用砂浆填缝。16.02里/390, 1.0.005. 一般上加固,参见单额商水口加固图。 砌筑MU10机砖,井内摩抹面厚20。

双箅雨水口主要工程量、钢筋明细表 图 6.24

- ③ 沟槽所挖土方就近用于沟槽回填,多余的土方直接装车用自卸车外运,运距为 5km。
- ④ 管谱均采用人工下管。
- ⑤ 混凝土、砂浆均采用现场拌制。
- ⑥ 钢筋混凝土条形基础、井底板混凝土施工时采用钢模、其他部位混凝土施工时采用 木槿或复合木槿.
  - ⑦ 检查井施工时均搭设钢管井字架, 检查井砌镇、抹灰时不考虑脚手架,
  - ⑧ 配备 1m3 履带式挖掘机 1 台。
  - (2) 计算本排水管道工程的基础数据
  - ① 计算管道基本数据、见表 6-6。

### 表 6-6 管道基本数据表

月号	*  42.91	平均原 地面标 高/m	平均管 内底标 高/m	管内底到 相底的深 度/m	沟槽   /m		y⊪ Virl	长度(井 中)/m	和井 长度/m	胶图 改 /个
1	W1→W2	5.205	2.600	0 175	2.78	-	12	27	1.1	4
2	W2~W3	5.150	2.543	0.175	2.607	_	1.2	30	1.1	4
3	W3~W4	5.055	2.483	0.175	2.572	_	1.2	30	1.1	4
4	Y1~Y2	5.350	3.314	0.32	2 036	_	1 88	45	1.1	14
5	Y2~Y3	5.275	3.224	0,32	2.051	_	1.88	45	1.1	14

# 知识链接

- 1. 沟槽挖深=平均原地面标高-平均管内底标高+管内底到槽底的深度
- 2. 湿土深=沟槽挖深-(原地面平均标高-平均地下水位标高)
- 3. UPVC 管: 管内底到槽底的深度=砂垫层的厚度+(Dm-DNN/2, 其中 DN 为管道公称 直径, Da 为管满外径。
- 4. 承插式钢筋混凝土管: 管内底到槽底的深度=(D<sub>1</sub>-D<sub>6</sub>)/2+C<sub>1</sub>+垫层厚度,其中 D<sub>1</sub> 为 承口外径, Da为插口内径, C1为平基高度。

如 W1~W2 段为 DN400UPVC 管, 采用砂基础, 根据图 6.11 可知:

管内底到槽底的深度=0.15+(0.45-0.4)/2=0.175(m)

沟槽挖深=5.205-2.600+0.175=2.780(m)

管道节数=(27-1.1)/6=5(节)

胶圈个数=5-1=4(个)

根据沟槽挖深、管径、查基础可知:沟槽底宽=1.2m

如 Y1~Y2 段为 D500 承插式钢筋混凝土管,采用钢筋混凝土条形基础,根据图 6.10 可知。

管内底到槽底的深度-(0.78-0.5)/2+0.08+0.1-0.32(m)

沟槽挖深=5.350-3.314+0.32=2.036(m)

管道节数 (45 1.1)/3 15(节)

胶圈个数=15 1=14(个)

根据基础图可知、平基窗度为 0.88m、混凝土管道基础中心 角为 135°、 查预算定额的 "管沟底部每侧工作面宽度计算表",可知每侧工作面宽度为0.5m。

沟槽底宽=0.88+0.5×2=1.88(m)

② 计算检查井基本数据、见表 6-7。

表 6-7 检查并基本数据表

序号	# 목	井径 /(mm≤mm)		设计井盖 平均标》/m	修内底 标准/m	,	井室砌筑 高度/m	井筒 高度/m	井筒砌筑 高度/m
1	Wl	1 100×1 100		5.723	2.627	3.141	1.845	1.176	0.886
2	W2	1 100×1 100	流槽井	5.642	2.573	3.114	1.845	1 149	0.859
3	W3	1 100×1 100	がいるカ	5.552	2.513	3.084	1.845	1.119	0.829
4	W4	1 100×1 100		5.462	2.453	3.054	1 845	1.089	0.799
5	Y1	1 100×1 100	落底井	5.850	3.359	2.991	2 2.3	0.571	0.281
6	Y2	1 100×1 100	流槽井	5.715	3.269	2.521	1.875	0.526	0.236
7	Y3	1 100×1 250	落底井	5.580	2.879	3.201_	2.3	0 781	0.491



# 知识链接

- 1. 井深(流槽)=设计井盖平均标高-管内底标高+管壁厚+坐浆厚度(通常为 2cm)
- 2. 井深(落底)=设计井盖平均标高-管内底标高+落底高度
- 3. 井室高度 H: 按设计要求最小高度确定。
- 4. 流槽井井室砌筑高度=设计图示最小井室高度 H,+管壁厚+坐浆厚度(通常为 2cm)
- 5. 落底井井室砌筑高度~设计图示最小井室高度 H+落底高度
- 6. 井简高度 h=井深-井室高度砌筑高度-井室盖板厚 1
- 7. 井筒砌筑高度=井筒高度 h-混凝土井圈厚-井盖厚

如 W1 为 1 100mm×1 100mm 流槽井, 根据图 6.13 和图 6.14 可知:

井深=5.273-2.627+(0.45-0.4)/2+0.02=3.141(m)

井室高度 H<sub>1</sub> 取定为设计最小值: 1.8m

井室砌筑高度=1.8+(0.45-0.4)/2+0.02=1.845(m)

井简高度=3.141-1.845-0.12=1.176(m)(查井顶板配筋图,可知井室盖板即井顶板厚为 0.12m) 并简砌筑高度 1.176-0.25-0.04-0.886(m)(查井座配筋图,可知井關厚 0.25m, 井盖及井 盖座厚 0.04m)

如 Y1 为 1 100mm×1 100mm 落底井、根据图 6.11 和图 6.12 可知:

井深=5.850-3.359+0.5=2.991(m)

井室高度 H. 取定为设计最小值: 1.8m

井室砌筑高度=1.8+0.5=2.3(m)

井简高度 2.991 2.3 0.12 0.571(m)(查井顶板配筋图,可知井室盖板即井顶板厚为 0.12m) 井筒砌筑高度 0.571 0.25 0.04 0.281(m)(查井座配筋图, 可知井圈厚 0.25m, 井盖及 井盖座厚 0.04m)

- (3) 计算分部分项的项目工程量,并确定套用的定额子目。
- ① 计算上石方相关分部分项项目的工程量、见表 6-8。



表 6-8 土石方相关分部分项项目工程量计算表

连中	分割分項項目各称	* *	罗蒙氏		配配工
		L	W1~W2: (12-43-50.5) × 0.3 × 27 × 1.025=11.21		
and the same of	24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		W2 W3: (12+03-05)-03-30-1025 1245		
A 1.72	人工经沟槽上方(一) 華上 本 特用等级人	Ê	W3~W4: (1.2+0.3-(0,5)×0,3×30×1.025=12.45	92.29	1 5 <sub>H</sub>
K			Y1~Y2; (1.88+0.3×0.5)-q3×445×1.025=28.09		
			Y2~Y3; (1.88+0.3×0.5)×0.3×45×1.025=28 09		
			W1~W2: (1.2+2.78-0.5)-2.78-27-1.025 11.21=188.06		
			W2 ~ W3: (12+2607×0.5)×2.607×30×1.025-12.45=188.24		
松相	总统方量	É	W3~W4: (12+2572-0.5)-2.572-30-1.025-12.45=184.17	1 051.31	
1115			Y1-Y2: (1.8812 036 0.5) 2 036 × 45 · 1.025 28.09 = 244.06		
			Y2~Y3; (1.88+2.051-0.5)×2.051~45-1.025 28.09-246.78		
. <	共 挖掘机挖土个装车	°E	862.30 -1.15 92.29	899.36	1.56
	中 挖掘机挖工开装作	m	1 051.31 899.36	151.96	1-59
			W1~W2 段: 1'wee ware,===[12+05-(0.15+0.15+0.5])>(0.15+0.45-05)>(27-11)=4986		
			W2 - W3 Bz - 17 may metry - [1,2+0.5+(0.15+0.15+0.5)]-(0.15+0.45-0.5)×(30-1.1)-55.63		
			$W3 \sim W4 \ {\rm 42}; \ \ I'w_{12-\pi\alpha_{1}\alpha_{2}}, \ [12+0.5 \cdot (0.15+0.15+0.5)] \cdot (0.15+0.45-0.5) \cdot (30 \ 1.1) - 55.63$		
			$W1 \sim W4 \not \!$		
	填水	m <sup>2</sup>	V1~V3 $E_L$ : $V_{\text{perculantage}=9,48=6.18+13,48+} \frac{\pi \times 0.61^2}{4} \times (45 \cdot 1.1) \times 2=54.79$	862.17	1-87
			$Y11, \ V_{BB}\!=\!0.50+0.83+(1.1+2\times0.37)^2\times2.3+0.20+\frac{\pi(0.7+2\times0.24)^2}{4}\times0.571\!=\!9.94$		
			Y2: $V_{\text{BW}}=0.50+0.83+(1.1+2\times0.37)^2\times1.875+0.20+\frac{\pi(0.7+2\times0.24)^2}{4}\times0.526=8.45$		

福士		862.17 1-87		1 68+	1-69×4
		862.		131	08.161
村 東京	$Y3; \ \ I^{{110}}=0.54*0.89*(I.1.1*2*0.37) \times [I.25*2*0.37] \times 2.3-0.22 + \frac{\pi (0.7 + 2\times0.24)^2}{4} \times 0.781 = 10.93$	E1',-49,86+55,63+55,63+36,07+54,79+9,94+8,45+10.93=281,30	1. a-1. , EV a=92.29+10\$1.31 281.30=862.30	31 1 106 620 16 130 1 106 60	m: 52,2271 US1,51 002,5U-1,13
<b>■</b> ③	,			E	
<b>以第54条百件等</b>	4	机方		(1) the factor of East	1 8 7 7 4 4 71 (3KIII)
			_		

注: 上表中订算由井的体积时, 4 只污水力取平均井深订款; 3 只雨水井運一进行过算。由井的体积可接以下公式订算。

② 计算管 這相关分部分项项目的工程量, 见表 6-9。

# 表 6-9 管道相关分部分项项目工程量计算表

手手	分部分顷项目名称 单位	单位	11世代文文		数量 定额子目
			W1 · W2: (12:05.015) · 0.15 · (27 1.1)=4.95		
-	砂塘原	~e	W2~W3i (1.2+0.5×0.15)×0.15×(30-1.1)=5.53	16.01	6-266
			W3~W4: (1.2×0 5×0 15)×0.15 <(30 1.1 ps5.53		
			W1~W2: (1.2+0.5×0.15+0.45+0.5)~(0.15+0.45+0.5)~(27 1.1) 4.95 $\frac{\pi 0.45}{4}$ <(27 1.1)=40.79		
7	沟槽间痕砂	"H	$W2-W3: \ (12+0.5\times0.15+0.45+0.5)\times(0.15+0.45+0.5)\times(30-1.1)-5.53-\frac{\pi0.45^2}{4}\times(30-1.1)-45.51 \ \ 131.81\times10^{-1} \times 10^{-1} \times 10$	131.81	6 286
			W3~W4: 同 W2~W3 段=45.51		

体外

					1X 4X
库号	分部分项项目名称	单位	计算式	数层	ETTI
3	Dv400 UPVC 管道網设	ш	27-1.1+30-1.1+30-1.1	83.7	6-46
4	DN400UPVC 管橡胶圖 接口	=		12	6 194
Š	DN400 管道别水试验	m	27+30+30	87	6 211
,		en	$Y1 \sim Y2$ , $(0.88+2\times0.1)=0.1\times(43-1.1)=4.74$	0 40	0 30 7
¢	CIU NAME L'EM	m.	Y2~Y3: (0.88+2×0.1)×0.1×(45/11.1)=4.74	9.48	0-258
	# 20 I 20 III 20 III	-	V1~V2: 0.88×0.08×(45-1.1)-3.09 (%)		
_	C20 % 正 下掛	m,	Y2~Y3; 0.88×0.08×(45 1.1)=3.09	6.18	0 2/011
	Anna Matter I amend		YI~Y2: 0.224×(45-1.1)-3.09-6.74		000
00	C20 記念 二百元	E	Y2~Y3; 0.224×(45-1.1)-3.09=6.74	3.48	1797 0
0,	/0500 海級七倍道铺设 (人工)	E	45 1.1+45-1.1	927.00	6 27
9	D500 管承插式橡胶圈接 [1]	<b>□</b>	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	28	6-179
=	11 D500 管道闭水试验	Ε	45+45	06	6 212

# ③ 计算检查井相关分部分项项目的工程量, 见表 6-10。

表 6-10 检查井相关分部分项项目工程量计算表

序	New York and a second	<b>M</b>	A SEA	a.F	定額 子目
			井泳 3098m 计算, 井室砌筑高度-1.8	845m , ‡	丰简高度
	h=3.098-1.845-0.12=1.133(m),	井筒	砌筑高度-1.133-0.25-0.04-0.843(m)]		
1	C10 井垫层	m³	(2.04+2×0.1)×(2.04+2×0.1)×0.1×4	2.01	6-229 <sub>H</sub>
2	C20 井底板	m <sup>3</sup>	2.04×2.04×0.2×4	3.33	6-276 <sub>H</sub>
3	井室砌筑(矩形、M10 砂浆)	m <sup>3</sup>	2.18×1.845×4+0.35×4	17.49	6-231 <sub>H</sub>
4	井筒砌筑(圆形、M10 砂浆)	m³	0.71×0.843×4	2.39	6-230 <sub>H</sub>
5	井壁抹灰	m <sup>2</sup>	(11.76×1.845+5.91×0.843)×4/	106.72	6-237
6	流槽抹灰	m <sup>2</sup>	2.14×4	8.56	6-239
7	C20 井室盖板預制	m³	0.197×4	0.79	6-337
8	C20 井室盖板安装	m <sup>3</sup>	0.197×4	0.79	6-348
9	C30 井圏預制	m <sup>3</sup>	0.182×4	0.73	6-249 <sub>H</sub>
10	C30 并图安装	m <sup>3</sup>	0.182×4 ₹ ×	0.73	6-353
11		套。	4/17	4	6-252
* *	1 100×1 100 雨水落底井(井深)	为 2.99	Pin)		
12	C10 并稳层	m³	(2.04+2×0.1)×(2.04+2×0.1)×0.1	0.50	6-229 <sub>H</sub>
13	C20 井底板	m <sup>3</sup>	2.04×2.04×0.2	0.83	6-276 <sub>H</sub>
14	井室砌筑(矩形、M10 砂浆)	m <sup>3</sup>	2.18×2.3	5.01	6-231 <sub>H</sub>
15	井筒砌筑(圆形、M10 砂浆)	m³	0.71×0.281	0.20	6-230 <sub>H</sub>
16	井壁抹灰	m <sup>2</sup>	11.76×2.3+5.91×0.281	28.71	6-237
17	C20 井室盖板預制	m <sup>3</sup>	0.197×1	0.20	6-337
18	C20 井室蓋板安装	m <sup>3</sup>	0.197×1	0.20	6-348
19	C30 井圏預制	m³	0.182×1	0.18	6-249 <sub>H</sub>
20	C30 井圏安装	m <sup>3</sup>	0.182×1	0.18	6-353
21		套	1	1	6-252
77	1 100×1 100 雨水流槽井(井深)	为 2.52	:Im)		
22	C10 井垫层	m <sup>3</sup>	(2.04+2×0.1)×(2.04+2×0.1)×0.1	0.50	6-229 <sub>H</sub>
23	C20 井底板	m <sup>3</sup>	2.04×2.04×0.2	0.83	6-276 <sub>H</sub>
24	井室砌筑(矩形、M10 砂浆)	m <sup>3</sup>	2.18×1.875+0.35	4.44	6-231 <sub>H</sub>
25	井筒砌筑(圆形、M10 砂浆)	m <sup>3</sup>	0.71×0.236	0.17	6-230 <sub>H</sub>
26	井壁抹灰	m <sup>2</sup>	11.76×1.875+5.91×0.236	23.44	6-237
27	流槽抹灰	m <sup>2</sup>	2.14×1	2.14	6-239
28	C20 井室盖板预制	m <sup>3</sup>	0.197×1	0.20	6-337
29	C20 井室盖板安装	m <sup>3</sup>	0.197×1	0.20	6-348



					续表
序号	分部分项项目名称	鱼鱼	WWW.	JUL.	定額 子目
30	C30 井圏預制	m <sup>3</sup>	0.182×1	0.18	6-249 <sub>H</sub>
31	C30 井圏安装	m <sup>3</sup>	0.182×1	0.18	6-353
32		套	1	1	6-252
四	1 100×1 250 雨水落底井(井深	为 3.20	Dlm)		
33	C10 并垫层	m <sup>3</sup>	(2.04+2×0.1)×(2.19+2×0.1)×0.1	0.54	6-229 <sub>H</sub>
34	C20 井底板	m <sup>3</sup>	2.04×2.19×0.2	0.89	6-276 <sub>H</sub>
35	井室砌筑(矩形、M10 砂浆)	m <sup>3</sup>	$2.29 \times 2.3 - \frac{\pi 0.93^2}{4} \times 0.37$	5.02	6-231 <sub>H</sub>
36	井筒砌筑(圆形、M10 砂浆)	m <sup>3</sup>	0.71×0.491	0.35	6-230 <sub>H</sub>
37	井壁抹灰	m <sup>2</sup>	12.36×2.3+5.91×0.491 .	31.33	6-237
38	C20 井室盖板预制	m <sup>3</sup>	0.224×1	0.22	6-337
39	C20 井室盖板安装	m <sup>3</sup>	0.224×1	0.22	6-348
40	C30 井圏預制	m <sup>3</sup>	0.182×1	0.18	6-249 <sub>H</sub>
41	C30 井圏安装	m <sup>3</sup>	0.182×1	0.18	6-353
42		套	1,00	1	6-252

# ④ 计算钢筋相关分部分项项目的工程量、见表 6-11,

表 6-11 钢筋相关分部分项项目工程量计算表

序号	and the same		1//-		定額 子目
1	现浇构件钢筋、圆钢(混凝土条形 基础)	t	0.006 17×10 <sup>2</sup> ×(5+4)×(45-1.1)×2+0.006 17× 8 <sup>2</sup> ×8.005×(45-1.1)×2	0.765	6-1124
2	现浇构件钢筋,螺纹钢(井底板)	t	53.754×6+58.233×1	0.381	6-1125
3	預制构件钢筋, 圆钢(井圈)	ŧ	0.006 17×6 <sup>2</sup> ×(5.38+7.64+3.44)×7+0.006 17× 4 <sup>2</sup> ×15.30×7	0.036	6-1126
4	预制构件钢筋,螺纹钢(井室盖板)	t	23 232×6+24 290×1	0 164	6-1127

# (4) 确定技术措施项目,并计算工程量、确定套用的定额子目,见表 6-12。

表 6-12 施工技术措施项目工程量计算表

序号	技术措施项目名称	单位	91 <b>N</b> 80	W.E.	定額 子目
1	轻型开点井点管安装	根	(27+30+30+20): 1.2+(45+45+20): 1.2	183	1 323
2	轻型井点井点管拆除	根	(27+30+30+20): 1.2+(45+45+20): 1.2	183	1 324
3	井点使用	套・天	2×7+2×10	34	1 325
4	钢管井字架(4m 内)	座	根据施工方案确定	7	6 1138

续表 定额 RATION SEEDS 5 lm3 挖掘机讲出场 台班 根据施工方案确定 1 3001 6 现烧管道混凝上垫层模板 m2 0.1×(45-1.1)×2×2 17.56 6-1044 7 现浇管道平基模板 0.08×(45-1.1)×2×2 14.05 6-1094 现浇管道管座模板  $m^2$ 0.208×(45-1.1)×2×2 36.52 6-1096 污水井: 2.24×0.1×4×4 o 现涂井垫尺模板 m<sup>2</sup> 6.31 6-1044 雨水井: 2.24×0.1×4×2+2.24×0.1×2+2.39×0.1×2 污水井: 2.04×0.2×4×4 10 现浇井底板模板 m<sup>2</sup> 11.48 6-1094 雨水井: 2.04×0 2×4×2+2 04×0 2×2+2.19×0.2×2 11 预制井室盖板模板 m3 0.79(沪水井)+0.2+0.2+0.22 1 41 6-1111 12 预制井圈模板 0.73(污水井)+0.18+0.18+0.18 6-1121 m3 1.27

(5) 确定组织措施项目。

根据本工程的实际情况,考虑计取一下施工组织措施项目:安全文明施工费、工程定 位复测费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、行车行人干扰增加费、已完工程及设备 保护费.

- (6) 确定人、材、机单价, 判定工程类别、确定各项费率。
- ① DN400UPVC 管道橡胶圈单价为 20 元/只, 圆钢单价为 3 400 元/t, 螺纹钢单价为 3 300 元/t, DN400 UPVC 管道单价为 95 元/m, D500 镀筋混凝土管道单价为 150 元/m, 砖块单 价为 400 元/千块: 一类人工工目单价为 65 元, 二类人工工目单价为 70 元; 其他人、材、 机单价按《浙江省市政工程预算定额》(2010版)计取。
  - ② 本管谱工程为三类排水工程。
- ③ 企业管理费,利润、各项组织措施费的费率按《浙江省建设工程施工费用定额》(2010 版)及浙江省有关规定的费率范围的低值计取;规费、税金按《浙江省建设工程施工费用定 额》(2010版)的规定计取。
  - (7) 计算定额计价模式下,本排水管道工程的投标报价,详见表 6-13~表 6-21。

### 表 6-13 投标报价扉页 某市中华路排水管道工程 预算价 预算价 (小写): 174 459 元 (大写): 青拾集万肆任叁佰集拾叁元整 工程告价 发包人: 承包人: 咨询人: (单位盖章) (单位盖章) (单位资质专用章)



### 市政工程计量与计价(第三版)

法定代表人 或其授权人:		法定代表人 或其授权人:	
	(造价人员签字盖专用章)		(造价人员签字盖专用章)
编 制 人:		复核人:	
	(造价人员签字盖专用章)		(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	

表 6-14 总说明

### L程名称: 某市中华路排水管道工程

第1页 共1页

### ·、工程概况及实施范围

某市中华路排水管道 L程南水管道实施的起讫井号为 YI~Y3, 污水管道实施的起讫井号为 WI~W4, 均不包括沿线的支管及支管井、不包括南水口及连接管。管管 D≤400mm 采用水桶式 UPVC 管、砂基幅:管管 D≥500mm 采用水桶式钢筋混凝土管、钢筋混凝土条形基础。两污水均采用砖砌矩形或方形检查井。工程沿线上振为砂性上,地下水位于地表以下 1.3~1.5m

### 二、施工方案

- (1)本工程主质为砂性土,地下水位高于沟槽成标高,考虑采用轻型井点降水,在雨水、污水管道 沟槽一侧设置单排井点,井点管间距为1.2m。井点管布设长度超出沟槽两端各10m。
- (2) 內槽挖方采用挖掘机在槽边作业、放坡开挖,边坡根据上所情况确定为1:0.5; 距离槽底30cm的上方用人上辅助清底。W1~W4 : 段管道一起开挖,Y1~Y3 两端管道一起开挖,先施工污水管道,再施工雨水管道。
  - (3) 沟槽所挖土方就近用于沟槽回填, 多余的土方直接装车用自卸车外运、运跑为 5km。
  - (4) 管道均采用人工下管。
  - (5) 混凝土、砂浆均采用现场拌制。
- (6) 钢筋混凝土泵形基础、井底板混凝土施工时采用钢模,其他部位混凝土施工时采用木模或复合木桩。
  - (7) 检查并施工时均搭设钢管井字架。检查井砌筑、抹灰时不考虑脚手架。
  - (8) 配备 lm3 履带式挖掘机 1 台。
- :、人、材、机单价的取定

DN400 UPVC 管道橡胶團单价为20 元/1、関領单价为3 400 元/1、螺纹钢单价为3 300 元/t、DN400 UPVC 管道单价为95 元/m. D500 钢筋混凝 上管道单价为150 元/m. 最块单价为400 元/ 千块: 一类人 LL目单价为65 元. 二类人 LL目单价为70 元; 其他人、材、机单价按《新江省市政工程預算定额》(2010 版) 計取。

### 四、费塞的取定

企业管理费、利润、各项组织措施费的费率按《浙江省建设工程施工费用定额》(2010 版)及浙江省 有关规定的费率范围的低值计取;规费、税金按《浙江省建设工程施工费用定额》(2010 版)的规定计取。 五、编制依据

- (1)《浙江省市政工程预算定额》(2010版)。
- (2)《浙江省建设工程施工费用定额》(2010版)。
- (3) 浙建站计[2013]64 号——关于《浙江省建设工程费用定额》(2010 版)费用项目及费率调整的通知。
- (4) 建建发[2015]517 号 关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知。

# 表 6-15 工程项目预算汇总表

# 工程名称:某市中华路排水管道工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金額/元
1	排水	174 459,35
1.1	排水	174 459.35
	合 计	174 459

## 表 6-16 单位(专业)工程预算费用计算表

单位(专业)工程名称: 排水 排水

第1页 共1页

序号		费用名称	计算公式	金额/元
	预算	<b>拿定额分部分项工程量</b>	按计价规则规定计算	146 016.78
	其中	1. 人工费+机械费	Σ(定额人工费+定额机械费)	53 375.41
:	施	L组织措施费	1 MIN	7 312.44
		2. 安全文明施工费(含扬尘防治增加费)	. IXN.54%	6 159.52
		3. 工程定位复测费	1×0.03%	16.01
	其	4. 冬雨季施工增加费	1×0.1%	53.38
	1	5. 夜间施工增加费	1×0.01%	5.34
		6. 己完工程及设备保护费》	1×0.02% 1	10.68
		7. 行人、行车干扰增加费	1×2%X/1	1 067.51
- 5	企	Z 管理费	1×13%	6 938.80
四	利剂	H 70-1	1×8%	4 270.03
Ti.	规	the True	12+13	3 896.40
	8.	排污费、补保费、公积金	1×7.3%	3 896.40
	9.	农民工工伤保险费	按相关规定计算	0.00
六	危	<b>金作业意外伤害保险费</b>	按相关规定计算	0.00
Ł	总	<b>套包服务费</b>		0.00
	10.	总承包管理和协调费	分包项目工程造价×0%	0.00
	11.	总承包管理、协调和服务费	分包项目工程造价×0%	0.00
	12.	甲供材料设备管理服务费	甲供材料设备费×0%	0.00
八	风	<b>金费</b>	(一+二+三+四+五+六+七)×0%	0.00
九	哲列	河金额	(一+二+三+四+五+六+七+ 八)×0%+创标化工地增加费	0.00
F	计和	<b>党不计费</b>	计税不计费	0.00
+ -	不i	<b>十税不计费</b>	不计税不计费	0.00
+	税金	È	( ~+ 1+三+四+五+六+七+八+九+ 十)×3.577%	6 024.90
<del> </del>	建计	<b>设工程造价</b>	-+二+三+四+五+六+七+八+九+ ++十 -+十二	174 459.3



表 6-17 工程预算书(分部分项项目)

4							单价组成师		
					The second second	人工概	村科教	机械策	Ratheres
1 56		<b>松伽矶绘 、二类1, 不数1</b>	1 000m <sup>2</sup>	668.0	2 293.59	312.00	00.00	1 981.59	2 062.76
1-59		挖掘机控 、 : 类 1. 装 7	1 000m <sup>3</sup>	0.152	3 452.82	312.00	0.00	3 140.82	524.69
1 5 恢		人工控沟槽、基坑厂方, 深 4m 以内, 一、二 类土, 人工辅助开党(包括切边、修整底边)	100m³	0.923	2 331.88	2 331.88	00.00	00.0	2 152.09
1 87		州、坑, 填上分次	100m³	8.623	891.54	717.60	0.00	173,94	7 687.75
1 68+1	1 68+1 69-4 换	白卸汽车运士, 远距 5km	1 000m <sup>3</sup>	0.152	11 182.35	00'0	35.40	11 146.95	1 699.27
6 266		砂塘民	10m³	1,601	1 073.59	329.00	727.15	17.44	1 718.82
6 286		黄砂沟槽回点	10m³	13.181	961.26	242.90	711.86	6.50	12 670 37
6 46		型料指水管编设, 管径 400mm 以内	100m	0.837	10 077.53	422.80	9 654.73	0.00	8 434.89
6-194		颗朴谱水管,水插式撑松崩接口,管管 400mm 以内	LE ALL	1.200	319.00	110.60	208.40	00:00	382.80
6 211		管道回水试验, 管径 400mm 以内	100m	0.870	211 95	116.90	95.05	000	184.40
6 268		现法现非混溅上垫层 C10(40)	10m <sup>3</sup>	0.948	2 750.93	842.80	1814.57	93.56	2 607,88
6 276 梅	452	集(管)道、龍龍 平基、現為規件混載   C20(40)	10m³	0.618	3 438.58	1 190.70	2 055.77	192.11	2 125.04
6 282 換	452	犯数十阶座, 规范选择推接+ C20(40)	10m³	1.348	3 677.41	1 362.20	2 141 71	173.50	4 957.15
6 27		承插式混凝上管道辅设,人工下管,管径 500mm以内	1.00m	0.878	16 417.00	1 267.00	15 150.00	00'0	14 414.13
6119		排水管道, 混凝土管胶圈(承插)核口, 管径 500mm 以内	10 个日	2.800	283.54	114.10	169 44	00.0	793 91
		本所小社	N. 21.						20 317 69

世							单价组成元		
-	***	450	<b>M</b> 40		月/冬日	10 To	W8824	m para	15年10日
91	6 212	审单间本,3/46, 省径 500mm 以内	100m	0.900	307 06	160.30	146.76	000	276.35
17	6 229 換	混凝土井垫层, 境送现件混凝土 C10(40)	10m³	0.355	3 005.56	973.00	1 839.54	193.02	1 066.97
90	6 276 换	乒啶板, 現港現井,混嵌   C20(40)	10m³	0.588	3 438.58	1 190.70	2 055.77	192.11	2 021.89
6	6 231 換	草形井砖砌, 水泥砂浆 M10.0	lom	3.196	3 480 80	797 23	2 611 59	71.98	11 124 64
20	6 230 换	圆形井砖砌, 水泥砂浆 M100	10m3	0.311	3 834 14	1 060.99	2 672.10	101.05	1 192 42
21	6 237	传播井壁林及	100m <sup>2</sup>	1.902	2 222.83	1 650.11	505 18	67.54	4 227.82
22	6 239	传增流槽抹灰	100m²	0 107	1 962.71	1 389.99	505.18	67.54	210.01
28	6 1124	规浇构件钢筋(圆钢), 直径∅10、♦8	1	0.765	4 340 87	774 90	3 517.24	48.73	3 321.16
29	6 1125	规德构件钢筋(螺纹钢), 直径410	1	0.381	3 944,64	448.70	3 421.34	74.60	1 501.95
30	6 1127	顶"」构件树筋(螺纹钢), 白径410, 412	1	0.164	3 937 18	423.50	3 419,63	94.05	644.45
31	6 1126	鱼生物的一种的一种,有一种,有一种。	1	0.036	4 453.06	816.20	3 199.76	137.10	161.05
		4	本東小川						32 149.22
			A ++ ♦			1			71 595 70



表 6-18 工程預算书(按术措施項目)

单位(重	单位(专业)工程名称: 排水 排水	非 排水 排水							第1页 共1页
			X				单价组成/〒		
el Pl					- Marie	W-17	材料數	机械头	N. C.
-	1 323	轻化厂点降水交表	10 代	18.300	1 320.17	645.82	379.61	294,74	24 159,11
2	1-324	种型压点降水排除	10 條	18.300	410.67	230.37	0.00	180.30	7 \$15.26
3	1 325	使用轮型井点降水	赛· 天	34.080-	335.57	140.00	29.41	166.16	11 409.38
7	6 1138	钢管并字架, 并深 4m 以内	NA:	7.000	130.25	124.39	5 86	0.00	911.75
5	6-1044	池湖土耸迫华层木模	100m²	0.176	2 754 01	860.16	1 851.93	41.92	483.60
9	6 1094	現流電視工管、東道平基的模	100m²	0.141	3 536 58	1 905 75	1 497.73	133.10	496 89
7	9601-9	現法混凝,管理網模	100m²	0.365	4 724 97	3 090.78	1 501.09	133.10	1 725.56
90	6 1044	<b>非特层木模</b>	100m²	0.063	2 754.01	860.16	1 851 93	41.92	173.78
6	6 1094	并底板钢模	100m²	0.115	3 536.58	1 905.75	1 497 73	133.10	406.00
10	6 1111	顶山井立孟板复合木模	10m²	0.141	1 512 02	945.56	502.96	63 50	213 19
=	6 1121	预制配散 七井網木模	10m³	0.127	3 907 66	1 993 74	1 900.40	13 52	496 27
12	3001	规带式挖掘机 [m"以内	台州	1.000	3 460.82	840.00	1 216.56	1 404.26	3 460.82
			本页	本页小计					51 451,61
			40	#			5		\$1 451.61

### 表 6-19 主要材料价格表

## 单位(专业) 工程名称:排水-排水

第1页 共1页

序号	材料编	WW. W. L.	<b>加州、里市</b> 第	411		1-01120	rbnoc
1	0403045	黄砂(毛砂)	综合	ŧ	348.034	40	13 921.36
2	0413091	混凝土实心砖	240×115×53	千块	19.193	400	7 677.32
3	1431437	UPVC 双壁波纹排 水管	DN400	m	84.956	95	8 070.77
4	1445021	钢筋混凝上承插管	φ 500×4 000	m	88.678	150	13 301.70
5	3301031	铸铁井盖	♦700 轻型	套	7.000	649	4 543.00
6	j3115031	电(机械)		kW • h	13 769.747	0.854	11 759.36
7	0205605	橡胶圈	DN400	只	/ N2\180\	20	243.60
8	8021211	现浇现拌混凝土	C20(40)	m <sup>3</sup>	27.354	192.937	5 277.65
9	9908042	射流井点泵	最大抽吸深度 9.5m	台班	102,000	55.387 9	5 649.57
			合 计2八个	1			70 444.33

# 表 6-20 主要工日价格表

单位(专业)工程名称:排水-排水。

第1页 共1页

序号	エ秧ノ	单位	人人工数量	单价/元
1	类人 [.	TH	133.353	65
2	二类人工	工刊	615.070	70
3	人工(机械)	工目	38.177	70

# 表 6-21 主要机械台班价格表

单位(专业)工程名称。排水-排水

第1页 共1页

- 107 ( 4 J	J.Lite to this first first			70 1 N 7 1 7
序号	机恒设备名荷	典性	8 2	季价/元
1	履带式推土机 90kW	台班	0.360	732.633 5
2	履带式单斗挖掘机(液压)1m3	台班	1.806	1 105.38
3	电动夯实机 20~62kg · m	台班	70.092	21.796 4
4	履带式电动起重机 5t	台班	19.215	171.71
5	汽车式起重机 5t	台班	1.212	357.21
6	载货汽车5t	台班	0.215	344.136 5
7	自卸汽车 12t	台班	2.371	698.776 5
8	平板拖车组 40t	台班	1.000	1 047.049 5
9	机动翻斗车 lt	台班	4.481	136.730 5

结表

序号	机械设备名称	单位	数 量	单价/元
10	洒水汽车 4 000L	台班	0.091	410.056
- 11	电动卷扬机单筒慢速 50kN	台班	0.332	120.744 4
12	双锥反转出料混凝土搅拌机 350L	台班	2.355	123.726 1
13	灰浆搅拌机 200L	台班	1.370	85.572 9
14	钢筋切断机 40	台班	0.139	38.823 4
15	钢筋弯曲机 ø 40	台班	0.280	20.951 2
16	木工圆锯机 6500	台班	0.089	25.386
17	木工压刨床单面 600mm	台班	0.029	33.414 4
18	电动多级离心清水泵 H<180m	台班	10.431	400.579 5
19	污水泵 Ø 100	台班	1 103431	116.51
20	射流并点泵最大抽吸深度 9.5m	台班	102 000	55.387 9
21	直流弧焊机 32kW	台班厂	0.227	94.274 4
22	对焊机容量 75kV·A	()、冶胜	0.038	123.056 6
23	点焊机长臂 75kV·A	台班	0.049	175.914
24	混凝土振捣器平板式 BLL	~ 台班	7.076	17.556
25	混凝土振捣器插入式	台班	2.393	4.826

# \_ 《思考题与习题》

# 一、简答题

- 1. 排水管道基础、垫层、管道铺设工程量计算时、是否需扣除检查井所占长度?管道 闭水试验工程量计算时、是否需扣除检查井所占长度?
  - 2. 管道管座角度如果与定额不同、在套用管道接口定额时,如何换算?
  - 3. 塑料管道铺设定额子目基价是否包括橡胶圈的费用?
- 4. 某排水管道基础采用钢筋混凝土条形基础,施工时均采用木模,试分别确定管道平 基、管座模板套用的定额子目。
- 菜排水检查井, 其井室盖板、井口盖板均为预制混凝土, 施工时均采用木模, 试分 剂确定井室盖板、井口盖板模板套用的定额子目。
  - 6. 如何计算检查井的井深? 如何确定井室的高度以及井筒的高度?
  - 7. 井筒的总高度与井筒的砌筑高度相同吗?
  - 8. 流槽井与落底井的计算项目有什么区别?
  - 9. 流槽井的流槽砌筑和流槽抹灰项目如何套用定额子目?
  - 10. 检查井施工时,通常哪些部位是现浇的?哪些部位是预制的?
  - 11. 现浇混凝土的模板与预制混凝土的模板计算规则有何不同?
  - 12. 钢筋混凝土条形基础管座混凝土的工程量如何计算?

- 13、管道顶进工程量如何计算? 水平定向钻牵引工程量如何计算?
- 14. 沉井刃脚高度怎么确定?
- 15. 沉井井壁厚度上下不同时。如何套用定额?
- 16、构筑物池壁挑檐、池壁牛腿有何不同?
- 17. 构筑物工程预制钢筋混凝土池内壁板安装套用什么定额子目?
- 18. 排水工程中, 预制混凝土构件的模板与现浇混凝土的模板工程量计算规则相同吗?
- 19. 排水工程中,后张法预应力钢筋长度如何确定?

### 二、计算题

- D1500 钢筋混凝土平口管,采用钢丝网水泥砂浆接口(135°管基),确定套用的定额 于目及基价。
- 2. D1500 钢筋混凝土平口管,采用钢丝网水泥砂浆接口(135°管基),设计要求内抹口,确定套用的定额子目及基价。
- 3. 计算图 6.4 中 Y3~Y4 段管道铺设及垫层、基础的工程量、并确定套用的定额子目及基价。
- 4. 某 ø 1 500 顶管工程,采用手掘式敞开式顶进,总长 150m,设置三级中继间,如图 6.25 所示, 计算该项管工程人工的用量。



- 某排水构筑物池体底板为锥形池底、池底混凝土施工时采用木模、池底板挖深为 4m、确定池底板模板套用的定额子目及基价。
- 菜管道工程检查井采用预制混凝土井盖板、采用木模板、确定套用的定额子目及 基价。
  - 7. 计算图 6.7 中 Y5、Y6 井砌筑的工程量、抹灰的工程量。

# 第**了**章《桥涵工程》预算定额 应用


# 本章学习要点

- 1. 打桩工程工程量计算规则、计算方法、定额的套用和换算。
- 2. 钻孔灌注桩工程工程量计算规则、计算方法、定额的套用和换算。
- 3. 砌筑工程工程量计算规则、计算方法、定额的套用和换算。
- 4. 钢筋工程工程量计算规则、计算方法、定额的套用和换算。
- 5. 现浇混凝土、预制混凝土工程工程量计算规则、计算方法、定额的套用和换算。
- 6. 安装工程工程量计算规则、计算方法、定额的套用和换算。
- 7. 临时工程工程量计算规则、计算方法、定额的套用和换算。

# 引言

某桥梁工程钻孔灌注桩基础如下图所示, 桩径为 1.2m, 桩顶设计标高为 0.00m, 桩底设计标高为 29.50m, 桩底要求入岩 0.5m, 桩身采用 C25 钢筋混凝土, 现要计算钻孔灌注 桩相关的工程量。有哪些项目需要计算?如何进行计算?

计算时要考虑原地面标高、设计桩顶标高、设计桩底标高、混凝土灌注后桩顶标高之 间的关系。



《桥涵工程》是《浙江省市政工程预算定额》(2010 版)的第三册,包括打桩工程、钻孔 灌注桩工程、砌筑工程、钢筋工程、现浇混凝土工程、预制混凝土工程、立交箱涵工程、 安装工程、临时工程、装饰工程,共10章。

- 1. 《桥涵工程》册的定额适用范围
- (1) 单跨 100m 以内的城镇桥梁工程。
- (2) 单跨 5m 以内的各种板涵、拱涵工程。
- (3) 穿越城市道路及铁路的立交箱涵工程。
- 2. 《桥涵工程》册定额套用及相关说明
- (1) 預制混凝上及钢筋混凝上构件均属现场预制,不适用于独立核算、执行产品出厂价格的构件厂所生产的构配件。
  - (2) 本册定额中未包括预制构件的场外运输。



- (3) 本册定额中均未包括各类操作脚手架,发生时按《通用项目》相应定额执行。
- (4) 本册定额河道水深取定为 3m。
- (5) 圆管涵套用第六册《排水 E程》的定额,其中管道铺设及基础项目人 E、机械费乘以系数 1.25。
- (6) 本册定额提升高度按原地面标高至梁底标高 8m 为界。若超过 8m, 应考虑超高因素(悬浇箱梁除外)。
- ① 现浇混凝土项目按提升高度不同将全桥划分为若干段,以超高段承台顶面以上混凝 上(不含泵送混凝土)、模板、钢筋的工程量,按表 7-1 调整相应定额中起重机械的规格,人 工、起重机台班的消耗量应分段调整。
- ② 陆上安装梁可按表 7-1 调整相应定领中的人工及起重机械台班的消耗量,但起重机械的规格不做调整。

		现浇混凝土	-75T.	—————————————————————————————————————	<b>b</b> 装梁
( # - II -	人工	5t 履带:	式电动起量机	江	起重机械
提升高度 H/m	酒耗量系数	消耗量系数	规格调整为	消耗量系数	消耗屈系数
<i>H</i> ≤15	1.02	1.02/	151 履带式起重机	1.10	1.10
<i>H</i> ≤22	1.05	1.05	25t 履带式起重机	1.25	1.25
H>22	1 10	11/10	400 履带式起棄机	1.50	1.50

表 7-1 现浇混凝土、陆上安装梁的人工及起重机消耗量调整表

【例 7-1】 某工程在陆上采用起重机安装 T 形梁、梁长 25m, 已知提升高度为 10m、确定套用的定额子目及基价。

【解】套用定额子目: [3-448]H

提升高度  $\leq 15m$ , 查表可知: 人工乘以系数 1.10, 起重机械乘以系数 1.10 基份  $\geq 957+52.89 \times (1.10-1) + 904.33 \times (1.10-1) \approx 1.053 (元/10 m^3)$ 

【例7-2】 某桥梁工程现浇桥墩盖梁,采用 C20(40)现浇现拌混凝土,已知提升高度为 16m、试确定现浇桥墩盖梁混凝土、模板套用的定额子目及基价。

【解】提升高度 < 22m, 查表可知: 人工消耗量乘系数 1.05、起重机械规格调整为 25t 履带式起重机、消耗量乘系数 1.05

5t 履带式起重机合班单价为 144.71 元/台班

25t 履带式起重机台班单价为 646.24 元/台班

(1) 墩盖梁混凝土:

套用定额子目: [3-246]H

基价=2 863+574.48×(1.05-1)+(0.77×1.05×646.24-0.77×144.71)


 $\approx 3~303(元/10 \text{m}^3)$ 

(2) 墩盖梁混凝上模板

套用定额子目: [3-248]H

基价 439+215.00×(1.05 1)+(0.57×1.05×646.24 0.57×144.71)

≈ 754(元/10m³)



打桩 C程包括打基础圆木桩、打钢筋混凝土方桩、打钢筋混凝土板桩、打钢筋混凝土板桩、打钢筋混凝土管桩、打钢管桩、接桩、送桩及钢管桩内切割、精割盖帽、管内钻孔取土、 填心等相关子目。

# 7.2.1 工程量计算规则

- 1. 打桩
- (1) 钢筋混凝土方桩、板桩按桩长(包括桩尖长度)乘以桩横断面面积计算。
- (2) 钢筋混凝土管桩按桩长(包括桩尖长度)乘以桩横断面面积,减去空心部分体积计算。



(3) 钢管桩按成品桩考虑,按设计长度(设计桩质至桩底标高)、管径、壁厚以 t【参考图文 为单位计算。

# 知识链接

钢管桩质量计算公式如下。

$$\omega = (D - \delta) \times \delta \times 0.024 \, 6 \times L / 1000 \tag{7-1}$$

式中 a - 钢管桩质量, t;

D --- 钢管桩直径, mm;

δ —— 钢管桩壁厚, mm:

L---钢管桩长度, m.

### 2. 焊接桩

焊接桩型钢用量可按实际调整。

# 3. 送桩

- (1) 陆上打桩时,以原地面平均标高增加 1m 为界线,界线以下至设计桩顶标高 之间的打桩实体积为送桩工程量。
- (2) 支架上打桩时,以当地施工期间的最高潮水位增加 0.5m 为界线,界线以下 至设计桩顶标高之间的打桩实体积为送桩工程量。
- (3) 船上打桩时,以当地施工期间的平均水位增加 1m 为界线,界线以下至设计桩顶标高之间的打桩实体积为送桩工程量。
- 【例 7-3】 某桥台基础共设 20 根 C30 预制钢筋混凝土方桩, 如图 7.1 所示, 自 然地坪标高为 0.5m, 桩顶标高为 0.3m, 设计桩长 18m(包括桩尖), 每根桩分 2 节预



制, 陆上打桩, 采用焊接接桩, 计算打桩、接桩与送桩的 工程量, 并确定套用的定额子目及基价。

- 【解】(1) 打桩: V=0.4×0.4×18×20=57.6(m3)
- 套用定额[3-16] 基价=1 607 元/10m3
- (2) 接桩: n=20(个)
- 奎用定额[3-55] 基价=252 元/个
- (3) 送桩:
- $V=0.4\times0.4\times(0.5+1+0.3)\times20=5.76$ (m<sup>3</sup>)
- 套用定额[3-74] 基价=4 758 元/10m3
- 4. 钢管桩内切割
- 工程量按钢管内切割的根数计算。
- 5. 钢管桩精割羔帽

工程量按精割、安放及焊接盖帽的数量以个为单位 图7.1 钢筋混凝土方桩(单位: m) 计等。

- 6. 钢管桩管内钻孔取土
  - 工程量按钻孔取上的体积以 m3 为单位计算。
- 7. 钢管桩填心
- 工程量按钢管桩内混凝土填芯的体积以 m3 为单位计算。

# 7.2.2 定额套用及换算说明

- (1) 定额中土质类别均按甲级土考虑。
- (2) 本章定额均考虑在已搭置的支架平台上操作,但不包括支架平台,其支架平台的 搭设与拆除应按《桥涵 [程》第9章的有关项目计算。
- (3) 陆上打桩采用履带式柴油打桩机时,不计陆上工作平台费,可计 20m 碎石垫层,面积按陆上工作平台面积计算。
  - (4) 船上打桩定额按两艘船只拼搭、捆绑考虑。
  - (5) 打钢筋混凝土板桩定额中, 均已包括打、拔导向桩内容, 不得重复计算。
  - (6) 陆上、支架上、船上打桩定额中均未包括运桩。
  - (7) 打桩机械的安拆、场外运输费用按机械台班费用定额有关规定计算。
  - (8) 如设计要求需凿除桩顶时,可食用《桥涵工程》第9章"临时工程"的有关子目。
- (9)如打基础圆木桩采用挖掘机时,可套用《通用项目》相应定额,圆木桩含量做相应调整。
  (10)本章定额均为打直桩,如打斜桩(包括俯打、仰打)斜率在1:6以内时,人工乘以
- 系数 1.33, 机械乘以系数 1.43。
  - (11) 送桩定额按送 4m 为界,如果实际超过 4m 时,按相应定额乘以下列调整系数:
  - ① 送桩 5m 以内乘以系数 1.2:
  - ② 送桩 6m 以内乘以系数 1.5:

- ③ 送桩 7m 以内乘以系数 2.0:
- ④ 送桩 7m 以上, 以调整后 7m 为基础、每超过 1m 递增系数 0.75。
- (12) 打钢管桩定额中不包括接桩费用,如果发生接桩,接实际接头数量套用钢管桩接桩定额。
  - (13) 打钢管桩送桩, 按打桩定额人 [、机械数量乘以系数 1.9 计算。
- 【例 7-4】 某工程在支架上打钢筋混凝土板桩、斜桩、桩截面面积为 0.09m², 桩长为 10m(包括桩尖), 共计 12 根桩。施工期间最高潮水位标高为 1.5m, 设计桩项标高为 3.5m, 计算该工程打桩、误桩的工程量、并确定套用的定额子目及基价。
  - 【解】(1) 打桩工程量=0.09×10×12=10.8(m3)

套用定额[3-28]H

基价=1 108+309.6×(1.33-1)+728.86×(1.43-1)=1 524(元/10m3)

(2) 送桩工程量=(1.5+0.5+3.5)×0.09×12=5.94(m3)

套用定额[3-69]H

基价=2.916 元/10m3

【例7-5】 某工程在支架上打钢管桩, 桩径为 609.60, 桩长为 36m, 施工期间最高潮水位标高为 1m, 设计桩顶标高为-2m, 确定该工程送桩套用的定额子目及基价。

【解】套用定额[3-49]H

基价=1 862+435.16×(1.9-1)+1 303.89×(1.9-1)=3 427(元/10t)

# 7.3 钻孔灌注桩工程

钻孔灌注杜工程包括埋设护筒、人工挖孔桩、回旋钻机钻孔、冲孔桩机带冲抓锥成孔、 冲孔桩机带冲击锥成孔、泥浆池建造和拆除、泥浆运输、钻孔桩灌注混凝土等相应子目。

# 7.3.1 工程量计算规则

- 1. 埋设钢护筒
- 工程量按埋设钢护筒的长度以 m 为单位计算。
- 2. 成孔/冲孔/挖孔
- (1) 回旋钻机钻孔成孔 L程量按成孔长度乘以设计桩截面积以 m3 为单位计算。

陆上时,成孔长度为原地面至设计桩底的长度;水上时,成孔长度为水平面至设计桩底的长度减去水深。

入岩增加费工程量按实际入岩量以  $m^3$ 为单位计算,即按实际入岩长度×设计桩截面积计算。

(2) 冲孔桩机带冲抓(击)锥冲孔工程量按进入各类上层、岩石层的成孔长度乘以设计桩截面积以 $\mathbf{m}^3$ 计算。





(3) 人工挖桩孔及安装混凝土护壁。

① 人工挖桩孔。

人工挖桩孔工程量按护键外围截面积乘以孔深以 m3 为单位计算。 孔深按自然地採至设计桩底标高的长度计算。

挖淤泥、流砂、入岩增加费工程量按实际挖、凿数量以 m3 为单位计算。

② 安装混凝上护壁。

工程量按护壁混凝土的体积以 m3 为单位计算。



# 知识链接

人工挖孔桩的底部一般要求扩孔,底部一般为球冠体,如图 7.2 所示。




图 7.2 球冠示意图

球冠体的体积计算公式为

$$V = \pi h^2 \left( R - \frac{h}{3} \right) \tag{7-2}$$

由于施工图中一般标注r值、h值,R值需要

Cto 
$$r^2 \neq R^2 - (R-h)$$

可得:。

$$R = \frac{r^{\nu} + h^2}{2h} \tag{7-3}$$

【例 7-6】 某人工挖孔桩剖面图如图 7.3 所示, 计算挖孔桩土方工程量, 并确定 套用的定额子目及基价。

【解】人工挖孔桩土方按护壁外围截面积乘以孔深以 m3 为单位计算。

① 首桩部分:

$$V = \pi r^2 \times h = 3.14 \times \left(\frac{0.8 + 0.075 \times 2 + 0.1 \times 2}{2}\right)^2 \times 10.90$$

 $\approx 11.32 (m^3)$ ② 圆台部分:

$$V = \frac{\pi}{2} h \times (r_1^2 + r_2^2 + r_1 r_2)$$

$$= \frac{3.14}{3} \times 1.0 \times \left[ \left( \frac{0.8}{2} \right)^2 + \left( \frac{1.2}{2} \right)^2 + \frac{0.8}{2} \times \frac{1.2}{2} \right]$$

 $\approx 1.047 \times (0.16 + 0.36 + 0.24) \approx 0.80 \text{ (m}^3)$ 



图 7.3 人工挖孔桩剖面示意图(单位: mm)

③ 球冠部分:

$$R = \frac{{{{\left( {\frac{{1.2}}{2.2}} \right)}^2} + 0.2^2}}{{2 \times 0.2}}{ = 1.0(m)}$$

$$V = 3.14 \times 0.2^2 \times {{\left( {1.0 - \frac{{0.2}}{3}} \right)} = 0.12(m^3)}$$

合计人工挖孔桩土方工程量=11.32+0.8+0.12

 $=12.24(m^3)$ 

套用的定额子目[3-118]H 基价=771+14.2×(1.15-1)×43.00+0.82×(1.15-1)×45.93 =868(元/10m³)

3. 泥浆池建造和拆除、泥浆运输

工程量按成孔/冲孔工程量以 m3 为单位计算。

### 4. 混凝十灌注

钻孔灌注桩混凝土工程量按桩长乘以设计桩截面积计算。

桩长=设计桩长+设计加灌长度。

设计未规定加灌长度时,加灌长度按不同的设计桩长确定; 25m 以内按 0.5m 计算, 35m 以内按 0.8m 计算, 35m 以上按 1.2m 计算。

# 特别提示

钻孔桩灌注混凝土定额均已包括混凝土灌注充盈量, 计算混凝土灌注工程量时不需要 考虑扩孔系数。

### 5. 钻孔灌注桩钢筋笼

钻孔灌注机钢筋笼工程量按设计图纸计算质量, 食用第4章《钢筋工程》有关项目。

# 6. 钻孔灌注桩预埋铁件、声测管

钻孔灌注桩预埋铁件、声测管工程量按其质量计算, 衰用第 4 章《钢筋工程》有关项目。

### 7. 桩孔回填

桩孔回填上工程量按加灌长度顶面至自然地坪的长度乘以桩孔截面积以m³为单位计算。

## 8. 支架平台

钻孔灌注桩如需搭设工作平台,按第9章《临时工程》有关项目计算。

### 9. 凿除桩顶混凝土

钻孔灌注桩如需凿除桩顶混凝土、按第9章《临时工程》有关项目计算。

# 7.3.2 定额套用及换算说明

- (1) 本意定额活用于桥涵工程钻孔灌注桩基础工程。
- (2) 本章定额中涉及的各类土(岩石)层鉴别标准如下。
- ① 砂、黏土层: 粒径 2~20mm 的颗粒质量不超过总质量 50%的土层,包括黏土、粉 质黏土、粉土、粉砂、细砂、中砂、粗砂、砾砂。
- ② 碎、卵石层: 粒径在 2~20mm 的颗粒质量超过总质量 50%的上层,包括角砾、圆砾及粒径 20~200mm 的碎石、卵石、块石、漂石,此外也包括软石及强风化岩。
  - ③ 岩石层:除软石及强风化岩以外的各类坚石,包括次坚石、普坚石和特坚石。

- (3) 定额中未包括钻机场外运输、截除余桩、废泥浆处理及外运,其费用可食用相应 定额和说明另行计算。
  - (4) 定额中不包括在钻孔中遇到障碍必须清除的工作,发生时另行计算。
- (5) 埋设钢护筒定额中钢护筒按摊销量计算。若在深水作业,钢护筒无法拔出时,可 按钢护筒实际用量(或参考表 7-2 中质量)减去定额数量一次增列计算。

表 7-2 钢护筒定额每米质量表

桩径/mm	600	800	1 000	1 200	1 500	2 000
每米护筒质量 /(kg/m)	120.28	155.37	184.96	286.06	345.09	554.99

- (6) 回旋钻机成孔定额按桩径划分子目,定额已综合考虑了穿越砂(黏)土层和碎(卵)石层的因素。如设计要求进入岩石层时,套用相应定额计算入岩增加费。
  - (7) 冲孔桩机带冲抓(击)锥成孔冲孔定额按桩长及不同上(岩石)层划分子目。
- (8) 人工挖孔桩挖孔按设计注明的桩芯直径、孔深套用定额; 桩孔上方需要外运时, 按土方工程相应定额计算; 挖孔时若遇到淤泥、流砂、岩石层,可按实际挖、凿的工程量 套用相应定额计算挖孔增加费。
- (9) 套用回旋钻机钻孔、冲孔桩机带冲抓锥成孔、冲孔桩机带冲击锥成孔定额时,若 工程量小于 150m³, 打桩定额的人工及机械乘以系数 1.25。
  - (10) 回旋钻机钻孔,水上钻孔时,定额人工和机械乘以系数 1.2。
  - 【例 7-7】 回旋钻机水上钻孔、桩径 1 000mm、确定套用定额子目及基价。
  - 【解】套用定额[3-128][1
    - 基价=1 405+442.04×(1.2-1)+814.84×(1.2-1) ≈ 1 656(元/10m³)
- (11)冲孔桩机带冲抓锥成孔定额采用湿成孔工艺,如采用干成孔工艺施工,则扣除定额中的黏土、水料料费及泥浆泵机械费。
- (12) 桩孔空钻部分回填根据施工组织设计要求套用相应定额。填上套用《通用项目》 上石方工程的松填土定额,填碎石者套用《桥涵工程》第5章碎石垫层定额乘以系数0.7。
- 【例7-8】某桥梁基础设计采用直径1000mm 钻孔灌注桩 8 根, 钻孔桩剖面示意如图 7.4 所示:自然地坪标高为-0.5m,设计桩项标高为-2.0m,设计桩底标高为-22m,入岩深度为2m,施工时采用回旋钻机钻孔、陆上作业,钢护筒长度为 1.5m,灌注 C25 非泵送水下商品混凝土,桩孔用土回填。计算埋设钢护筒、成孔、混凝上灌注、入岩、泥浆池建拆、泥浆运输(运距 6km)、桩孔回填的工程量,并确定套用的定额于目及基价。
  - 【解】(1) 埋设钢护筒: L=1.5×8=12(m)

套用定额[3-107] 基价=1 083 元/10m

(2) 成乳:  $V=1/4\times\pi\times1.0^2\times(-0.5+22)\times8\approx135.02$ (m³)

套用定额[3 128]H

基价=1 405+442.04×(1.25 1)+814.84×(1.25-1)  $\approx$  1 719(元/10m<sup>3</sup>)




图 7.4 钻孔灌注桩剖面示意图(单位: m)

- (3) 入岩: V=1/4×π×1.0<sup>2</sup>×2×8 ≈ 12.56(m<sup>3</sup>)
- 套用定额[3-133] 基价=5 077 元/10m3
- (4) 灌注混凝土: V=1/4×π×1.0<sup>2</sup>×(-2+22∓0.5)×8≈141.30(m<sup>3</sup>) 套用定额[3-150] 基价=4 244 元/10m<sup>3</sup>
- (5) 泥浆油建拆: V=135.02m3
- 套用定额[3-144]

基价=35 元/10m3

(6) 泥浆外运: V=135.02m³

套用定额[3-145]+[3-146] 基价=631+35=666(元/10m³)

- (7) 桩孔回填: V=1/4×π×1.0²×(-0.5+2-0.5)×8≈6.28(m³)
- 套用定额[1-39]

基价=243 元/100m3

# 7.4 砌筑工程

砌筑 L 程定额包括浆砌块石、浆砌料石、浆砌混凝 L 预制块、砖砌体、拱圈底模等相应 f 目。

# 7.4.1 工程量计算规则

- (1) 砌筑工程量按设计砌体尺寸以 m³ 为单位计算, 嵌入砌体中的钢管、沉降缝、伸缩缝以及单孔面积在 0.3m² 以内的预留孔所占体积不予扣除。
  - (2) 拱圈底模工程量按模板接触砌体的面积计算。

# 7.4.2 定额套用及换算说明

- (1)本章定额适用于砌筑高度在8m以内的桥涵砌筑工程。本章定额未列的砌筑项目,可按第一册《通用项目》的相应定额执行。
- (2) 本章定额中未包括垫层、拱背和台背的填充项目,如发生上述项目,可套用 有关定额。
- (3) 拱圈底模定额中不包括拱盔和支架,可按第9章《临时工程》的相应定额 执行。

# 知识链接

拱盔就是拱桥现浇或砌筑所需要的起拱线以上的拉梁、柱、斜撑、夹木、托木、 拱弦木及模板组合的支架。修拱桥的拱架包括支架和拱盔两部分, 支架在下, 拱盔 在上。



- (4) 定额中调制砂浆,均按砂浆拌和机拌和。
- (5) 于砌块石、勾缝套用第一册《通用项目》的相应定额。
- 【例 7-9】 某 M10 水泥砂浆砌筑混凝土预制块墩台, 试套用定额。
- 【解】 套斯定额子目[3-162]H

M7.5 砂浆单价=168.17 元/ $m^3$ 、M10 砂浆单价=174.77 元/ $m^3$ 换算后基价=3 386+(174.77=168.17)×0.92  $\approx$  3 392(元/10 $m^3$ )

# 7.5 钢筋及钢结构工程

钢筋 L程定额包括桥插 L程钢筋制作安装、铁件、拉杆制作安装、预应力钢筋 制作安装、安装压浆管道和压浆、卢测管制作安装、钢梁制作安装等相应 子目。

# 7.5.1 工程量计算规则

- (1) 钢筋按设计数量以 t 为单位计算(损耗量已包括在定额中)。
- (2) 预埋铁件、拉杆按设计数量以 t 为单位计算。



- (3) T 形梁连接钢板项目按设计图纸,以 t 为单位计算。
- (4) 锚具工程量设计用量计算(定额中未列锚具数量)。
- (5) 管道压浆按压浆体积以 m3 计算, 不扣除钢筋体积。
- (6) 安装压浆管道按压浆孔道长度以 m 计算。
- (7) 声测管按设计图纸质量以 t 为单位计算。
- (8) 钢梁工程量按设计图纸主材(钢板、型钢、方钢、圆钢等)的质量以 t 为单位 计算,不扣除孔眼、缺角、切肢、切边的质量,但焊条、铆钉、螺栓等的质量也不 另增加。

不规则或多边形钢板以其面积乘以厚度及单位理论质量以 t 为单位计算。

# 知识链接

1. 钢筋质量计算

2. 钢板单位理论质量计算

钢筋质量=0.006 17×d2×1

(7-4)

式中: d 为钢筋直径, mm; l 为钢筋长度, m; 钢筋质量单位为 kg。





钢板单位理论质量=7.85×厚度

(7-5)

(7-8)

式中:厚度单位为 mm;钢板单位理论质量单位为 kg/m²。

如 1.5mm 厚钢板单位理论质量=7.85×1.5=11.775(kg/m²)

- 3. 其他金属材料单位理论质量可查五金手册。
- 4. 钢筋长度计算

钢筋搭接长度、扣除保护层厚度按设计图示尺寸计算,设计图纸中未注明时,可按以下计算。

(1) 直钢筋、带弯钩钢筋、弯起筋计算,如图 7.5 所示。

单个半圆弯钩长度 6.25d



### 图 7.5 钢筋示意图

 $L_0 = L - 2 \times b + n_1 \times 35d \tag{7-7}$ 

② 带弯钩钢筋长度 构件长度 保护层厚度+弯钩长度+搭接长度

 $L_0 = L - 2 \times b + 2 \times 6.25 d + n_1 \times 35 d$  (7-9)

\_\_单个直弯钩长度 3d

 $L_0 = L \ 2 \times b + 2 \times 3d + n_1 \times 35d$  (7-10)

# \_\_单个斜弯钩长度=4.9d

$$L_0 = L - 2 \times b + 2 \times 4.9d + n_1 \times 35d$$
 (7-11)

(3) 賣起筋长度 Lo'= Lo+0.4×no×H (7-12)

式中 Lo、Lo'--钢筋长度:

L---构件长;

d---钢筋 直径:

n.——搭接个数(单根钢筋长度超过 8m 时、计算一个因超出定尺长度引起的搭接):

m 弯起筋弯起个数:

H---梁高或板厚。

(3) 箍筋计算




图 7.6 雜肪示意图

式中 B-梁寅或板實:

H---梁高或板厚。

③ 螺旋箍筋长度(图 7.7)=
$$\frac{H}{h} \times \sqrt{\left[\pi(D-2b+d)\right]^2 + h^2}$$
 (7-17)

式中 H---螺旋箍筋高度(深度);

D----桩直径:

-保护层厚度.




图 7.7 螺旋箍筋示意图



【例 7-10】 某額篩混凝土預制板长 3.85m, 宽 0.65m, 厚 0.1m, 保护层厚为 2.5cm, 如图 7.8 所示, 计算钢筋工程量。

【解】 
$$\phi$$
12 钶筋质量(3.85 0.025×2+6.25×0.012×2)× $\left(\frac{0.65-0.025\times2}{0.2}+1\right)$ ×0.006 17×12<sup>2</sup>

≈ 3.95×4×0.888 ≈ 14.03(kg)  

$$\phi$$
 8 領筋质量=(0.65-0.025×2)× $\left(\frac{3.85-0.025\times2}{0.2}+1\right)$ ×0.006 17×8<sup>2</sup>  
≈ 0.6×20×0.395 ≈ 4.74(kg)

合计钢筋质量=14.03+4.74=18.77(kg)




图 7.8 钢筋混凝土预制板块图



后张预应力构件不能套用标准图集计算时, 预应力钢筋接设计构件尺寸, 区别不同的 锚周举型, 按以下规定计算

- (1) 低合金钢筋两端均采用螺杆锚具时,钢筋长度挟孔道长度减 0.35m 计算,螺杆另行计算。
- (2) 低合金钢筋一端采用墩头插片、另一端采用螺杆锚具时、钢筋长度按孔道长度计算、螺杆另行计算。
- (3) 低合金钢筋一端采用墩头插片、另一端采用帮条锚具时、钢筋长度按孔道长度加 0.15m 计算: 两端均采用帮条锚具时、钢筋长度按孔道长度加 0.3m 计算。
  - (4) 低合金钢筋采用后张混凝土自锚时、钢筋长度按孔道长度加 0.35m 计算。
- (5) 低合金铜筋(钢绞线)采用 JM、XM、QM型锚具, 孔道长度在 20m以内时, 钢筋(钢 绞线)长度按孔道长度加 lm 计算; 孔道长度在 20m以上时, 钢筋(钢绞线)长度按孔道长度 加 l.8m 计算。
- (6) 碳素钢丝采用锥形锚具、孔道长度在 20m 以内时、钢丝束长度按孔道长度加 1m 计算: 孔道长度在 20m 以上时、钢丝束长度按孔道长度加 1.8m 计算。

# 7.5.2 定额套用及换算说明

(1) 定额中钢筋按圆钢及螺纹钢两种分列,圆钢采用 HPB300, 螺纹钢采用 HRB335, 钢板均按 A3 钢计列,预应力筋采用IV级钢、钢铰线和高强钢丝。因设计要求采用钢材与定额不符时,可以调整。

- (2) 因束道长度不等, 故定额中未列锚具数量, 但已包括锚具安装的人工费。
- (3) 压浆管道定额中的钢管、波纹管均已包括套管及二通管安装费用,但未包括 三通管费用,可另行计算。
  - (4) 定额中钢铰线按 ø 15.24mm 考虑。
- (5) 预埋钢板套用预埋铁件定额,其中钢板、型钢、圆钢综合按实际材质及用量 换算,其余不变。
  - (6) 卢测管按无缝钢管编制,具体尺寸及数量应按设计图纸确定。
- (7) 钢梁定额中已包括构件的场内外运输,钢梁的钢材及焊条品种与定额不同时,可以调整换算。
- (8) 钢梁仅考虑涂刷防锈底漆,面漆根据图纸设计要求套用相应定额,定额未包括钢梁焊缝的无损探伤费用,发生时另行计算。
- (9) 钻孔桩钢筋笼的圆钢综合、螺纹钢综合的含量如与定额含量不同时,按实调整。
- 【例 7-11】 某桥梁钻孔桩钢筋笼总质量为 94 123.2kg, 其中螺纹钢质量为 83 808kg, 圆钢质量为 10 315.2kg, 确定钻孔桩钢筋签套用的定颚子目及基价。

# 【解】套用定额[3-179] H

[3-197]子目中圆钢占的比例: 0.17/(0.17+0.85)=16.67%

螺纹钢占的比例: 0.85/(0.17+0.85)=83.33%

本例中圆钢占的比例: 10 315.2/94 123.2 10.96%

螺纹钢占的比例: 83 808/94 123.2=89.04%

本例圆钢、螺纹钢的含量与定额不一致,需按比例调整圆钢、螺纹钢的消耗量。

调整后圆钢的消耗量=1×10.96%×(1+2%)=0.112(t)

螺纹钢的消耗量-1×89.04%×(1+2%)=0.908(t)

基价=4 676+(0.112-0.170)×3 850+(0.908-0.850)×3 780

≈ 4 672(元/t)

# 7.6 现浇混凝土工程

现浇混凝土工程定额包括桥涵工程现浇基础、承台、支撑梁及横梁、墩台身、 拱桥、箱梁、板、板梁、板拱、挡墙、混凝土接头及灌缝、小型构件、桥面防水层、 桥面铺装及桥头搭板等相应子目。



【参考图文

# 7.6.1 工程量计算规则

(1) 混凝土工程量按设计尺寸以实体积计算,不包括空心板、梁的空心体积,不

扣除钢筋、钢丝、铁件、预留压浆孔道和螺栓所占的体积。

- (2) 模板工程量按模板接触混凝土的面积计算。
- (3) 现绕混凝土墙、板上单孔面积在 0.3m²以内的孔洞体积不予以扣除,洞侧壁模板面积亦不再计算;单孔面积在 0.3m²以上时,应扣除孔洞体积,洞侧壁模板面积并入墙、板模板工程量之内计算。

# 知识链接

桥梁采用 U 形桥台者较多。一般情况是桥台外侧都是垂直面,而内侧侧向放坡。台帽则呈 L 形,如图 7.9 所示。桥头体积可按一个长方体体积减去中间空的一块接头方锥体体积、再减去台帽处长方体的体积计算。

长方体体积: V<sub>1</sub>=ABH (7-18)

截头方锥体体积: 
$$V_2 = \frac{H}{3} \left[ a_1 b_1 + a_2 b_2 + \sqrt{a_1 b_1 \times a_2 b_2} \right]$$
 (7-19)

台帽处长方体体积:  $V_3 = Ab_3h_1$  (7-20)




图 7.9 U 形桥台体积计算图

# 7.6.2 定额套用及换算说明

- (1) 本章定额适用于桥涵工程现浇各种混凝土构筑物。
- (2) 板与板梁的划分以跨径 8m 为界, 跨径≤8m 的为板, 跨径>8m 的为板梁。
- (3) 现浇混凝土工程定额中均未包括预埋铁件,如设计要求预埋铁件时,可按设计用量套用《钢筋工程》的有关项目。
  - (4) 定额中混凝土按常用强度等级列出,如设计要求不同时可以换算。

【例 7-12】 非泵送 C20(20)商品混凝土现浇轻型桥台, 试确定混凝土套用的定额子目及基价。

【解】 套用定额子目: [3-226]H

# 特别提示

[3 226]定额取定为 C20 泵送商品混凝土,实际采用非泵送商品混凝土,混凝土单价需换算,定额人工乘以 1.35,并增加相应普通混凝土定额于目中垂直运输机械的含量。

非泵送商品混凝土 C20 单价为 285.00 元/10m3

泵送商品混凝土 C20 单价为 299.00 元/10m3

[3-225]子目中垂直运输机械(5t 履带式电动起重机)的含量为 1,060 台班

基价=3 235+(285-299)×10.150+181.03×(1.35-1)+1.060×144.71

 $\approx 3.310(\bar{\pi}/10\text{m}^3)$ 

(5) 定额中混凝土运输均采用 lt 机动翻斗车,并已包括了 150m 水平运输距离。

# 特别提示

现浇现拌混凝土实际运距超过 150m 时、按超出部分套用《通用项目》场内运输混凝土 整料的每增予目。

【例 7-13】 某桥梁承台采用观溃现拌 C25(40)水泥混凝土,采用机动翻斗车运输,运距为 250m,确定承台混凝土浇筑及混凝土场内运输套用的定额子目及基价。

【解】① 承台混凝土浇筑

套用定额: [3-215]H

C20(40)现浇现拌混凝土单价为 192.94 元/m

C25(40)现浇现拌混凝土单价为 207.37 元/m3

基价=2 704+(207.37-192.94)×10.150 ≈ 2 850(元/10m3)

② 混凝土场内运输

超运距: 250-150=100(m)

套用定额: [1-320]

基价=18 元/10m3

(6) 定额中嵌石混凝土的块石含量按 15%考虑,如与设计不同时,块石和混凝上消耗量应按表 7-3 换算,人工、机械不变。

表 7-3 嵌石混凝土块石、混凝土消耗量调整表

块石掺嚴/%	10	15	20	25
毎立方米块石掺量/(	0.254	0.381	0.610	0.635

注: ① 块石掺量另加损耗率 2%。

② 混凝土用量扣除嵌石百分数后,乘以损耗率 1.5%。

【例 7-14】 某桥梁工程采用规浇规拌 C15(40)毛石混凝土基础, 块石掺量为 20%, 确定套用的定额子目及基价。



【解】套用定额子目: [3 210]H

需按表 7-3 调整块石和混凝土的消耗量, 计算如下:

调整后块石消耗量=10×0.610×(1+2%)=6.222(t)

调整后混凝土消耗量=10×(1 20%)×(1+1.5%)=8.120(m3)

基价=2 337+(6.222-3.886)×40.50+(8.120-8.630)×183.25

≈ 2 338(元/10m³)

- (7) 定额中防撞护栏采用定型钢模, 其他模板均按 [ 具式钢模、木模综合取定。
- (8) 承台模板分有底模和无底模两种, 应视不同的施工方法套用相应定额。

有底模承台指承台脱离地面,需铺设底模施工的承台; 无底模承台指承台直接依附在 地面或基础上,不需要铺设底模的。

【例7-15】 某桥梁工程 C30 现浇钢筋混凝土承台,无底模。试确定承台混凝土、模板 套用的定额子目及基价。

【解】① 承台混凝土

套用定额子目: [3-215]H

C20(40)混凝土单价为 192.94 元/m3

C30(40)混凝土单价为 216.47 元/m3

基价=2 704+(216.47-192.94)×10.150≈ 2 943(元/10m3)

② 承台混凝土模板

**李用定额子目:[3-217]** 

基价=245 元/10m2

- (9) 现浇箱梁内模无法拆除时,按无法拆除的模板工程量每 10m<sup>2</sup>增加板方材 0.3m<sup>3</sup>。
- (10) 现浇梁、板等模板定额中未包括支架部分,实际发生时套用《临时工程》的有关 手目。
  - (11) 沥青混凝土桥面铺装套用第二册《道路工程》的相应定额。
- (12) 定额中混凝土及模板的垂直运输选用 5t 电动履带式吊车,提升高度超过 8m 时,按册说明有关规定计算。

# 7.7 预制混凝土工程

预制混凝上工程定额包括桥插工程预制桩、立柱、板、梁、双曲拱构件、桁架拱构件、 小型构件、板拱、先张法构件出槽堆放、预制构件场内运输等相应 f H。

# 7.7.1 工程量计算规则

- 1. 混凝土工程量计算
- (1) 预制桩工程量按桩长度(包括桩尖长度)乘以桩横断面面积计算。

- (2) 预制空心构件按设计图尺寸扣除空心体积,以实体积计算。
- 空心板梁的堵头板体积不计入工程量内,其消耗量已在定额中考虑。
- (3) 预制空心板梁,凡采用橡胶囊做内模的,考虑其压缩变形因素,可增加混凝 上数量。当梁长在 16m 以内时,可按设计计算体积增加 7%; 若梁长大于 16m,则 增加 9%计算。如设计图已注明考虑橡胶囊变形时,不得再增加计算。如采用钢模时, 不考虑内模压缩变形因素。



- (4) 预应力混凝土构件的封锚混凝土数量并入构件混凝土工程量计算。
- 2. 模板工程量计算
- (1) 预制构件中预应力混凝土构件及T形梁、1形梁、双曲拱、桁架拱等构件按 模板接触混凝土的面积(包括侧模、底模)计算。
  - (2) 灯柱、端柱、栏杆等小型构件按平面投影面积计算。
  - (3) 预制构件中非预应力构件按模板接触混凝土的面积计算,不包括胎模、地模。



胎模: 用砖或混凝土等材料筑成物件外形的模板。

地模:用砖或混凝土在表面用水泥砂浆抹平做成的底模。

- (4)空心板梁中空心部分,如定额采用橡胶囊抽拔,其摊销量已包括在定额中, 不再计算空心部分模板工程量。如采用钢模板时,模板的工程量按其与混凝土的接 轴面积计算。
  - (5) 空心板中空心部分,可按模板接触混凝土的面积计算工程量。
  - 3. 先张法构件出槽堆放

[程量按构件混凝土体积计算。

4. 预制构件场内运输

工程量按构件混凝上体积计算。

#### 7.7.2 定额套用及换算说明

- (1) 本章定额适用于桥涵工程现场制作的预制构件。
- (2) 定额不包括地模、胎模费用,需要时可按《桥涵工程》"临时工程"有关子目计算。
- (3) 定额中均未包括预埋铁件,如设计要求预埋铁件时,可按设计用量套用《桥涵工程》"钢筋工程"的有关子目。
- (4) 预制构件场内的运输定额适用于陆上运输,构件场外运输则参照浙江省建筑 工程预算定额执行。



# 7.8 立交箱涵工程

立交籍涵工程定额包括透水管铺设、箱涵制作、箱涵外壁及滑板面处理、气垫安装、 拆除及使用、箱涵项进、箱涵内挖上、箱涵接缝处理、金属项柱、护套及支架制作等相应 子目。

#### 7.8.1 工程量计算规则

- (1) 透水管铺设工程量按透水管长度计算。
- (2) 箱涵制作。
- ① 混凝上工程量按混凝上体积计算,不扣除单孔面积 0.3m³以下的预留孔洞所占体积。 籍涵滑板下的肋楞, 其工程量升入滑板内计算。
  - ② 模板工程量按模板接触混凝土的面积计算。
  - (3) 箱添外壁及滑板面处理按处理的面积计算。
  - (4) 气热安装、拆除及使用。
  - ① 气垫只考虑在预制箱涵底板上使用,气垫安装、拆除工程量按箱涵底面积计算。
  - ② 气垫的使用工程量按其面积乘以使用天数计算。

气垫的使用天数由施工组织设计确定,但采用气垫后再套用顶进定额时应乘以系数 0.7。

(5) 箱涵顶进。

定额分空顶、无中继间实土顶和有中继间实土顶3类。其工程量计算如下。

- ① 空顶工程量按空顶的单节箱涵质量乘以箱涵位移距离计算。
- ② 实上劢工程量按被顶箱涵的质量乘以箱涵位移距离分段累计计算。
- (6) 箱涵内挖土。

箱涵顶进土方按设计图示结构外围尺寸乘以箱涵长度以 m3 为单位计算。

- (7) 箱涵接缝处理。
- ① 石棉水泥嵌缝、嵌防水膏工程量按嵌缝长度计算。
- ② 沥青 1度、沥青封口、嵌沥青木丝板按嵌缝断面面积计算。
- (8) 金属顶柱、护套及支架制作。
- ① 金属顶柱、护套及支架制作工程量按金属构件质量计算。
- ② 顶柱、中继间护套及挖上支架均属专用周转性金属构件,定额中已按摊销量计算,不得重复计算。

#### 7.8.2 定额套用及换算说明

(1) 本章定额适用于穿越城市道路及铁路的立交箱涵顶进工程及现浇箱涵工程。

- (2) 顶进上质按Ⅰ、Ⅱ类上考虑, 若实际上质与定额不同时, 可进行调整。
- (3) 定额中未包括箱涵顶进的后靠背设施等, 其发生费用可另行计算。
- (4) 定额中未包括深基坑开挖、支撑及排水的工作内容, 如发生可套用有关的定额计算。
- (5) 立交桥引道的结构及路面铺筑工程,根据施工方法套用有关的定额计算。

# 7.9 安装工程

安装工程定额包括安装排架立柱,安装柱式墩台管节,安装矩形板、空心板、微弯板, 安装梁,安装双曲拱构件,安装桁架拱构件,安装拱板,安装小型构件,钢管栏杆及扶手 安装,安装支座,安装泄水孔,安装伸缩缝,安装沉降缝等相应 f 目。

#### 7.9.1 工程量计算规则

- (1) 安装立柱、板、梁、拱构件、小型构件等预制构件工程量均按构件混凝土实体积(不包括空心部分)计算。
  - (2) 安装柱式墩、台管节工程量按管节长度计算。
  - (3) 安装钢管栏杆工程量按其长度或质量计算。
  - (4) 安装不锈钢栏杆、安装防撞栏杆钢管扶手工程量按其长度计算。
- (5) 安装钢支座工程量按其质量计算;安装橡胶支座工程量按其体积计算;安装油毛 钻支座工程量按其而积计算;安装盆式金属橡胶组合支座工程量按其数量计算。
  - (6) 安装港水孔工程量按孔道长度计算。
  - (7) 安装伸缩缝工程量按缝长计算。伸缩缝预留槽混凝土工程量按其体积计算。
  - (8) 安装沉降缝工程量按嵌缝断面面积计算。
  - (9) 驳船未包括进出场费,发生时应另行计算。

#### 7.9.2 定额套用及换算说明

- (1) 本意定额适用于桥涵工程混凝土构件的安装等项目。
- (2) 小型构件安装已包括 150m 场内运输, 其他构件均未包括场内运输。
- (3) 安装预制构件定额中,均未包括脚手架。如需要用脚手架时,可套用《通用项目》相应的定额项目。
  - (4) 安装预制构件,应根据施工现场具体情况,采用合理的施工方法,套用相应定额。
- (5) 除安装梁分陆上、水上安装外,其他构件安装均未考虑船上吊装,发生时可增加船只费用。
- (6)构件导梁安装定额中不包括导梁的安拆和使用,发生时可套用装配式钢支架定额, 工程量按实际计算。

(7) 预留槽混凝土采用钢纤维混凝土, 定额中钢纤维用量按水泥用量的 1%考虑, 如设 计用量与定额用量不同时, 应按设计用量调整。

(8) 安装伸缩缝定额中梳型钢板伸缩缝、钢板伸缩缝、橡胶板伸缩缝、毛勤伸缩缝均 按成品安装考虑,成品费用另计。

【例 7-16】 起重机安装 T 形梁(梁长 20m, 陆上安装, 提升高度 7m), 确定套用定额子 目及基价。

【解】 奎用定额子目: [3-447]

基价=463 元/10m3

【例 7-17】 陆上扒杆安装 C30 预制混凝土 T 形梁、梁长 20m, 提升高度 10m, 确定套 用定额子目及基价。

【解】 套用定额子目: [3-445]H

根据册说明, 查《桥涵工程》册中表 4-13 可知: 提升高度大于 8m, 不超过 15m 时, 人工乘以系数 1.10, 起重机械乘以系数 1.10。

基价=1.657+435.16×(1.1-1)+936.56×(1.1-1)  $\approx 1.7946 \pi / 40 \text{m}^3$ )



临时工程定额包括搭拆桩基础支架平台,搭拆木垛,拱、板添拱盔支架,桥梁支架, 组装、拆卸船排, 挂篮及扇形支架的制作、安拆和推移, 筑、拆胎模和地模, 凿除桩顶混 凝土等相应 不同。

#### 7.10.1 工程量计算规则

(1) 搭、拆桩基层工作平台面积计算,如图 7.10 所示。

① 桥梁打桩:  $F = N_1F_1 + N_2F_2$ (7-22)每座桥台(桥墩):

 $F_1 = (5.5 + A + 2.5) \times (6.5 + D)$ (7-23)每条诵道:  $F_2 = 6.5 \times [L - (6.5 + D)]$ (7-24)

② 钻孔灌注桩:  $F = N_1F_1 + N_2F_2$ 

(7-25)

每座桥台(桥墩):  $F_{1} = (A+6.5) \times (6.5+D)$ (7-26)

每条通道:  $F_2 = 6.5 \times [L - (6.5 + D)]$ (7-27)

式中 F——工作平台总面积,  $m^2$ :

 $F_1$  ——每座桥台(桥墩)工作平台面积。 $m^2$ :

 $F_2$  桥台至桥墩间或桥墩至桥墩间通道工作平台面积,  $m^2$ :

N:---桥台和桥墩总数量:

D --- 两排桩之间距离, m:

L 桥梁跨径或护岸的第一根桩中心至最后一根桩中心之间的距离, m;

A 桥台(桥墩)每排桩的第一根桩中心至最后一根桩中心之间的距离, m。




图 7.10 工作平台面积计算示意图

(注: 图中尺寸以 m 为单位, 桩中心距为 D, 通道宽 6.5m)

- (2) 台与墩或墩与墩之间不能连续施工(如不能断航、断交通或拆迁工作不能配合)时,每个墩、台可计一次纸装、拆卸柴油打桩架及设备运输费。
  - (3) 桥涵拱盔、支架空间体积的计算。
  - ① 桥涵拱盔体积按起拱线以上弓形侧面积乘以(桥宽+2m)计算。
- ② 桥涵支架体积接结构底至原地面(水上支架为水上支架平台顶面)平均标高乘以纵向距离再乘以(桥宽+2m)计算。

【例7-18】 某桥涵如图 7.11 所示, 计算桥涵拱盔和支架工程量。




图 7.11 某桥涵示意图

【解】拱盔: 
$$\frac{\pi \times 1.5^2}{2} \times (6+2) \approx 28.27 (\text{m}^3)$$

# 市政工程计量与计价(第三版)



支架: (3+2)×4×6=120(m3)

- ③ 现浇盖梁支架体积按从盖梁底至承台顶面高度乘以长度(盖梁长+1m)再乘以宽度 (盖梁宽+1m)计算,并和除分柱所占体积。
- ④ 支架堆载预压 L程量按施 L组织设计要求计算,设计 无要求时,按支架承载的梁体设计 质量乘以系数 1.1 计算。
  - (4) 挂篮及扇形支架的计算。
- ② 0#块扇形支架安拆工程量按顶面梁宽计算,边跨采用挂篮施工时,其合龙段扇形支架的安拆工程量按梁宽的50%计算。
  - ③ 挂篮、扇形支架的制作工程量按安拆定额括号中所列的摊销量计算。
  - (5) 组装、拆卸船排工程量按组装、拆卸的次数计算。
  - (6) 搭、拆木垛工程量按木垛体积计算。
  - (7) 锁、拆胎模和地模。
  - ① 砖地模工程量按地模与混凝土接触面积计算。
- ② 混凝土地模按混凝土体积计算; 浇筑混凝土地模的模板工程量按其与混凝土接触面 积计算。
  - (8) 凿除桩顶湿凝土工程量按凿除的湿凝土体积计算。

#### 7.10.2 定额套用及换算说明

- (1) 支架平台适用于陆上、支架上打桩及钻孔灌注桩。陆上支架采用方木上铺大板; 水上支架采用打圆木桩,在圆木桩上放盖梁、横梁、大板,圆木桩固定采用型钢斜撑,桩 与盖梁连接采用U.形籍。
  - (2) 支架平台分陆上平台与水上平台两类, 其划分范围如下。
  - ① 凡河道原有河岸线、向陆地延伸 2.5m 范围,均可套用水上支架平台。
  - ② 除水上支架平台范围以外的陆地部分,均属陆上支架平台,但不包括坑洼地段。
- ③ 如坑洼地段平均水深超过 2m 的部分,可套用水上支架平台;平均水深在 1~2m 时,按水上支架平台和肺上支架平台各取 50%计算;平均水深在 1m 以内时,按肺上支架平台计算。
  - (3) 桥涿拱盔、支架均不包括底模及地基加固在内。
- (4)组装、拆卸船排定额中未包括压舱费用。压舱材料取定为大石块,并按船排总吨位的30%计取(包括装、卸在内150m的二次运输费)。
  - (5) 打桩机械锤重的选择见表 7-4。

表 7-4 打桩机械锤重确定表

桩 类 型	桩长度/m	桩截面积 S/m²或管径∮/mm	柴油桩机锤重/kg	
	L≤8	S≤0.05	600	
钢筋混凝上方桩及板桩	<i>L</i> ≤8	0.05 <s≤0.105< td=""><td>1 200</td></s≤0.105<>	1 200	
	8< <i>L</i> ≤16	0.105< <i>S</i> ≤0.125	1 800	

桩 类 型	桩长度/m	桩截面积 S/m²或管径ø/mm	柴油桩机锤重/kg
	16< <i>L</i> ≤24	0.125<5≤0.160	2 500
钢筋混凝土方桩及板桩	24< <i>L</i> ≤28	0.160< <i>S</i> ≤0.225	4 000
	28 <l≤32< td=""><td>0.225 &lt; S≤ 0.250</td><td>5 000</td></l≤32<>	0.225 < S≤ 0.250	5 000
	32 <l<40< td=""><td>0.250 &lt; S ≤ 0.300</td><td>7 000</td></l<40<>	0.250 < S ≤ 0.300	7 000
	<i>L</i> ≤25	φ400	2 500
	L≤25	ψ550	4 000
	L≤25	φ600	5 000
钢筋混凝土管桩	L≤50	<i>\$</i> 600	7 000
<b>初</b> 助混凝工官性	L≤25	\$800 X	5 000
	<i>L</i> ≤50	Ø800 / C	7 000
	L≤25	ø1.000 V	7 000
	L≤50	1 000	8 000

注:钻孔滞注桩工作平台按孔径 ø≤ 1 000mm,套用锤重 1 800kg 打桩工作平台; ø>1 000mm,套用锤重 2 500kg 打桩工作平台。

- (6) 搭、拆水上工作平台定额中,已综合考虑了组装、拆卸船排及组装、拆卸打拔桩 架工作内容,不得重复计算。
- (7) 满堂式钢管支架、门式钢支架定额只含搭拆, 其使用费单价(i·d)按当地实际价格确定, 工程量按施工组织设计计算, 如无明确规定分别按每立方米空间体积 50kg 和 40kg 计算(包括扣件等)。

(8)装配式钢支架定额只含搭拆,其使用费单价(t・d)按当地实际价格确定,工程量按 施工组织设计计算,如无明确规定分别按每立方米空间体积125kg 计算(包括扣件等)。

- (9) 水上安装柱篮需浮吊配合时应另行计算。
- (10) 地模定额中, 砖地模厚度为 7.5cm, 混凝土地模定额中未包括毛砂垫层, 发生时按"排水工程"相应定额执行。

【例 7-19】 某二跨简支梁桥、桥跨结构为 13m+16m、均采用 40cm×40cm 钢筋混凝土方桩打入桩基础、桩长 22m、其中 1 号、3 号桥台采用单排桩 11 根、桩距为 1.2m、2 号桥墩采用风排平行桩、每排 9 根、桩距为 1.5m、排距为 1.5m、如图 7.12 所示。施工时搭设水上支架平台、试计算该工程搭拆桩基础工作平台的工程量、并确定套用的定额子目及基价。

【解】(1) 1号、3号桥台工作平台面积

$$F_{186 \text{ fr}} = [5.5 + 1.2 \times (11 - 1) + 2.5] \times (6.5 + 0) \times 2 = 260 \text{ (m}^2)$$

(2) 2 号桥墩工作平台面积

$$F_{\text{116-DB}} = [5.5 + (9-1) \times 1.5 + 2.5] \times (6.5 + 1.5) = 160 \text{ (m}^2)$$

(3) 通道工作平台面积

$$F_2 = 6.5 \times \left(13 - \frac{6.5 + 0}{2} - \frac{6.5 + 1.5}{2}\right) + 6.5 \times \left(16 - \frac{6.5 + 0}{2} - \frac{6.5 + 1.5}{2}\right)$$

 $=94.25(m^2)$ 




图 7.12 · 某柄桩基础支架平台计算示意图(单位: m)

- (4) 合计桩基础工作平台的面积=260+160+94.25=514.25(m2)
- (5) 查《桥涵工程》中表 4-16 可知: 打桩机锤重为 2 500kg
- 套用定额子目: [3-522] 基价=19 396 元 100m<sup>2</sup>

【例 7-20】 某桥梁工程采用ø1000钻孔灌注桩基础、施工时搭拆水上支架平台、并确定标基础支架平台率用的定额子目及基价。

【解】 Ø1 200 钻孔灌注桩基础支架平台套用锤重 1 800kg 打桩工作平台 套用定额子目: [3-521]

7.11 装饰工

基价=14 820 元/100m2

装饰 L程定额包括水泥砂浆抹面、水刷石、剁斧石、拉毛、水磨石、镶贴面层、水质涂料、油漆等相应子目。

#### 7.11.1 工程量计算规则

- (1) 除金属面油漆以 t 为单位计算外, 其余项目均按装饰面积以 m3 为单位计算。
- (2) 栏板的抹灰不扣除 0.3m2以内孔洞所占面积,按立面投影面积乘以 1.1 的系数。
- (3) 桥梁栏杆柱水泥砂浆抹面按设计图示尺寸以柱段周长乘以高度计算, 套用栏杆 于目。
  - (4) 花岗岩(大理石)镶贴面层面积按外围饰面面积计算。

### 7.11.2 定额套用及换算说明

- (1) 本章定额适用于桥、涵构筑物的装饰项目。
- (2) 讓贴面层定额中,贴面材料与定额不同时,可以调整换算。但人工与机械台班消耗量不变。
- (3) 水质涂料不分面层类别,均按本定额计算,由于涂料种类繁多,如采用其他涂料 时,可以调整换算。
- (4) 水泥白石子浆抹灰定额,均未包括颜料费用,如设计需要颜料调制时,应增加颜料费用。
- (5) 油漆定额按手工操作计取,如采用喷漆工艺时,应另行计算。定额中的油漆种类与实际不同时,可以调整换算。
  - (6) 定额中均未包括施工脚手架,发生时可按第一册《通用项目》的相应定额执行。
- 【例 7-21】 墙面水刷石饰面,采用 1:1 水泥白石子浆,墙高 3.8m、确定套用定额子目及基价。
  - 【解】套用定额子目: [3-554]H

定额采用1:2水泥白石子浆,需进行材料换算。

1:2 水泥白石子浆的单价为 258.23 元/m3

1:1 水泥白石子浆的单价为 311.42 元/m3

基价=1 749+(311.42-258.23)×1.025 ≈ 1 804(元/100m²)

【例7-22】 桥梁镶贴瓷砖(108mm×108mm×5mm、0.32 元/块)面层,确定套用定额子目及基价。

【解】套用定额子目: [3-576]H

基价=4521+
$$\left(\frac{152\times152}{108\times108}\times320-418\right)\times4.56\approx5505$$
 (元/100m<sup>2</sup>)

【例 7-23】 桥梁栏杆采用白水泥砂浆抹面,即 1:2 水泥砂浆中的普通水泥 42.5 改为 白水泥,确定套用定额子目及基价。

【解】套用定额子目: [3-553]H

普通水泥 42.5 的单价: 0.33 元/kg

白水泥的单价: 0.60 元/kg 基价=1 439+[462,000×(0.60-0.33)]×1.025≈1 567(元/100m²)

# 7.12 桥梁工程定额计量与计价实例

【例7-24】某工程在 K8+260 处跨越现状月牙河时建设桥梁一座,于 2016 年 3 月 1 日一3 月 7 日进行工程招投标活动。月牙河桥与道路中线斜交 70°、上部结构采用 20m 跨径的预应力空心板简支梁,下部结构采用重力式桥台、 \$\phi\$100 钻孔灌注桩基础。桥面铺装采用 3cm 细粒式沥青混凝土和水泥混凝土。采用 GJZ100×150 板式橡胶支座、支座总厚度为 21mm。桥梁工程施工图如图 7.13~图 7.34 所示。本桥梁工程混凝土模板、桥梁栏杆不在本次计价范围,已知桥台基坑开挖方量(一、二类土)为 2 579.90m³,其中人工辅助清底为 257.90m³,其余用挖掘机挖土;基坑回棋土方量为 544.90m³,台背回填砂砾石 1 387.03m³。已知原地面平均标高为 3.69m。

试按定额计价模式采用工料单价法编制本工程的投标报价,本工程风险费用暂不考虑,农民工工伤保险费,危险作业意外伤害保险费暂不考虑,本工程无创标化工程要求,不得分包,无暂列金额、计日工。

【解】1. 确定本桥梁工程的施工方案。

- (1) 钻孔灌注桩:采用回旋转机成孔、商品水下混凝土。
- (2) 梁板: 现场预制。
- (3) 施工机械中的履带式挖掘机、履带式推土机、压路机的进出场费在道路工程预算中考虑,本桥梁工程不计。
  - (4) 桥台施工过程中采用轻型井点降水,共计安装井点管 250 根,使用 8 天。
  - (5) 桥梁施工时设置编织袋围堰、堰顶高于设计水位 0.5m, 围堰体积为 550.80m3。
  - (6) 多余土方用自卸车外运,运距 8km; 泥浆外运运距 10km。

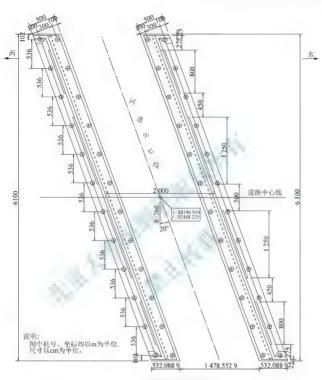


图 7.13 桥梁总体布置平面图

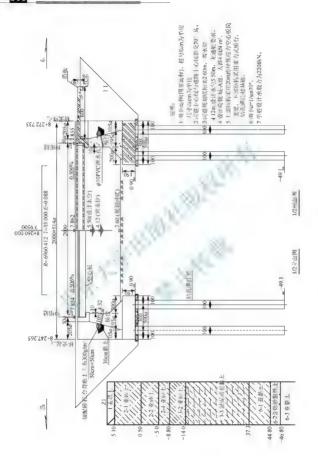


图7.14 桥梁总体布置立面图




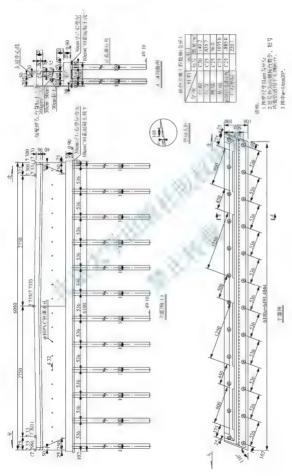


图 7.16 桥台一般构造图

224

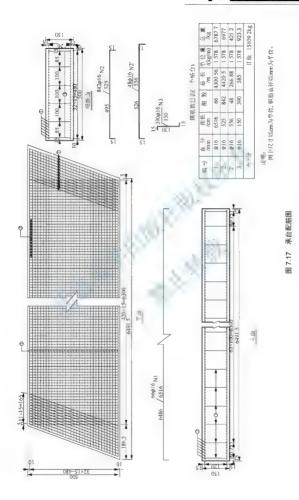

225

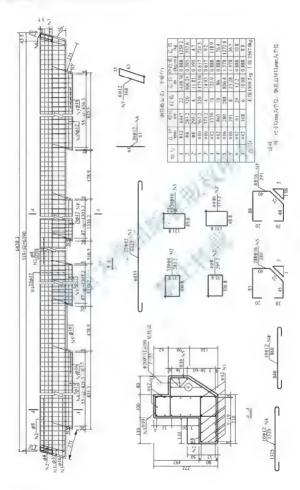
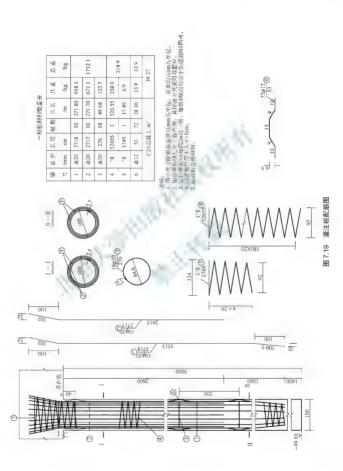


图 7.18 台帽配筋图



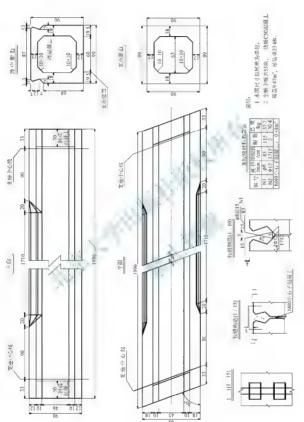


图 7.20 20m 空心板中板一般构造图

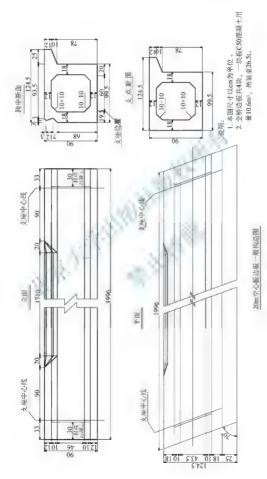


图 7.21 20m 空心板边板一般构造图


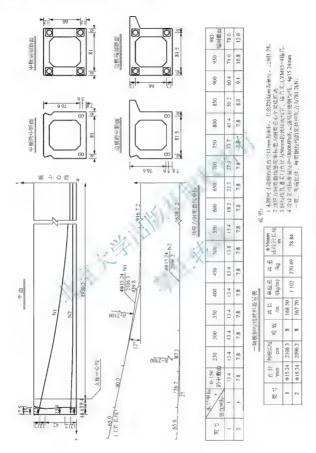


图 7.22 20m 空心板预应力钢束构造图

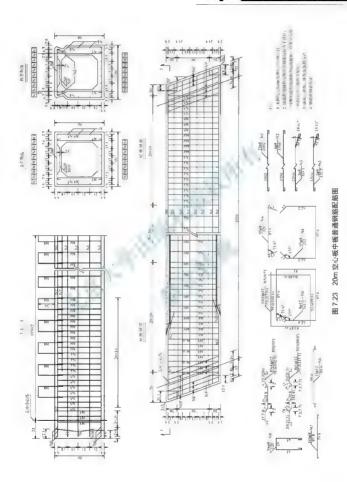

231

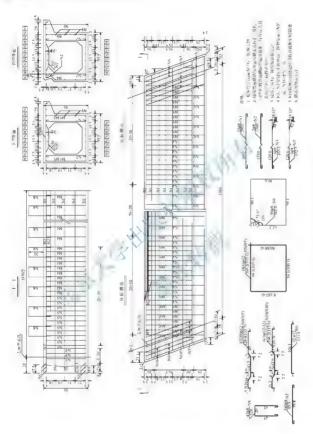


图 7.24 20m 空心板边板普通钢筋配筋图

#### -块空心板普通钢筋明细表

					挑臂25cm		Ī .
类	编	貞径	长度	根数	共长	共重	습기
別	+	/mm	/cm	/根	/m	/kg	D. N
	1	φ8	2002.0	22	440.44	174.0	钢筋: (kg)
	2	φ8	1760.0	4	70.40	27.8	
	3	φ8	165.1	2	3.30	1.3	φ8; 474.1 φ12; 193.8
	3'	$\phi 8$	172.7	2	3.45	1.4	φ12; 193.8
	4	φ8	252.0	95	239.40	94 6	混凝土;(m)
中	4'	φ12	361.2	8	28.90	25.7	
T	5	φ12	359.2	14	50.29	44.7	C50: 9.47
	5'	φ12	376.0	6	22.56	20,0	C20 <sub>4</sub> 0.24
	6	φ8	121.0	95	114.95	45.4	
	6'	φ12	109.6	12	13.15	11.7	
板	7	φ8	89.8	240	215.52	85.1	
10X	8	$\phi 8$	120.0	94	112.80	44 6	1
	9	φ12	98 6	85	83.83	74.4	1
	9'	φ12	102.9	4	4.12	3.7	
	10	φ12	107.2	8	8.58	7.6	
	10'	φ12	113 1	6	6.79	6.0	1
	1	φ8	2002.0	25	500.5	197.7	钢筋: (kg)
	2	φ8	1760.0	2	35,20	13.9	φ8: 461.7
	3	φ8	165.1	1	1.65	0.7	$\phi$ 0: 401.7 $\phi$ 12: 208.9
	3'	φ8	172.7	1	1.73	0.7	φ12: 206.9
1	4	φ8	361.6	99	357.98	141.4	
per	5	φ12	360.2	18	64.84	57.6	混凝土:(m')
	5'	φ12	377.1	6	22.62	20.1	C50; 10.60
	6	$\phi$ 12	110.1	12	13.22	11.7	C20: 0.24
板	7	φ8	89.8	240	215.52	85.1	C20: 0.24
	8	$\phi 8$	120.0	47	56.40	22.3	
	9	φ12	128.4	87	111.72	99.2	
	9'	$\phi 12$	132.7	10	13.27	11.8	
	10	$\phi 12$	140.2	6	8.41	7.5	
	10'	φ12	113.6	1	1.14	1.0	

注: C20混凝土为空心板封端混凝土

图 7.25 20m 空心板普通钢筋材料表

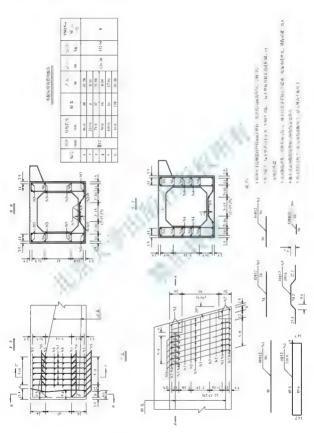


图 7.26 20m 空心板锚端钢筋构造图



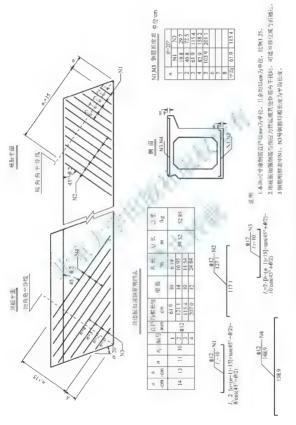


图 7.27 跨径 20m 空心板边板锐角、钝角加强筋构造图

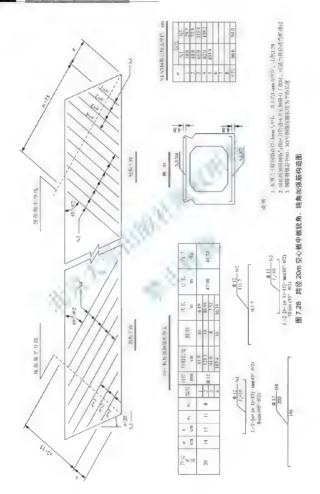

237

图 7.29 搭板配筋图(一)

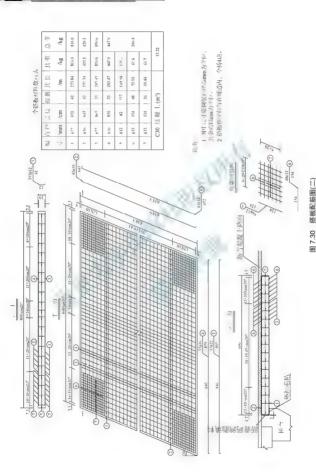

238


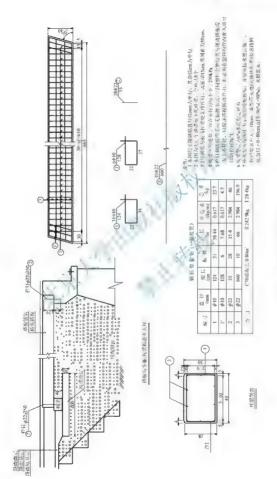


图 7.31 枕梁构造配筋图(一)

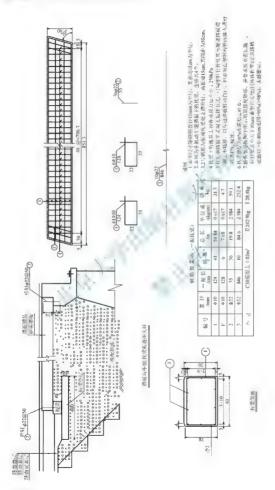

7.32 枕梁构造配筋图(二)



图 7.33 桥面系构造配筋图

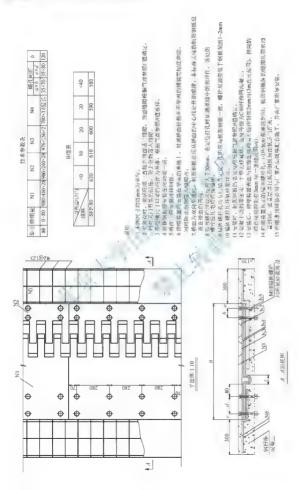


图 7.34 SPF 伸縮缝

## 2. 根据图纸,结合施工方案,确定并计算分部分项及技术措施项目的工程量,见表 7-5。

#### 表 7-5 分部分项及技术措施项目工程量计算表

序号	工程项目名称	単位	工程量计算公式	数量	定额子目
1	人工挖基坑土方(一、二类 土,4m内)	$m^3$	257.9	257.9	1-5 <sub>H</sub>
2	挖掘机挖土并装车( ·、 : 类土)	m <sup>3</sup>	2 579.9- 544.9× t.15	1 953.27	1-59
3	挖掘机挖土不装车(一、二 类土)	m <sup>3</sup>	544.9×1.15-257.9	368.73	1-56
4	自卸车运土方(8km)	m <sup>3</sup>	2 579.9-544.9×1.15	1 953.27	1-68+1-69×4
5	槽坑填上夯实	m <sup>3</sup>	544.90	544.90	1-87
6	台背回填砂砾石	m <sup>3</sup>	1 387.03	1 387.03	2 25
7	搭拆桩基础支架平台	m²	$\left(\frac{58.96}{\sin 70^{\circ}} + 6.5\right) \times (6.5+3) \times 2+$ $6.5 \times [20 - (6.5+3)] \times 1$	1 383.89	3-156
8	埋设钢护筒	m	28-2-2	96.00	3-107
9	回旋钻孔	m3	$\pi \times 0.5^2 \times (3.69 + 49.1) \times 48$	1 990.14	3-128
10	泥浆池建造拆除	m <sup>3</sup>	1990.14	1 990.14	3-144
11	泥浆外运(10km)	$\frac{1}{m^3}$	1 990.14	1 990.14	3-145+3-146×5
12	C25 混凝土灌注桩	m <sup>3</sup>	$\pi \times 0.5^2 \times (50 \times 1.2) \times 48$	1 929.22	3-150
13	<b>潜桩头</b>	m <sup>3</sup>	π×0.5×1.2×48	45.22	3-548
14	C25 混凝土革告	m³	查《桥涵工程》中图 7.16	1 035.0	3-215 <sub>H</sub>
15	铺设片石垫层	m <sup>3</sup>	查《桥涵工程》中图 7.16	220.1	3-207
16	C10 混凝土垫层	$m^3$	64.915×(5+0.3×2)×0.1×2	72.70	3-208 <sub>H</sub>
17	C30 混凝土台帽	$m^3$	查《桥涵工程》中图 7.16	140.20	3-243 <sub>H</sub>
18	C25 混凝土台身	$m^3$	查《桥涵工程》中图 7.16	835.70	3-225 <sub>H</sub>
19	C25 混凝土侧墙	m <sup>3</sup>	查《桥涵工程》中图 7.16	36.00	3-285 <sub>H</sub>
20	C50 预应力板梁预制	m <sup>3</sup>	10.6×4+9.47×53	544.31	3-343 <sub>H</sub>
21	梁板运输 100m	m³	544.31	544.31	3-371
22	梁板安装	m³	544.31	544.31	3-438
23	桥面铺装 C30 混凝土,厚 8cm	m³	20×60.5×0.08	96.8	3-314 <sub>H</sub>
24	混凝上路面养生	m²	20×60.5	1 210.00	2-207
25	细粒式沥青混凝上桥面铺 装,4cm	m <sup>2</sup>	8×20×2+12,5×20×2	820.00	2-191+ 2-192×2



#### 市政工程计量与计价(第三版)

续表

					续表
序号	工程项目名称	単位	工程量计算公式	数量	定额子目
26	人行道 C30 细石混凝土铺装,厚3cm	m <sup>2</sup>	2.33×20×2×0.03	2.80	3-316 <sub>H</sub>
27	C40 小石子混凝土铰缝	$m^3$	0.431×(11+14+29)	23.27	3-288 <sub>H</sub>
28	C30 现浇混凝土搭板	m <sup>3</sup>	11.97×8+15.32×4	157.04	3-318 <sub>H</sub>
29	C30 混凝土枕梁	m <sup>3</sup>	0.8×8+1.02×4	4.72	3-222 <sub>H</sub>
30	C25 现浇混凝土人行道梁、 侧石	m <sup>3</sup>	6.4+8	14.40	3-304
31	预制 C30 人行道板	m <sup>3</sup>	7.46	<sub>F</sub> 7.46	3-358 <sub>H</sub>
32	人行道板运输	$m^3$	7.46	7.46	1-304
33	人行道板安装	m <sup>3</sup>	7.46	7.46	3-479
34	板式橡胶支座	cm <sup>3</sup>	10×15×2.1×57	17 955	3-491
35	SFP 伸缩峰	m	64.195×2	129.83	3 503
36	钻孔桩钢筋笼	t	(1 712.1+214.9+33.9)×48/1 000	94.123	3 179 <sub>H</sub>
37	现浇构件钢筋, 圆钢	t	(2 567×2+28.4×12+37.7×54+ 8 780.6 -1 022.8 277.8 146.5)/1 000	14.844	3-177
38	现浇构件钢筋、螺纹钢 , ,	1	(15 109.2×2+1 309.5×2+(816.0+ 429.3+850.6+447.9)> 4+(660.6+ 347.6+667.7+350.9+217.4)×8+ 242.9×12+38.4×54)/1 000	66.564	3-178
39	预制构件钢筋, 购钢	t	(474.1×53+461.7×4+1 022.8+ 277.8+146.5)/1 000	28.421	3-175
40	预制钢筋钢筋,螺纹钢	t	(193.5×53+208.9×4+112.14×57+ 52.85×4+41.73×53)/1 000	19.922	3-176
41	φ15.24 钢绞线作制安装	t	370.49×57/1 000	21.118	3-193 <sub>H</sub>
42	安装压浆管道波纹管	103	78.84×57	4 493.88	3-202
43	管道压浆	$m^3$	π×(0.056/2)2×4 493.88	11.06	3-203
44	锚具 YM15-4	套	8×57	456.00	
45	PVC 泄水孔	m	20×1.45×2	58	3-502
46	沉降缝安装	m²	$\frac{0.95 + 1.95}{2} \times (7.736 - 2.4) \times 2$	15.48	3-513
47	轻型井点安装	根		250	1-323
48	轻型井点拆除	根		250	1-324
49	轻型井点使用	套•天		40	1-325
50	编织袋围堰	$m^3$	550.80	550.80	1-182

#### 3. 确定组织措施项目。

根据本工程的实际情况,考虑计取以下施工组织措施项目:安全文明施工费、工程定位复测费、夜间施工增加费、行车行人干扰增加费、已完工程及设备保护费。

- 4、确定人、材、机单价、判定工程类别、确定各项弗率。
- (1) 围堰所需黏土外购单价为 25 元/m³, YM15-4 为 15 元/套, 一类人工工目单价为 65元, 二类人工工日单价为 70元, 其他人、材、机单价按《浙江省市政工程预算定额》(2010 版) 计取
  - (2) 根据工程类别划分,本工程为三类桥梁工程。
- (3)企业管理费、利润、各项组织措施费的费率按《浙江省建设工程施工费用定额》(2010版)及浙江省有关规定的费率范围的低值计取;规费、税金按《浙江省建设工程施工费用定额》(2010版)的规定计取。

表 7-6 投标报价扉页

5. 计算定额计价模式下, 本桥梁工程的工程造价, 详见表 7-6~表 7-14。

基道路月牙河桥工程 预算价 预算价 (小写): 4 862 627 ri. (大写): 肆佰捌拾陆乃忒仟陆佰忒拾集元整 工程告价 发包人: 咨询人: (单位盖章) (单位兼登) (单位资质专用章) 法定代表人 法定代表人 或其授权人: 或其授权人: (造价人员签字盖专用章) (造价人员签字盖专用章) 编制人 复核人: (造价人员签字盖专用意) (造价工程师答字盖专用意) 编制时间: 复核时间:

表 7-7 总说明

#### 工程名称: 某道路月牙河桥工程

第1页 共1页

#### 一、工程概况

月牙河桥与道路中线斜交 70°、上部结构采用 20m 跨径的预应力空心板简 支梁。下部结构采用重力 式桥行, D100cm 钻孔灌注胜基础。桥面铺装采用 3cm 细转式沥青混凝土和水泥混凝土。桥梁 L程施 L 图如图 7.13~图 7.34 所示。本桥坚 L程滤处上模板,桥梁柱杆不在本次计价范围,已知桥台基坑开挖方 是(、、二类上)2 579 90m<sup>3</sup>、其中人 L辅助清成为 257.90m<sup>3</sup>,具余用挖掘机挖上;基坑回填 L 方量为 544.90m<sup>3</sup>,合背回填砂砾石 1387.03m<sup>3</sup>。已知除地面严均标高为 3.69m。

#### 二、施工方案

- (1) 钻孔灌注桩:采用回旋转机成孔、商品水下混凝土。
- (2) 梁板: 现场预制。
- (3) 施工机械中的履带式挖掘机、履带式推上机、压路机的进出场费在道路工程预算中考虑,本标受工程不计。
  - (4) 桥台施工过程中采用轻型并点降水, 其计安装井点管 250 根, 使用 8 天。
  - (5) 桥梁施丁时设置编织袋围堰、堰顶高于设计水位 0.5m, 围堰体积为 550.80m3。
- (6) 名余上方用自卸车外运, 运距 8km; 泥浆外运运距 10km。

#### 2、人、材、机价格确定

·类人工工日单价为65元,二类人工工日单价为70元,围堰所需盐上外购单价为25元/m³,YM15-4为15元/套,其他人、材、机单价按《浙江省市政工程预算定额》(2010版)计取。

#### 四、工程类别及带率取定

本工程为三类桥梁工程。企业管理费、利润、各项组织措施费的费率按《浙江省建设工程施工费用 定额》(2010 版)及浙江省有关规定的费率范围的低值计取;规费、税金按《浙江省建设工程施工费用定 额》(2010 版)的规定计取。

#### 五、编制依据

- (1) 月牙河桥工程招标图纸。
- (2)《浙江省市政工程预算定额》(2010版)。
- (3)《浙江省建设工程施工费用定额》(2010版)。
- (4) 浙建站计[2013]64号——关于《新红省建设 [程费用定额》(2010版)费用项目及费率调整的通知。
- (5) 建建发[2015]517号——关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知。

#### 表 7-8 工程项目预算汇总表

工程名称: 某道路月牙可括工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额/元
1	市政	4 862 627.03
1.1	桥梁	4 862 627.03
	合 计	4 862 627

#### 表 7-9 单位(专业)工程预算费用计算表

单位(专业)工程名称: 市政-桥梁

第1页 共1页

序号		费用名称	计算公式	金額/元
-	<b>预算定额分部分项工程</b> 量		按计价规则规定计算	4 177 088.59
	其中	1. 人工费+机械费	Σ(定额人工费+定额机械费)	1 041 467.00
_	施工组织措施费			141 639.51
		2. 安全文明施工费	1×11.54%	120 185.29
	其中	3. 工程定位复测费	1×0.03%	312.44
		4. 冬雨季施 L增加费	1×0%	0.00

# 第7章 《桥涵工程》预算定额应用

				续表
序号		费用名称	计算公式	金额/元
		5. 夜间施工增加费	1×0.01%	104.15
	其中	6. 己完工程及设备保护费	1×0.02%	208.29
	共中	7. 二次搬运费	1×0%	0.00
		8. 行人、行车干扰增加费	1×2%	20 829.34
==	企业管	<b>管理费</b>	I×20.8%	216 625.14
四	利润		1×8%	83 317.36
Ŧī.	规费		12+13	76 027.09
	9. 排	污费、社保费、公积金	1×7.3%	76 027.09
	10. %	<b>校民工工伤保险费</b>	按相关规定计算	0.00
六	危险作	车业意外伤害保险费	按相关规定计算	0.00
t	总承も	<b>亚服务费</b>	, Xt	0.00
	118	总承包管理和协调费	分包项目 「程造价×0%	0.00
	126	总承包管理、协调和服务费	分包项目工程造价×0%	0.00
	13. F	甲供材料设备管理服务费	甲供材料设备费×0%	0.00
八	风险的	*	(	0.00
九	暂列金	が	( + 1+1+14+ fi+ A+ 6+14)×0%	0.00
+	计税不	下计费 、	计税不计费 XX	0.00
+	不计和	说不计费	不计税不计划	0.00
+=	税金	12-1	(一+二十四+五+六+七+八+九+十)×3.577%	167 929.34
+-:	建设	口程造价,		4 862 627.03



表 7-10 工程预算书(分部分项)

				- Commercial Commercia			三八四十八日		
		700			Angel at Face and	人工業	材料表	机械费	Barrens
	1.5 株	人工控沟槽、基坑土力,深46.以内入一、二 类上,人工精助开约(包括切边、核摩底边)	100m³	2 579	2 331.88	2 331.88	00.0	0.00	6 013.92
2	1 56	挖城机挖一、二类七,不装有	1 000m³	0 369	2 293.59	312.00	00'0	1 981 59	845.72
23	69-1	挖掘机挖一、二类上, 装车	1 000m³	1.953	3 452.82	312.00	00'0	3 140.82	6 744.29
4	1 87	槽、坑、斑;夯实	100m³	5.449	891.54	717.60	000	173.94	4 858.00
10	L×69 1+89 1	府阳汽车4、运路 8(km)	1 000m	1.953	15 291.15	0.00	35.40	15 255.75	29 867.74
9	2 25	台背回項砂砾	10m2	138.703	800.36	81.90	709.68	8,78	111 012.33
-	3 516	挤、拆柜基础停上支架平台, 锤重1800kg	100m²	13.839	2 612.94	2 196.60	416.34	0.00	36 160.22
36	3 107	幼孔灌注料理设制护阀, ほ上す<1000	10m	9.600	1 623.72	1 370.60	177.57	75.55	15.587.71
6	3 128	回旋钻孔机成孔, 标符#1000以内	10m <sup>3</sup>	199.014	1 752.45	719.60	148.61	884.24	348 762.08
10	3-144	泥浆池建造、拆除	10m³	199,014	44.67	25.20	19.13	0.34	8 889.96
11	3 145+3 146×5	波炎运输。适野 10km	10m <sup>3</sup>	199.014	973 33	312.20	00.0	661.13	193 706.30
12	3 150	回旋钻孔, 滞补的品混凝土.	10m;	192.922	4 371.58	292.60	3 988.49	90.49	843 373.96
13	3-548	當除得孔灌注財頂納筋建設十	10m³	4.522	1 019.77	891.80	12.48	115.49	4 611.40
14	3 215 换	洗纸混凝土承台,现涂规拌混凝土 C25(40)	10m <sup>3</sup>	103.500	3 194.64	736.40	2 139.74	318.50	330 645.24
5	3 207	辅设碎石垫层	10m <sup>3</sup>	22.010	1 304.51	457.10	847.41	0.00	28 712.27
		本页小计							1 969 791 14

3	5
r	2
=	1
	1
25.7	š
r	1
'n	2

P 1771 S	* F. ( < 12 ) 1.45 from: 40.85 from		0.00				单价组成/元	П	M. C.
	<b>公</b>	4. 黄	事位		单价/元	1.7	41114	En.	年6万元
91	3 208 换	組及組織+整层,地為皮排建藏+ C10(40)	10m3	7.270	2 790.15	694,40	1 785.11	310.64	20 284.39
17	3 243 換	減減組織上%與台帽, 理倫與作組換上 C30(40)	10m³	14.020	3 480.97	891.10	2 237 36	352 51	48 803.20
90	3 225 模	港鎮電腦上海鎮經單桥台,現港戰鬥電腦上 C25(40)	10m <sup>3</sup>	83,570	3 581.59	1 048,60	2 123.58	409.41	299 313,48
6	3-285 極	现洗泥源上浇筑档墙,则浇曳炸泥漆上 C25(40)	10m <sup>3</sup>	3.600	3 181.45	725.90	2 118.18	337.37	11 453.22
20	3~343 换	预制调炼 1 空心板架(位应力), 见洗现件混滚 1 CS0(40)-水泥 52.5	10m <sup>1</sup>	54.431	4 113.87	941.50	2 803.78	368.59	223 922,06
21	3 371	旗规构件场内运输。构件重 40c 页边,运即, 100m	10m1	54.431	512.09	273.70	221.78	19'91	27 873.57
22	3 438	超重机陆   安装板梁起重机, 1≤20m	10m³	54.431	342.37	65.10	0.00	277.27	18 635.54
23	3 314 拠	桥山榆鞋, 混凝土基础, 观洛现井混蕊化 C30t40)	10m³	08976	3 236.27	779.10	2 241.07	216.10	31 327.09
24	2-207	<b>木岜油城,將面郭剌膜奔护</b>	100m²	12,100	173.23	56.00	117.23	0.00	2 096.08
25	2-191+2-192×2 換	机械操销划粒式沥青湿浆+整面,厚度4(cm)	100m <sup>2</sup>	8.200	3 232.93	70.42	2 923 62	238 89	26 510.03
26	3 316 換	人行 近 3cm 细石泥波 !- C30(40)	10m3	0.280	3 451.80	973.70	2 256.42	221.68	966.50
27	3 358 孫	预制混凝土人行道、榃镗板,现浇现井湿漩 土: C30(40)	10m <sup>3</sup>	0.746	4 232.07	1 599.50	2 383 71	248 86	3 157.12
28	3 479	小型构件人有道板安装	10m <sup>3</sup>	0.746	893.90	893.90	00 0	0.00	666.85
29	1 304	双轮车运输小型构件,运即 50m	10m <sup>3</sup>	0.746	233.73	233.73	000	0.00	174.36
30	3 288 换	板梁向混凝上灌缝, 现法现并混凝土 C40(40)	10m3	2.327	4 776.55	1 198.40	1 198.40 3 351.88	226.27	11 115.03
		本页小计							726 298.52



共3页 第3页

4 076 631.97 380 542.31 465 474 00 304 236 09 139 382 27 151 945 91 52 217.06 71 868 27 96 878 96 66 817.70 化多個 1 041.39 16 259.65 11 231.93 587.48 5 732.93 782.93 1 385.74 2 043 78 218.94 318.50 241.00 313.54 328.20 214.46 000 00.0 00.0 55 84 19.68 65.51 86.39 000 11111 2 229.74 3 938.18 3 910.09 6 194.53 1 051.46 10 155,45 3 703 00 4 408.67 2 246.81 2 191.80 369.04 3 969 53 3 913.27 3 972.79 174.97 189.92 4.40 84.5 1 548 40 679.00 435.40 567.70 865.90 798.00 816.20 786.10 876.40 08.08 49.00 569.80 550.20 1.40 1486.86 7 195,09 4 841 57 4 546.68 3 325.08 3 363.31 3 981.20 1 252.38 4 945.38 4 570.58 4 904 20 505.77 238.92 5.80 179.550 14844 199 99 21.118 12.983 94.123 28 421 19 922 44.939 1.106 15.704 0.472 1.440 .548 5.800 単語 l 00cm 10m2 I OTH 100m Om3 10m3 16m L Om, Om, --+ 本负小計 以 法 从 作 混 私 (30(40) k, 風涂见扩油凝 后张法群结, 束长 40m 以内, 7 孔以内 \*4. C25(40) 40 预制沉淀土螺纹铜制作、安装 安於 女教 公物 浇筑泥凝上浇筑横梁, 洗沒混凝一扭樂、圓石、 见流混凝上螺丝铜割作、 油首木丝板川屏缝以装 以亦成城一年知明代. 允忠,混汰上面的制作、 **福型阳极但临维安装** 安坂压浆管道被紅管 钻孔协钢筋笼影作、 极大權股上所定数 卵科岩泄水孔安装 范晨+桥头塔板, 管道压茨 C30(40)单位(专业)工程名称; 市政 桥梁 李中 222 换 3 318 杂 3 304 3 502 3-503 3 179 3 177 3 178 3 175 3 176 3 193 3 202 3 203 3-491 3 513 P-3 32 34 35 36 37 30 39 9 42 43 4 45 4

#### 表 7-11 工程预算书(技术措施)

单位(专业)工程名称: 市政 桥梁

第1页 共1页

序	,					<u></u>	单价组成/元	ā.	合价/元
号	hadaa.			and the same		人工费	材料费	机械轰	- EDION:
1	1 323	轻型井点降水安装	10 根	25.000	1 320.17	645.82	379.61	294.74	33 004.25
2	1 324	轻型井点降水拆除	10 根	25.000	410.67	230.37	0.00	180.30	10 266.75
3	1 325	使用轻型井点降水	套•天	40.000	335.57	140.00	29.41	166.16	13 422.80
4	1 182	编织袋围堰	100m <sup>3</sup>	5.508	7 945.32	2 573.55	5 107.66	264.11	43 762.82
			2	本页小计					100 456.62
			1	合 计			. 9		100 456.62

单位(专业)工程名称: 市政 桥梁

第1页共1页

序号		The state of the s	an sign	AN IN			
1		YM15-4 锚具	YM15-4, 75 Y	套	456.001	15	6 840.01
2	0101001	螺纹钢	II 级综合 👝	t	173.679	3 780	656 508.15
3	0107001	钢绞线		t ,	21.963	5 640	123 869.74
4	0109001	例例	(综合)	t	54.763	3 850	210 837.38
5	0401031	水泥 、 、 、	42.5	kg	765 182.262	0.33	252 510.15
6	0403043	黄砂(净砂)	综合	· i	2 173.459	62.5	135 841.21
7	0405001	碎石(一	综合 XT	t	4 124.327	49	202 092.01
8	0433062	非泵送水下商品 混凝土	C25	m³	2 315.064	329	761 656.06
9	j3115031	电(机械)		kW · h	215 290.115	0.854	183 857.76
10	0409481	黏土		$m^3$	512.244	25	12 806.10
11	8021221	现浇现拌混凝土	C25(40)	m <sup>3</sup>	1 949.917	207.370 5	404 355.16
12	8021271	现浇现拌混凝土	C50(40)-水泥 52.5	m <sup>3</sup>	552.475	266.104	147 015.71
			合 计				3 098 189.44

#### 表 7-13 主要工日价格表

单位(专业) [程名称: 市政-桥梁

第1页 共1页

ı	序号	工种	单位	b 0	<b>≱</b> 带玩.
	1	*类人 Ľ	LH	163.824	65
	2	二类人工	ĽΗ	12 272.540	70
	3	人工(机械)	LH	1 869.466	70

#### 表 7-14 主要机械台班价格表

单位(专业) L程名称: 市政 桥梁

第1页 共1页

序号	机械设备名称	单 位	数 量	单价/元
1	履带式推土机 90kW	台班	2.719	732.633 5
2	履带式单斗挖掘机(液压)1m3	台班	4.409	1 105.38
3	内燃光轮压路机 8t	台班	1.607	295.336 5
4	内燃光轮压路机 15t	台班	1.607	505.822 5
5	电动夯实机 20~62kg·m	台班	43.483	21.796 4
6	沥青混凝土推铺机 8t	台班	0.795 -	843.950 5
7	转盘钻孔机ø1 500	台班	255.73	477.594 9
8	履带式电动起重机 5t	台班	<328.882 \	171.71
9	自卸汽车 12t	台班	41.956	698.776 5
10	驳船 50t	台班 '	11.071	131.4
П	预应力拉伸机 YCW-150	、台班	16.472	80.4
12	电动卷扬机单筒慢速 50kN	· 台班	69.695	120.744 4
13	电动卷扬机单筒慢速 100kN	- 台班	4.953	182.522
14	双锥反转出料混凝土搅拌机 350L、	台班	165.549	123.726 1
15	灰浆搅拌机 200L	台班 、、	8.250	85.572 9
16	钢筋切断机 40	台班"X	56.625	38.823 4
17	钢筋弯曲机 40	班行	93.650	20.951 2
18	电动多级离心清水泵 H<180m	台班	14.250	400.579 5
19	污水泵 # 100	台班	14.250	116.51
20	泥浆泵≠100	台班	331.358	210.528 4
21	高压油泵 80MPa	台班	16.472	194.543 3
22	射流井点泵最大抽吸深度 9.5m	台班	120.000	55.387 9
23	交流弧焊机 32kV·A	台班	350.821	90.356 6
24	对焊机容量 75kV·A	台班	8.649	123.056 6
25	电动空气压缩机 1m³/min	台班	10.446	49.996 2
26	液压注浆泵 HYB50/50-1 型	台班	7.454	80.928
27	汽车式起重机 75t	台班	5.661	2 666.051 5
28	混凝土振捣器平板式 BLL	台班	118.497	17.556
29	混凝土振捣器插入式	台班	386.399	4.826
30	泥浆运输车 5t	台班	332.353	347.984

# ◎ 思考题与习题 〕

#### 一、简答题

- 1. 桥梁打桩工程,送桩高度超过 4m, 套用定额时如何调整?
- 2、桥梁打桩工程、送桩工程量计算时、如何确定"界限"?
- 3. 钻孔灌注桩成孔工程量计算时,如何确定成孔长度?
- 4. 钻孔灌注桩混凝土灌注工程量计算时,如何确定加灌长度?
- 5. 钻孔灌注桩钢护筒无法拔出时。如何进行定额换算套用?
- 6. 钻孔灌注桩钢筋笼钢筋的圆钢、螺纹钢的含量与定额不同时,如何进行定额换算套用?
  - 7. 板与板梁如何界定?
- 8. 现浇混凝土墙、板上有预留孔洞,如何计算现浇混凝土墙、板的混凝土工程量及模板工程量?
  - 9. 桥梁工程现浇混凝土模板的工程量应如何计算?
  - 10. 嵌石混凝土中块石含量与定额不同时,如何换算套用定额?
  - 11. 桥梁预制混凝土工程的模板工程量如何计算?
  - 12. 计算预制空心板梁混凝土体积时,是否要计入堵头板的体积?
  - 13. 箱涵顶进空顶工程量如何计算?
  - 14. 箱涵顶进土方工程量如何计算?
  - 15. 桥涵工程安装预制构件定额,是否包括了构件场内运输?
  - 16. 如何界定划分陆上支架平台、水上支架平台?
  - 17. 钻孔灌注桩支架平台项目套用定额时,如何确定打桩机锤重?

#### 二、计算题

- 1. 某桥梁现浇实心板梁,原地面至梁底的平均高度为 12m, 采用现浇现拌 C30(40)混凝土,确定板梁混凝土及模板套用的定额于目与基价。
- 某桥梁陆上起重机安装板梁,提升高度为12m,梁长18m,确定套用的定额子目与 基价。
- 3. 某桥在支架上打钢筋混凝土方桩其36根,桩截面积为0.4m×0.4m,设计桩顶标高为0.000m,施工期间最高潮水位标高为5.500m。计算该工程送桩的工程量,确定套用的定额于目及基价,并计算该工程送桩所消耗的人工用量。
- 4. 菜桥梁采用钻孔灌桩基础,桩径为1m,采用回旋转机陆上成孔,已知南侧桥台下 共有10根桩、设计桩顶标高为0.000m,桩底标高为25.000m,南侧原地面平均标高为 3.500m;北侧桥台下共有10根桩、设计桩顶标高为0.000m,桩底标高为25.500m,北侧原地面平均标高为3.800m,要求钻孔灌注桩入岩80cm,桩径为1m。试计算该桩基础工程的成孔工程量、灌注混凝土工程量、入岩工程量。
- 装桥梁采用钻孔灌桩基础,桩径 1.2m,水上施工时,铜护筒无法拔出,确定铜护筒套用的定额子目及基价。

确定钢筋笼套用的定额子目及基价。

- 6. 某桥梁钻孔灌桩工程,钢筋笼总重为 900kg,其中圆钢重 126kg,螺纹钢重 774kg,
- 7. 某桥梁现浇毛石混凝土基础,采用现浇现拌 C15(40)混凝土,块石含量为 25%,确定套用的定额子目及某价。
- 8. 某工程采用钢筋混凝土方桩 20 根, 桩截面为 0.4m×0.4m, 桩长为 28m, 分两投预制, 诚计算钢筋混凝土方桩预制时模板的工程量。
- 9. 某两跨桥梁,跨径为 10m+12m,两侧桥台均采用双排单800 钻孔灌注桩 12 根,桩距为 1.5m,排距为 1.2m;中间桥台采用单排单1000 钻孔灌注桩 6 根,桩距为 1.5m。试计算钻孔灌注桩施工时搭拆陆上工作平台的工程量,并确定套用的定额于目及基价。
- 10. 某桥梁工程水上打桩,采用桩长 12m 的钢筋混凝土方桩,截面面积为 0.122 5m²,确定搭拆桩基础支架平台套用的定额子目及基价。





 Hart Land Hart Ball Real Printers of the Party of the Par

# 第8章 工程量清单与清单 计价的基本知识

#### 本章学习要点

- 1. 工程量清单的概念。
- 2. 招标工程量清单的编制依据、组成及格式、编制要求、编制步骤。
- 3. 工程量清单计价的概念。
- 4. 工程量清单投标报价的编制依据、组成及格式、编制要求。





某公司参加一个工程的招投标活动, 该工程采用清单计价模式。招标单位向其发放了工程施工图样、招标文件以及招标工程量清单。 该公司按照招标文件的要求进行了工程量清单计价, 编制了商务标, 并编制了技术标、资信标。什么是工程量清单? 什么是工程量清单计价? 它们的格式是怎样的? 有什么不同? 编制工程量清单、编制工程量清单计价文件有什么要求?



从 2003 年开始, 国家开始推行 L程量清单计价模式, 我国工程造价的计价模式由传统的预算定额计价模式向国际上通行的工程量清单计价模式转变, 于 2003 年 7 月 1 日起实施《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2003), 于 2008 年 12 月 1 日起实施《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2008)。

全面推行工程量清单计价模式,完善工程量清单计价相关制度,有利于促进政府职能转变、充分发挥市场在工程建设资源配置中的作用、促进建设市场公开、公正、公平秩序的建立,提高投资效益。为了进一步从宏观上规范政府工程造价管理行为。从微观上规范承发包双方的工程造价计价行为,为工程造价全过程管理、精细化管理提供标准和依据,中华人民共和国任房和城乡建设部、中华人民共和国质量监督检验检疫总局联合颁布第1567号公告,于2013 年7月1日起实施《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500 2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB 50857—2013)。

# 知识链接

根据浙江省住房和城乡建设厅于 2013 年 10 月 21 日发布的建建发[2013]273 号文—— 关于贯彻《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013)等国家标准的通知,规定浙 江省自 2014 年 1 月 1 日起实施《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013)。同时, 通知做出了以下调整·

- (1) 措施项目清单按浙江省计价规则分为施工技术措施项目清单、施工组织措施项目清单。
  - (2) 施工技术措施项目清单按《市政工程工程量计算规范》(GB 50857-2013)进行编制。
- (3) 施工组织措施项目清单按浙江省计价依据编制,并接建标[2013]44号文要求取消检 验试验费项目(检验试验费并入企业管理费),增加工程定位复测费、特殊地区施工增加费 两个措施清单项目。

(4)按建标[2013]44号文要求,浙江省现行规费中取消"意外伤害保险费"项目,"意外伤害保险费"作为企业管理费的内容单独列项计算。

使用国有资金投资的建设工程发承包,必须采用工程量清单计价。国有资金是指国家 财政性预算内或预算外资金,国家机关、国有企事业单位或社会团体的自有资金及借贷资 金、国家通过对内发行政府债券或向外国政府及国际金融机构举借主权外债所筹集的资金。

工程量清单应采用桩单价计价。国有资金投资的建设工程招标,招标人必须编制招标 控制价。招标控制价是指招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据 和办法,以及拟定的招标文件和招标工程量清单,结合工程具体情况编制的招标工程的最 高投标限价。

非国有资金投资的建设工程发承包、官采用工程量清单计价。

# 8.2 工程量清单的基本知识

#### 8.2.1 工程量清单的概念

工程量清单是载明建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量,以及规费、税金项目内容的明细清单。

# 2 知识链接

工程量清单分为招标工程量清单、已标价工程量清单。

招标工程量清单是招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况 编制的,随招标文件发布供投标报价的工程量清单,包括其说明和表格。

已标价工程量清单是构成合同文件组成部分的投标文件中已标明价格,经算术性错误 修正(如有)且承包人已确认的工程量清单,包括其说明和表格。

#### 8.2.2 招标工程量清单的编制依据

- (1)《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013)、《市政工程工程量计算规范》 (GB 50857—2013)。
  - (2) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法。
  - (3) 建设工程设计文件及相关资料。
  - (4) 与建设工程有关的标准、规范、技术资料。
  - (5) 拟定的招标文件。
  - (6) 施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案。



#### 8.2.3 招标工程量清单的组成及格式

工程量清单由以下內容组成: 封面, 扉页、总说明, 分部分项工程项目清单, 措施项目清单, 其他项目清单及相关明细表, 规费和税金项目清单。

工程量清单采用统一格式。



# 知识链接

暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同答订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购、施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整,以及发生的 雷勝、现场答证确认等的费用

暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于必然发生但暂时不能确定价格的 材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。

计日工是指在施工过程中,承包人完成发包人提出的工程合同范围外的零星项目或工作,按合同约定的单价计价的一种方式。

总承包服务费是指为配合协调发包人进行的专业工程分包,对发包人自行采购的材料,工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。

#### 8.2.4 招标工程量清单的编制要求

#### 1. 一般规定

(1) 招标工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托、具有相应资质的工程造价咨询人编制。

具有编制能力的招标人是指招标人应具有与招标项目规模和复杂程度相适应的 工程技术、管理、造价方面的专业技术人员,且必须是招标人的专职人员,造价工 程师的注册单位应与招标人一致。

- (2) 招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分,其准确性和完整性由招标人负责。
- (3) 若拟建工程无须发生其他项目时,其他项目清单与计价汇总表及相关明细表 仍由招标人以空白表格形式放入招标工程量清单。
- (4)编制工程量清单出现《市政工程工程量计算规范》(GB 50857—2013)附录中未包括的项目,编制人应做补充,并报省级或行业工程造价管理机构备案,省级或行业工程造价管理机构应汇总报住房和城乡建设部标准定额研究所。

补充项目的编码由代码 04 与 B 和三位阿拉伯数字组成,并应从 04B001 起顺序编制。 L程量清单需附有补充项目的名称、项目特征、计量单位、 L程量计算规则、 L作内容,不能计量的措施项目,需附有补充项目的的名称、 L作内容及包含范围。

- (5) 同一招标工程的项目不得重码。
- 2. 工程量清单的编制要求
- 1) 封面、扉页

应按统一格式规定的内容填写、签字、盖章。由造价员编制的 L程量清单应有负责审核的造价 L程师签字、盖章。委托编制的 L程量清单,应有造价 L程师签字、盖章以及 L程造价咨询人盖章。

- 2) 清单编制说明
- 清单编制说明应包括以下内容。
- (1) 工程概况:包括建设规模、工程特征(结构形式、基础类型等)、计划工期、施工现场情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等。
  - (2) 工程招标和专业工程分包范围。
  - (3) 工程量清单编制依据。
  - (4) 「程质量、材料、施厂等的特殊要求。
  - (5) 招标人自行采购材料(工程设备)的名称、规格型号、数量等。
  - (6) 其他项目清单中暂列金额、材料或专业工程暂估价等。
  - (7) 其他需要说明的问题。
  - 3) 分部分项工程量清单

分部分项工程量清单应根据《市政工程工程量计算规范》(GB 50857-2013)附录规定 的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。

分部分项工程量清单编制采用规范规定的、统·的项目编码、项目名称、计量单位和 工程量计算规则,这是分部分项工程量清单编制的"四统一"原则。

## 特别提示

分部分项工程量清单是不可调整的闭口清单,投标人对招标文件中所提供的分部分项 工程量清单逐一计价,对清单所列内容不允许做任何更改变动。投标人如认为清单内容有 不妥或遗漏,只能通过质疑的方式由招标人做统一的修改更正,并将修正后的工程量清单 发绘所有投标人。

分部分项工程量清单编制程序如图 8.1 所示。




图 8.1 分部分项工程量清单编制程序

#### (1) 项目名称。

项目名称应按《市政工程工程量计算规范》(GB 50857—2013)附录中的项目名称结合 拟建工程的实际确定。



#### (2) 项目特征。

在编制工程量清单时,必须对项目特征进行准确和全面的描述。项目特征应按《市政 工程工程量计算规范》(GB 50857-2013)附录中规定的项目特征,结合拟建工程项目的实 际予以描述、应能满足确定综合单价的需要。

#### T.程量清单项目特征描述时应注意。

- ① 涉及正确计量的内容必须描述,如道路塘渣放坡铺设还是垂直铺设,放坡的话坡度 是名心等, 直接关系到 厂程量的计算。
- ② 涉及正确计价的内容必须描述。如混凝土的强度等级、砂浆的强度等级及种类、管 道的管材及直径。管道接口的连接方式等。切与于程量清单计价有着直接关系。C20, C30 混凝土的强度等级不同、单价也不同。M10、M75 砂浆的强度等级不同、水泥砂浆与干湿 砂浆种类不同,单价不同: D400 混凝土管与 DN400 HDPF 管单价不同: D800 混凝土管果 用橡胶圈接口与采用水泥砂浆接口, 单价不同。
- ③ 对计量、计价没有实质影响的可以不描述,如桥梁承台的长、宽、高可以不描述, 因为桥梁承台混凝土是按 m3 计算的。
- ④ 应由投标人根据施工方案确定的可以不描述,如泥浆护壁成孔灌注桩的成孔方法。 可由投标人在施工方案中确定。自主报价。
- (5) 无法准确描述的可不详细描述,如由于地质条件变化比较大,清单编制人无法准确 描述上壤类别的话,可注明由投标人根据地质勘探资料自行确定上壤类别,自主报价。
- ⑥ 如土石方工程中的取土运距、弃土运距等, 所不详细描述, 但在项目特征中应注明 由投标人自行确定。
- ⑦ 如施丁图纸或标准图集能够满足项目特征描述的要求。可直接描述为详见××图号 或××图集××质号
- 图 《市政工程工程量计算规范》(GB 50857 2013)中有多个计量单位时,清单编制人 可以根据具体情况选择。如"泥浆护壁成孔灌注桩"计量单位有 m、m3、根,清单编制人 可以选择其中之一作为计量单位。附录中"泥浆护壁成孔灌注桩"有5个项目特征。地层 情况、空桩长度及桩长、桩径、成孔方法、混凝土种类及强度等级, 若以 m 为计量单位, 项目特征描述时可以不描述桩长,但必须描述桩径, 若以 m3 为计量单位, 项目特征描述时 可以不描述桩长、桩径; 若以根为计量单位, 项目特征描述时, 桩长、桩径都必须描述。

#### (3) 项目编码。

分部分项工程量清单的项目编码应采用十二位阿拉伯数字,一至九位应按《市政工程 工程量计算规范》(GB 50857-2013)附录的规定设置,十至十二位应根据拟建工程的工程 量清单项目名称和项目特征设置,同一招标工程的项目编码不得有重码。

十二位项目编码按5级编码设置:


- ① 第一级编码: 一至二位, 为专业工程编码。建筑工程为 01, 装饰装修工程为 02, 安装 厂程为 03、市政 厂程为 04、园林绿化 厂程为 05。
  - ② 第二级编码: 三至四位, 为《市政工程工程量计算规范》(GB 50857-2013)附录的

编排顺序编码, 附录 A 为 01, 附录 B 为 02, 附录 C 为 03, 依次类推。

- ③ 第三级编码: 五至六位,为《市政工程工程量计算规范》(GB 50857—2013)附录中的分部工程顺序码。
- ④ 第四級编码:七至九位,为《市政工程工程量计算规范》(GB 50857—2013)附录分部工程中各分项工程顺序码。
- ⑤ 第五级编码: 十至十二位,为具体清单项目码,由 001 开始由清单编制人按顺序编制。

其中,一、∴、∴、四级编码须按《市政工程工程量计算规范》(GB 50857—2013)附录统一编制,第五级编码需根据附录中的项目名称和项目特征设置,结合拟建工程的实际情况进行编制,由工程量清单编制人自行编制,由001 开始顺序编制。

以 040203007001 为例, 各级项目编码划分、含义如下所示。



# 特别提示

同一招标项目的项目编码不得有重码。如果项目名称相同,则一、二、三、四级项目编码是相同的;如果项目特征有一项及以上不同,则第五级项目编码不同、由 001 开始顺序编制。

【例 8-1】·莱市政道路工程, 道路面层自上而下采用 3cm 厚细粒式沥青混凝土、5cm 厚中粒式沥青混凝土、7cm 厚粗粒式沥青混凝土、确定该道路面层清单项目名称及项目编码。

【解】该工程道路面层分为3层,均采用沥青混凝土,《市政工程工程量计算规范》(GB 50857—2013)中的项目名称均为"沥青混凝土",但3层的2个项目特征"厚度、石料粒径"不同,所以3层路面的具体的清单项目码不同,应该有3个具体的清单项目。清单项目名称分别为"3cm细粒式沥青混凝土"。"5cm中粒式沥青混凝土"。"7cm粗粒式沥青混凝土"。这3个清单项目的前4级编码相同。但3个清单项目的项目特征不同,所以这3个清单项目的第五级编码不同,从001开始按顺序编制。

该道路面层清单项目名称及项目编码如下:

项目名称	项目特征	项目编码
沥青混凝土道路面层	3cm,细粒式	040203006001
沥青混凝土道路面层	5cm,中粒式	040203006002
沥青混凝土道路面层	7cm,粗粒式	040203006003



(4) 计量单位。

计量单位应按《市政工程工程量计算规范》(GB 50857—2013)中规定的计量单位确定。

- 除专业有特殊规定以外, 按以下单位计量:
- ① 以质量计算的项目: 吨(t)或千克(kg)。
- ② 以体积计算的项目: 立方米(m³)。
- ③ 以面积计算的项目: 平方米(m²)。
- ④ 以长度计算的项目: 米(m)。
- ⑤ 以自然计量单位计算的项目: 个、块、套、台等。
- (5) 工程数量。

工程数量应按《市政工程工程量计算规范》(GB 50857 2013)规定的工程量计算规则计算。



根据浙建站计[2013] 63 号文件——关于印发《建设工程工程量计算规范》(2013) 浙江省补充规定的通知,在清单项目列项、计算清单工程量时,应特别注意;

- (1)将因挖沟槽、基坑、一般土石方因工作面和放坡所增加的工程量并入各土石方工程量中计算。如各专业工程清单提供的工作面宽度和放坡系数与我省现行预算定额不一致,按定额有关规定执行。
- (2) 对于技术措施项目清单,工程数量可以计算或有专项设计的,必须按设计有 关内容计算并提供工程数量;否则,对可由施工单位自行编制施工组织设计方案, 且无须组织专家论证的,按以下原则处理;
- ① 其工程數量在编制工程量清单时可为暂估量,并在编制说明中注明。办理结 算时,按批准的施工组织设计方案计算。
  - ② 以"项"增补计量单位,由投标人根据施工组织设计方案自行报价。
- (3) 对应现浇混凝土的模板项目,要按照浙建站计[2013]63 号文件规定的原则执行。
  - 4) 措施项目清单

措施项目包括施工技术措施、施工组织措施。

措施项目设置,首先应参考权建工程的施工组织设计,以确定安全文明施工、材料的二次搬运等项目。其次参阅工程施工技术方案,以确定夜间施工,大型机械进出场及安拆、脚手架,混凝土模板与支架,施工排水、降水等项目。另外,还可参阅相关的施工规范及施工验收规范,以确定施工技术方案没有表述,但为了达到施工规范及施工验收规范要求而必须发生的技术措施。措施项目还包括招标文件中提出的某些必须通过一定的技术措施才能实现的要求,设计文件中一些不足以写进技术方案但是需通过一定的技术措施才能实现的内容。市政工程常见的措施项目详见表8-1。

表 8-1 市政丁程措施项目表

类 别	序 号	措施项目名称
	1	安全文明施 [
	2	冬季、雨季施工
组	3	夜间施工
织	4	二次搬运
措施	5	已完 □程及设备保护
项	6	行车、行人干扰
В	7	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	8	提前竣工措施 ,
	9	优质工程增加措施
	10	大型机械设备进出场及安拆
	П	施工排水、降水
技	12	制堰
术	13	便道、便桥
持	14	混凝上模板及支架-
施	15	脚手架
项	16	便道
FI	17	便桥
	18	制内临时设施
	19	处理、监测、监控

# 知识链接,

根据浙建站计[2013]64 号文件 关于《浙江省建设工程费用定额》(2010 版) 费用项目及费率调整的通知、在施工组织措施费项目中增加工程定位复测费项目和 特殊地区增加费项目。

根据浙建站计[2014] 31 号文件——关于印发《建设工程工程量计算规范》(2013 版)浙江省补充规定(二)的通知、市政专业工程补充了以下措施清单项目:提前竣工 措施、工程定位复测、特殊地区施工增加措施、优质工程增加措施。

根据建建发[2015] 517 号文件——关于规范建设工程安全文明施工费计取的通【参考图文】 知,在《浙江省建设工程施工费用定额》(2010版)中安全文明施工费(以下简称"基 本费")的基础上增加施工扬尘污染防治增加费、创安全文明施工标准化工地增加费 (以下简称"创标化工地增加费"),基本费、施工扬尘污染防治增加费和创标化工地 增加费三项费用合并为安全文明施工费。





措施项目清单为可调整清单。对招标文件中所列措施项目、投标人可根据企业



自身特点做适当的变更增减。投标人要对拟建工程可能发生的措施项目和措施费用 整体考虑、清单计价一经报出,即被认为包括了所有应该发生的措施项目的全部费 用。如果报出的清单中没有列项,而施工中又必须发生的项目,业主有权认为其已 综合在分部分项工程量清单的综合单价中。将来措施项目发生时、投标人不得以任 何借口提出索赔或调整。

- 5) 其他项目清单及相关明细表 其他项目清单中的项目应根据拟建工程的具体情况列项。
- (1) 暂列金额:应根据下程特点按有关计价规定估算。
- (2) 材料(工程设备)暂估价: 应根据工程造价信息或参照市场价格估算。

# 知识链接



工程造价信息是工程造价管理机构根据调查和测算发布的建设工程人工、材料、 工程设备、施工机械台班的价格信息,以及各集工程的造价指数、指标。

工程造价指数是反映一定时期的工程造价相对于某一固定时期的工程造价变化 程度的比值或比率,包括按单位或单项工程划分的造价指数,按工程造价构成要素 划分的人工、材料,机械等价格指数

- (3) 专业工程暂估价: 应分不同专业, 按有关计价规定估算。
- (4) 计日工: 应列出项目名称、计量单位和暂佔数量。
- (5) 总承包服务费: 应列出服务项目及其内容。

#### 8.2.5 招标工程量清单的编制步骤

- (1) 按《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013)的规定,根据拟定的 招标文件、建设工程设计文件及相关资料,根据施工现场情况、地勘水文资料、工 程特点及常规施工方案,列出分部分项清单项目,并确定清单项目的项目特征,明 确清单项目编码。
- (2) 按照《市政工程工程量计算规范》(GB 50857—2013)规定的计算规则、计量单位计算分部分项清单项目的工程量。
  - (3) 按分部分项 L程量清单与计价表的统一格式,编制该清单。
- (4)结合 L程的实际情况,根据常规的施工方案,列出施工技术措施清单项目, 并确定清单项目的项目特征,明确清单项目编码。
- (5)按照《市政工程工程量计算规范》(GB 50857—2013)规定的计算规则、计量单位计算技术措施清单项目的工程量。
  - (6) 按施 [ 技术措施项目清单与计价表的统一格式,编制该清单。
- (7)结合工程的实际情况,根据相关的施工规范及有关规定,列出施工组织措施 清单项目,并确定清单项目编码。

- (8) 按施工组织措施项目清单与计价表的统一格式,编制该清单。
- (9)按照拟定的招标文件要求,明确暂列金额、材料或专业工程暂估价、计目工的项目及数量、总承包服务的内容等,并按统一格式编制其他项目清单与计价表及相关的明细表。
  - (10) 编制工程量清单说明、扉页、封面。

# 8.3 工程量清单计价的基本知识

#### 8.3.1 工程量清单计价的概念

工程量清单计价是指计算完成工程量清单所需的全部费用,包括分部分项工程项目费、 措施项目费、其他项目费、规费、税金。

建设工程工程量清单计价涵盖了建设工程发承包及实施阶段从招投标活动开始到工程 竣工结算办理的全过程,包括:工程量清单招标控制价的编制、工程量清单投标报价的编 制、工程合同价款的确定、工程计量与价款支付、工程价款的调整、合同价款中期支付、 工程竣工结算及支付、合同解除的价款结算及支付、合同价款争议的解决等。

#### 8.3.2 工程量清单投标报价的编制依据

投标报价是指投标人投标时响应招标文件要求所报出的对己标价工程量清单汇总后标明的总价。

- (1) 现行工程计量、计价规范。
- (2) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法。
- (3) 企业定额,国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法。
- (4) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要。
- (5) 建设工程设计文件及相关资料。
- (6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计或施工方案。
- (7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料。
- (8) 市场价格信息或工程诰价管理机构发布的工程诰价信息。
- (9) 其他相关资料。

#### 8.3.3 工程量清单投标报价文件的组成及格式

工程量清单投标报价文件应采用统 格式,由下列内容组成:封面,扉页,说明,工程项目投标报价汇总表,单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表,分部分项工程量清单与计价表,工程量清单综合单价计算表,施工技术措施项目清单与计价表、组织措施



项目清单与计价表,措施项目清单综合单价计算表,其他项目清单与计价汇总表,暂 列金额明细表、材料暂估价表、专业工程暂估价表、计日工表、总承包服务费计价表, 主要工目价格表、主要材料价格表、主要机械台班价格表。



工程量清单投标报价各组成内容的具体格式可扫二维码查阅。



#### 特别提示

編制工程量清单、工程量清单计价时,"分部分项工程量清单与计价表"的表格 样式是相同的,在編制工程量清单时,只需填写清单项目編碼、项目名称、项目特 征、计量单位、工程量;在編制工程量清单计价时,需计算项目单价、项目合价以 及其中人工费及机械费。

#### 8.3.4 工程量清单投标报价的编制要求

#### 1. 一般规定

- (1) 投标报价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。
- (2) 投标人应根据规范的规定自主确定投标报价。
- (3) 投标报价不得低于成本价(1)
- (4) 投标人必须按招标工程量清单填报价格,项目编码、项目名称、项目特征、 计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。
  - (5) 投标人的投标报价高于招标控制价的应予废标。
- (6) 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目,投标人 均应填写且只允许填写一个报价。未填写单价和合价的项目,可视为此项费用已包含在已标价工程量清单中基他项目的单价和合价中。
- (7) 投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额。致。

# 知识链接

招标控制价是招标人根据国家或省级、行业建设行政主管部门颁发的计价依据、 计价方法以及拟定的招标文件和招标工程量清单,结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价。

招标控制价编制的一般规定如下。

- (1) 国有资金投资的建设工程招标、招标人必须编制招标控制价。
- (2) 招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制和复核。
- (3)工程造价咨询人接受招标人委托编制招标控制价,不得再就同一工程接受投标人委托编制投标报价。
- (4) 招标控制价应依据国家或省级、行业建设行政主管部门颁发的计价定额、计价方法、工程造价管理机构发布的工程造价信息(当工程造价信息没有发布时,参照

市场价),建设工程设计文件及相关资料、拟建的招标文件及招标工程量清单、与拟建项目相关的标准规范及技术资料、施工现场情况、工程特点及常规施工方案等编制,不得上调 或下浮。

- (5) 当招标控制价超过批准的概算时,招标人应将其报原概算审批部门审核。
- (6) 招标人应当在发布招标文件时公布招标控制价、同时应将招标控制价及有关资料 报送工程所在地或有该工程管辖权的行业管理部门工程造价管理机构备查。

#### 2. 工程量清单报价的编制要求

1) 封面、扉页

应按统一格式规定的内容填写、签字、盖章, 出承包人自行编制的投标报价外, 受委托编制的投标报价, 由造价员编制的应由负责审核的造价工程师签字、盖章, 并由工程造价咨询人盖章。

投标总价金额分别按小写、大写格式填写。工程名称按招标文件中工程的名称填写。

2) 总说明

投标报价总说明应包括下列内容。

- (1) 投标报价包括的工程内容。
- (2) 编制依据,并明确取费基数、工程类别、各项费率、人工材料机械价格取定等。
- (3) 工程质量等级、投标工期、环境保护要求等。
- (4) 拟定的主要施工方案, 优越于招标文件中技术标准的备选方案的说明。
- (5) 其他需说明的问题。\_\_\*
- 3) 工程项目投标报价汇总表
- (1) 表头工程名称按招标文件的招标项目名称填写。
- (2) 表中单项/单位工程名称应按单项/单位工程投标报价汇总表表头的工程名称填写。
- (3) 表中会貓按单师/单位工程投标报价汇总表的合计会额填写。
- 4) 单位工程投标报价计算表
- (1) 表头的工程名称为单位工程名称。
- (2)表中的金额分别按分部分项工程量清单与计价表、措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价表的合计金额填写,规费、税金按《浙江省建设工程施工费用定额》(2010 版)规定程序计算的金额填写。
  - 5) 分部分项工程量清单与计价表
- (1) 分部分项工程项目应根据招标文件和招标工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算。
- (2) 综合单价中应包括招标文件中划分的应由投标人承担的风险范围及其费用,招标文件中没有明确的,应提请招标人明确。
  - (3) 招标工程量清单中提供了暂估单价的材料或工程设备,按暂估的单价计入综合单价。
- (4) 表中的综合单价应与 L程量清单综合单价计算表或 L料机分项表中相应项目的综合单价一致。
  - (5) 表中的合价 清单项目 L程数量×相应的综合单价。
  - 6) 工程量清单综合单价计算表及工料机分析表



清单项目的项目名称、项目编码、计量单位、工程数量应与招标工程量清单一致, 并根据招标工程量清单中的项目特征确定清单项目的组合工作内容,按规范要求计算综合单价。

# 知识链接

台班的消耗量。

综合单价计算步骤如下所述。

- (1)根据工程量清单项目名称和项目特征,结合拟建工程的具体情况、结合施工方案 或施工组织设计,根据套用的预算定额或企业定额、参照《浙江省建设工程工程量清单计价指引》(市政工程),分析确定清单项目所包括的全部组合工作内容、并确定各项组合工作内容紊用的定额子目。
- (2) 计算清单项目各项组合工作内容工程量,按套用的预算定额或企业定额的工程量 计值规则进行计算。
- 订并规则近行订身。 (3) 根据套用的预算定额或企业定额、确定各项组合工作内容人工、材料、施工机械
- (4) 依据市场价格或参照省、市工程造价管理机构发布的价格信息,结合工程实际分析确定人工、材料、施工机械台班的单价。
  - (5) 计算各组合工作内容 1 个定额计量单位的人工费、材料费、施工机具使用费。
- (6) 根据《浙江省建设工程施工费用定额》(2010 版), 并结合工程实际情况、市场竞争情况、确定企业管理费、利润、风险的费率、计算各组合工作内容 1 个定额计量单位的企业管理费、利润、风险费用。
- 企业管理费、利润、风险费用均按取费基数乘以相应的管理费费率、利润率、风险费 率计算。

取费基数为"人工费+机械费"。

(7)合计清单项目各组合工作内容的人工费、除以清单项目的工程量、计算出 1 个规定计量单位清单项目的人工费。

各组合工作内容的人工费等于该组合工作内容 | 个计量单位的人工费乘以其(定额)工程量。

- (8) 按同样的方法计算出 1 个规定计量单位清单项目的材料费、机械使用费、企业管理费、利润、风险费用。
- (9)合計1个規定計量单位清单项目的人工费、材料费、施工机具使用费,以及企业管理费、利润、风险费用,即为该清单项目的综合单价。
- 【例 8-2】 某道路 L程, 为城市支路,招标 L程量清单中提供的"挖一般土方(三类土)" 清单项目的工程量为 8 707.1m³, 计算该清单项目的综合单价。

【解】按照综合单价的计算步骤进行计算。

(1) 确定施工方案、确定该清单项目包括的组合工作内容及套用的定额子目 若某投标单位施工方案考虑主要采用挖掘机挖土并装车、占总方量的95%,余下的5%。

若某投标单位施工方案考虑主要采用挖掘机挖土并装车,占总方量的 95%,余下的 5% 用人工开挖。 则该清单项目应该由 2 项组合工作内容: 挖掘机挖土并装车(三类土)、人工挖土方(三类土), 其套用的定额子目分别为[1-60]、[1-2]

(2) 计算各组合工作内容工程量

挖掘机挖土并装车工程量=8 707.1×95% ≈ 8 271.75(m3)

人工挖土方工程量=8 707.1×95% ≈ 435.36(m3)

(3) 确定组合工作内容人、材、机的消耗量及单价

该某投标单位按《浙江省市政工程预算定额》(2010版)确定人、材、机的消耗量及单价。

(4) 计算各组合工作内容 1 个定额计量单位的人工费、材料费、施工机具便用费见表 8-2。

其中、挖掘机挖土并装车(三类土) 定额计量单位为1000m3

所需的人工费=192.00 元

所需的材料费=0.00元

所需的机械费=3 620.08 元

人工挖土方(三类土) 定额计量单依为100m3

所需的从工费=681.60 元

所需的材料费=0.00元

所需的机械费=0.00 元

(5)确定企业管理费、利润、风险的费率、计算各组合工作内容 1 个定额计量单位的企业管理费、利润、风险费用。

查《浙江省建设工程费用定额》(2010 版)可知城市支駱为三类道路工程、企业管理费的费率弹性范围为16.98%~22.63%,利润的费率弹性范围为9.00%~15.00%。

该投标单位自主确定企业管理费的费率为 20%, 利润的费率为 15%, 风险费用的费率为 3%。

见表 8-2

其中,挖掘机挖土并装车(三类土) 定额计量单位为1000m3

管理费=(192.00+3 620.08)×20%=762.42(元)

利润=(192.00+3 620.08)×15%=571.81(元)

风险费用=(192.00+3 620.08)×3%=114.36(元)

人工挖土方(三类土) 定额计量单位为 100m3

管理费=(681.60+0.00)×20%=136.32(元)

利润=(681.60+0.00)×15%=102.24(元)

风险费用=(681.60+0.00)×3%=20.45(元)

- (6) 合计清单项目各组合工作内容的人工费,除以清单项目的工程量,计算出1个规定计量单位清单项目的人工费。并按同样的方法计算出1个规定计量单位清单项目的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用见表8-2。
  - ① 该清单项目合计的人工费 192×8.271 75+681.60×4.353 6 4 555.59(元)

挖一般土方  $1\text{m}^3$  的人工费 $-\frac{4555.59}{8707.10}$ =0.52(元)



- ② 访清单项目合计的材料费=000元
- 挖一般上方 1m3 的材料费 0.00 元
- ③ 该清单项目合计的机械费=3 620.08×8.271 75+0.00×4.353 6=29 944.40(元)
- 挖一般土方  $1\text{m}^3$  的机械费= $\frac{29\,944.40}{8\,707.10}$ =3.44(元)
- ④ 该清单项目合计的管理费=762.42×8.271 75+136.32×4.353 6=6 900.03 (元)
- 挖一般土方  $1\text{m}^3$  的管理费= $\frac{6\,900.03}{8\,707\,10}$ =0.79(元)
- 或 挖一般土方 1m3 的管理费=(0.52+3.44)×20%=0.79(元)
- ③ 该清单项目合计的利润=571.81×8.271 75+102.24×4,353 6=5 174.98 (元)
- 挖一般土方 1m3 的利润= 5174.98 =0.59(元)
- 或 挖一般土方 1m3 的利润=(0.52+3.44)×15%=0.59(元)。
- ⑥ 该清单项目合计的风险费用=114.36×8.271 75+20.45×4.353 6=1 034.99 (元)
- 挖一般土方  $1\text{m}^3$  的风险费用= $\frac{1034.99}{8707.10}$ =0.12(元)
- 或 挖一般土方 1m3 的风险费用=(0.52+3.44)×3%=0.12(元)
- (7)合计1个规定计量单位清单项目的人工费、材料费、施工机具使用费以及企业管理费、利润、风险费用、即为该清单项目的综合单价

挖一般土方清单综合单价=0.52+0.00+3.44+0.79+0.59+0.12=5.46(元)

表 8-2 工程量清单综合单价计算表

单位	(专业)工程名称: 某城市支路工程	

第1页 共1页

序		La Ville			_1>/	_	综合	单 价/:	元		-
号			***	EE	人工表	材料费	机械费	管理费	利润	费用	- en
1	040101 001001	挖一般上方	m³	8 707.1	0.52	0.00	3.44	0.79	0.59	0.12	5.46
	1-60	挖掘机挖土 并装车(三 类土)	1 000 m <sup>3</sup>	8.271 75	192.00	0.00	3 620.08	762.42	571.81	114.36	5 260.67
	1-2	人工挖土方 (三类土)	100 m <sup>3</sup>	4.353 6	681.60	0.00	0.00	136.32	102.24	20.45	940.61

#### 7) 施工技术措施项目清单与计价表、组织措施项目清单与计价表

招标工程量清单中招标人提出的措施项目清单是根据一般情况确定的,而各投标人的施工技术水平、采用的施工方法、拥有的施工装备等有所差异,投标人投标时应根据自身编制的投标施工组织设计或施工方案确定措施项目,对招标人提供的措施项目进行调整,可增加措施项目,但不得删除不发生的措施项目。投标人增加的措施项目,应填写在相应的措施项目之后,并在序号栏中以"增××"表示、"××"为增加的措施项目产号。自

- 01 开始顺序编号: 不发生的措施项目, 金额以零计。
- (1) 施工技术措施项目应根据招标文件和招标工程量清单项目中的特征描述确定综合 单价计算。其综合单价的计算方法与分部分项清单项目综合单价的计算方法相同。

(2) 组织措施项目金额应根据招标文件及投标施工组织设计或施工方案,按规范规定自主确定。

8) 措施项目清单综合单价计算表及工料机分析表

编制要求与工程量清单综合单价计算表及工料机分析表相同。

- 9) 其他项目清单与计价表及相关明细表
- (1) 暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写。
- (2) 材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价。
- (3) 专业工程暂估价按招标工程量清单中列出的金额填写。
- (4) 计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量,自主确定综合单价并计算计日 工金额。
  - (5) 表中总承包服务费应根据招标工程量清单中列出的内容和提出的要求自主确定。

#### 8.3.5 工程量清单投标报价的编制步骤

工程量清单投标报价编制的主要步骤为:分部分项工程量清单计价→技术(单价)措施项目清单计价→组织措施项目清单计价→其他项目清单计价→合计工程造价。

#### 1. 分部分项工程量清单计价

分部分项工程量清单计价应根据招标工程量清单进行。由于分部分项工程量清单是不可调整的闭口清单,分部分项工程量清单与计价表中各清单项目的项目名称、项目编码、工程数量等必须与程标工程量清单中的分部分项工程量清单完全一致。

分部分项工程量清单计价的关键是确定分部分项工程量清单项目的综合单价。

分部分项工程量清单项目综合单价的计算步骤如上"知识链接"所述。计算完成后形成分部分项清单项目综合单价计算表。

# 特别提示

清单项目的工程量是按清单的计算规则计算的,清单项目组合工作内容的工程量是按 定额的计算规则计算的,两者要注意区别。另外,清单工程量与定额(报价)工程量的计量 单位有可能是不同的,也要注意区别。

分部分项 L程量清单项目综合单价计算完成后,可进行分部分项 L程量清单费用的计算,形成分部分项 L程量清单与计价表。

分部分项 [ 程量清单项目费 Σ 分部分项 [ 程量清单项目合价

-Σ(分部分项 L程量清单项目的 L程数量×综合单价)(8-1)

#### 2. 措施项目清单计价

措施项目清单计价应根据招标文件提供的措施项目清单进行。由于措施项目清单是可



调整的清单,所以在措施项目清单计价时,企业可根据 L程实际情况、施工方案等增列措施项目,不发生的措施项目,金额以零计价。

措施项目清单计价分为施工技术(单价)措施项目计价和施工组织(总价)措施项目计价。

1) 施工技术(单价)措施项目计价

施工技术措施清单项目工程量计算及其综合单价的计算确定,是技术措施项目清单计价的关键。

施工技术措施项目清单计价的步骤如下。

- (1)参照措施项目清单,根据工程实际情况及施工方案,确定施工技术措施清单项目。如某水泥混凝土路面工程施工方案考虑道路挖方主要采用挖掘机施工、人工辅助开挖,填方采用压路机碾压密实,水泥混凝土路面浇筑时采用钢模板。那么,该道路工程施工时,施工技术措施项目有挖掘机、压路机等大型机械进出场及安拆、混凝土路面模板。
- (2) 根据《市政工程工程量计算规范》(GB 50857—2013)和《浙江省建设工程工程量清单计价指引》(2010 版),结合施工方案,确定施工技术措施清单项目所包含的工程内容及其对应的定额了目,按定额计算规则计算施工技术措施项目所包含的工程内容的定额工程量(报价工程量)。

如某水泥混凝土路面工程按施工方案考虑计取挖掘机、压路机进出场各 1 个台次,混 凝土路面模板工程量按定额计算规则计算模板与路面混凝土的接触面积。

(3) 确定人工、材料、机械单价。

人工、材料、机械单价可由企业参照市场价、信息价值主确定。

(4) 确定企业管理费、利润费率,并考虑风险费用。

先确定工程类别。然后参照《浙江省建设工程施工费用定额》(2010 版)确定企业管理 费、利润费率、并根据企业自身情况考虑风险费用。

(5) 计算施工技术措施清单项目综合单价。

施工技术措施清单项目综合单价计算方法与分部分项工程量清单项目综合单价计算方 法相同。

计算完成后形成施工技术措施项目清单综合单价计算表。

(6) 合计施工技术措施清单项目费用。

施工技术措施清单项目费= ∑施工技术措施清单项目合价

=∑(施工技术措施清单项目的工程数量×综合单价) (8-2)

计算完成后形成施工技术措施项目清单与计价表。

2) 施工组织(总价)措施项目计价

施工组织(总价)措施项目费用按取费基数乘以相应费率计算。

(1) 计算取费基数。

(2)根据工程实际情况、参照《浙江省建设工程施工费用定额》(2010版)由投标单位自行确定各项施工组织措施的费率。

# 特别提示

投标报价时,各项组织措施费的费率是由投标单位自行确定的、但必须遵守相关的计价规则、计价规定。如安全文明施工费必须计取且不得低于《浙江省建设工程施工费用定额》(2010 版)的下限报价。

編制招标控制价时,各项组织措施费的费率按《浙江省建设工程施工费用定额》(2010 版)的中值编制。

(3) 计算各项组织措施费用、合计。

施工组织措施清单项目费= 5 各项施工组织措施费

计算完成后, 形成施工组织措施项目清单与计价表。

合计施工技术措施清单项目费用、施工组织措施清单项目费用,形成措施项目清单计价表。

#### 3. 其他项目清单计价

其他项目清单与计价表中各项费用按如下计算或填写。

- (1) 表中暂列金额应按招标人提供的暂列金额明细表的数额填写。
- (2) 表中专业工程暂估价金额应按招标人提供的专业工程暂估价表的数额填写。
- (3) 表中总承包服务费金额应按总承包服务费计价表中的合计金额填写。
- (4) 表中计日工金额应接计日工表中的合计金额填写。
- (5) 总承包服务费计价表。

根据分包专业工程或分包人供应材料的服务内容,确定相应的费率,并计算相应的费 用金额。

- (6) 计目工表。
- ① 表头的工程名称以及表中的序号、名称、计量单位、数量应按业主提供的计日工表的相应内容填写。
  - ② 表中的综合单价参照分部分项 L程量清单项目综合单价的计算方法确定。
  - ③ 表中合价=数量×综合单价。
  - 计算完成后, 形成其他项目清单与计价表及相关明细表。

#### 4. 合计工程造价

按《浙江省建设工程施工费用定额》(2010 版)规定的费用计算程序计算规费、税金,并合计工程造价。

(1) 规费 取费基数×费率 (8-4)

规费的取费基数与施工组织措施费的取费基数相同。

规费费率按照《浙江省建设工程施工费用定额》(2010版)规定计取。

(2) 税金 (分部分项 工程量清单项目费+措施项目清单费+其他项目清单费+规费)>费率

(8-5)

税金费率根据《浙江省建设工程施工费用定额》(2010版)规定计取。

其他项目清单费+规费+税金

(8-6)

计算完成后,形成单位(专业)工程投标报价计算表、工程项目投标报价汇总表。

- 5. 编制投标报价说明
- 6. 编制投标报价封面、扉页

按规定格式编制投标报价封面、扉页,完成投标报价文件的编制。

# ( 思考题与习题 )

- 1. 什么是工程量清单?
- 2. 什么是招标工程量清单? 什么是已标价工程量清单? 两者有何区别?
- 3. 招标工程量清单由哪几部分组成?
- 4. 清单项目的项目编码由几位数字组成? 可分为几级编码?
- 有平项目的项目编码由几位数于组成:
   进行清单项目编码时,应注意什么?
- 6. 清单项目的项目特征重要吗? 描述项目特征时应注意什么?
- 7. 措施清单项目分为哪两类?这两类措施清单项目在编制招标工程量清单时,要求一 样吗?
  - 8. 简述招标工程量清单编制的基本步骤。
  - 9. 招标工程量清单的编制说明应包括哪些内容?
  - 10. 什么是工程量清单计价?
  - 11. 什么是投标报价? 什么是招标控制价?
  - 12. 工程量清单投标报价文件由哪几部分组成?
- 13. 工程量清单投标报价时,是否可以根据工程实际情况调整招标文件中的分部分项工程量清单与计价表?
- 14. 工程量清单投标报价时,是否可以根据工程实际情况调整招标文件中的措施项目 清单与计价表?
  - 15. 工程量清单投标报价时,如何计算清单项目的综合单价?
  - 16. 工程量清单投标报价文件的编制说明应向括哪些内容?
- 17. 菜城市次干路工程,采用 250mm×250mm×50mm 人行道板、2cmM7.5 砂浆垫层, 下设 12cm 厚 C15 人行道混凝土基础, 施工时采用现浇现拌混凝土,拌和后,混凝土用机 动翻斗车运至施工点,平均运输距离为 200m。"人行道块料铺设" 清单项目的编码,工程 暨见表 8-3,它的三项组合工作内容:人行道板安砌、人行道基础、混凝土(热料)场内运输 的工程量、套用的定额产目见表 8-3,计算滤清单项目的综合单价。
- 人、材、机的单价均接预算定额的单价计取,管理费、利润的费率接城市次干路工程 弹性费率范围的中值计取,风险费用的费率为 5%。

表 8-3 工程量清单综合单价计算表

单位(专业)工程名称: 某城市次干路工程

第1页 共1页

序号		C		12	△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △							
					ene.v	THE A	14.45 M.E.A.	ور فروط را	** Normalin	長用	- mit	
1	040204 001002	人行道块料铺设	m <sup>2</sup>	2 000								
	2 215	250mm×250mm× 50mm 人行道板 安砌、2cmM7.5 砂浆垫层	100m <sup>2</sup>	19.00				11				
	2 211 + 2 212×2	12cm 厚人行道混 凝土基础(C15 现 浇现拌混凝土)	100m²	19.00		, /-		,				
	1 319	机动翻斗车运输 混凝土,运距 200m	10m <sup>3</sup>	22.8	1/1							

# 第9章

# 土石方工程清单计量与 计价




### 本章学习要点

- 1. 上石方工程清单项目的工程量计算规则、计算方法。
- 2. 定额计价模式下土石方工程的计量与计价的步骤、方法。
- 3. 清单计价模式下土石方工程的计量与计价的步骤、方法。

# 引言

某段雨水管道平面图、管道基础图如下、管道沟槽开挖采用挖掘机在沟槽边挖土、土 质为三类土、沟槽边坡取 1:0.5。计算 Y1~Y4 管道挖沟槽土方的清单工程量、定额工程 量。该段管道挖沟槽土方的清单工程量、定额工程量相等吗? 挖沟槽土方的清单工程量、定额工程量的计算规则有什么区别?



# 9.1.1 土石方工程清单项目设置及清单项目适用范围

#### 1. 土石方工程清单项目设置

《市政工程工程量计算规范》(GB 50857—2013)附录 A 土石方工程中,设置了3个小节 共10个清单项目: 挖一般土方、挖沟槽土方、挖基坑土方、暗挖土方、挖淤泥流砂、挖 般石方、挖沟槽石方、挖基坑石方、回填方、余方弃置。

土石方工程分部分项清单项目

各清单项目名称、项目编码、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工作内容、可组合的主要内容、对应的定额子目可参见本书附录。

#### 2. 清单项目适用范围

沟槽、基坑、一般土(石)方的划分如下:

- ① 底窗≤7m 目底长>3 倍底宽为沟槽:
- ② 底长≤3 倍底宽且底面积≤150m2 为基坑;
- ③ 超过以上范围, 为一般土(石)方。

#### 9.1.2 土石方工程清单项目工程量计算规则

#### 1. 挖一般土(石)方

工程量按设计图示尺寸以体积计算,即按原地面线与设计图示开挖线之间的体积计算。

#### 2. 挖沟槽土(石)方

工程量按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖上深度,以体积计算。

#### 3. 挖基坑土(石)方

L程量按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖上深度,以体积计算。

#### 4. 暗挖十方

T程量按设计图示断面乘以长度以体积计算。

#### 5. 挖淤泥、流砂

工程量按设计图示位置、界限以体积计算。

# 特别提示

- (1) 土方体积应按挖掘前的天然密实体积计算。
- (2) 挖土深度一般是指原地面到沟槽/基坑底的平均深度。
- (3) 土壤类别不能准确划分时、招标人可注明为综合、由投标人根据地勘报告决定报价。
- (4) 挖方清单项目的工作内容包括了土方场内平衡所需的运输费用,如需土方外运, 按"余方弃累"项目编码列项。
  - (5) 石方爆破按《爆破工程工程量计算規范》(GB 50862 2013)相关项目编码列项。
- (6) 挖方因工作面和放坡增加的工程量,是否并入各挖方工程量中,按各省、自治区、 直辖市或行业建设行政主管部门的规定实施。

# 知识链接

根据浙建站计[2013] 63 号文件,浙江省在具体贯彻实施时,应按照计算规范有关规定,将图挖沟槽、基坑、一般土石方因工作面和放坡所增加的工程量并入各土石方工程量中计算,如各专业工程清单提供的工作面宽度和放坡系数与我省现行预算定额不一致,按定额有关规定执行。

#### 6. 回填方

(1) 工程量按控方清单项目工程量加原地面至设计要求标高间的体积,减去基础、构筑物等埋入体积计算。

(2) 工程量按设计图示尺寸以体积计算。

本条计算规则适用于场地填方。

### 特别提示

回填方总工程量中若包括场内平衡和缺方内运两部分时,应分别编码列项。

回填方如需缺方内运, 且填方材料品种为土方时, 是否在综合单价中计入购买土方的 費用, 由投标人根据工程实际情况自行考虑。

回填方运距可以不描述,但应注明由投标人根据工程实际情况自行考虑。

#### 7. 余方弃置

L程量按挖方清单项目 L程量减利用回填方体积(正数)计算。

# 特别提示

余方弃置运距可以不描述,但应注明由投标人根据工程实际情况自行考虑。

【例 9-1】 某段 D500 钢筋混凝土管道沟槽放坡开挖如图 9.1 所示,已知混凝土基础宽度 B=0.88m,每侧工作面宽度 b=0.5m、沟槽边坡为 1:0.5,沟槽长 L=30m,沟槽底平均标高 h=1.000m,原地面平均标高 H=4.000m,试分别计算该段管道沟槽挖方清单工程量、定额工程量。




图 9.1 管道沟槽放坡开挖示意图

【解】根据浙江省补充规定,因工作面和放坡所增加的工程量并入土方工程量中,所以该沟槽按方清单工程量与定额工程量相等。

沟槽底 宽 W-B+2b=0.88+2×0.5-1.88(m)



沟槽边坡为1:m=1:05

沟槽平均挖深=H-h=4.000-1.000=3.000(m)

沟槽挖方 V=[W+m(H-h)]×(H-h)×L

 $=[1.88+0.5\times(4.000-1.000)]\times(4.000-1.000)\times30=304.2$ 

# 土石方工程招标工程量清单编制实例

【例 9-2】 莫市风华路十方工程、起讫桩号为 0+040~0+180、该路段内有填方、也有 挖方, 施工權断面如图 4.12 所示。于2016 年 3 月 17 日—3 月 20 日招标、十届为三举十、 余方要求外运,填方密实度要求达到 95%。根据工程图纸、编制该土石方工程的招标工程 最清单。

#### 1. 分部分项清单项目列项、编码

根据工程实际情况,确定有 3 个分部分项潜单项目: 挖一般上方(040101001001)、回 填方(040103001001)、余方弃置(040103002001)。

2. 计算确定分部分项清单项目工程量

3. 编制分部分项工程量清单与计价表

- 挖一般上方清单工程量=2 041.03m3
- 回填方清单工程量=1.474.99m3
- 余方弃置清单工程量+689.79m3
- 本道路上方工程分部分项工程量清单与计价表见表 9-1。

表 9-1 分部分项工程侧清单与计价表

7		100	- 上方工程				第1页 共1页		
序号	项目编码	項目名称	. 項目特征	1	-148	 =+	贡	贞	注
1	040101001001	挖·般土方	: 类土	m³	2 041.03				
2	040103001001	回填方	密实度 95%	m³	1 174.99				
3	040103002001	余方弃置	运距由投标人 自行考虑	m³	689.79				
			本页小计						
			合 计						



本士方 L程挖士主要采用挖掘机进行,填方密压采用压路机进行,技术措施主要考虑 大型机械进出场。

大型机械讲出场(1m3 挖掘机),项目编码: 041106001001

大型机械讲出场(压路机),项目编码: 041106001002

#### 5. 编制施工技术措施项目清单与计价表

施工技术措施项目清单与计价表见表 9-2。

#### 表 9-2 施工技术措施项目清单与计价表

单位及专业工程名称。某市风华路上方工程

207 1 767 44: 1 667

					-		_	 	
序号	UNLAN	项目名称	· 演目 	11 B	工程量	综合 作为元	货价 /元	 V元 机械集	*
1	041106001001	大型机械进 出场	1m³挖掘机	台·次		h.			
2	041106001002	大型机械进 出场	压路机	台·次:	-   -				
		1	区页小计	1. 1.					
		É	计计	1-					

#### 6. 组织措施项目列项、编码

考虑以下组织措施项目,项目名称、项目编码如下:

安全文明施工费(含施工扬尘污染防治增加费),项目编码 041109001001

工程定位复测费,项目编码 Z041109009001 >/

夜间施工增加费,项目编码 041109002001

已完工程及设备保护费,项目编码 041109007001

行车、行人干扰增加费,项目编码 041109005001

#### 7. 编制组织措施项目清单与计价表

组织措施项目清单与计价表见表 9-3。

#### 表 9-3 施工组织措施项目清单与计价表

单位及专业工程名称: 某市风华路上方工程

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	费率/%	金额/元
1	安全文明施工赞	人工费+机械费		
2	施工扬尘污染防治增加费	人工费+机械费		
3	L程定位复测费	人工费+机械费		
4	夜间施工增加费	人工费+机械费		
5	己完工程及设备保护费	人工费+机械费		
6	行车、行人干扰增加费	人工费+机械费		
	合 计			

#### 8. 其他项目清单与计价表以及相关明细表格

本例中,其他项目暂不考虑,其他项目清单与计价表以及相关明细表格按空白表格形 式编制,表格格式参见第8章。

9. 编制工程量清单说明及封面

#### 表 9-4 招标工程量清单封面

某市风华路上方工程

#### 工程量清单

招标人:		工程造价咨询人:	1:15
	(单位盖章)		(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:		法定代表人 或其授权人:	311
	(签字或盖章)		(签字或盖章)
编制人:	,	复·核 人:	
	(造价人员签字盖专用章)	11.	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	200	复核时间:	7,
	表 9.5 超	经工程是清单总说明	7

总说明

工程名称: 某市风华路上方工程

第1页 共1页

一、工程概况及工程量清单编制范围

某市风华路上为 L程,起论桩号为 0+040~0+180,该路段内有填方、也有挖方,上质为:类土,余方要求外运,填方密定度要求达到 95%。

- 二、工程量清单编制依据
  - 1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)。
  - 2. 《浙江省建设 [程工程量清单计价指引》(市政 [程)。
  - 3、《市政工程工程量计算规范》(GB 50857-2013)。
  - 4. 市政道路 L 程施 L 相关规范。
  - 5. 某市风华路上方下程施厂图。
- 三、编制说明

多余的上方外运、运距由投标人自行考虑,场内平衡的上方运输方式由投标人自行考虑。

#### 四、其他

- 1. 本工程风险费用暂不考虑,农民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险费暂不考虑,本工程无仓J 标化工程要求,本工程不得分包,本工程无暂列金额、计日工。
  - 2. 安全文明施 L费按市区 -般 L程考虑。

# 9.3 土石方工程清单计价(投标报价)实例

【例 9-4】 某市风华路上方工程,起讫桩号为 0+040~0+180,该路段内有填方、也有挖方,施工模断面如图 4.12 所示。于 2016 年 3 月 17 日 - 3 月 25 日招标、土质为三类土、余方要求外运、填方密实度要求达到 95%。根据工程图纸及招标工程量清单、编制该土石方工程的投标报价。本工程风险费用暂不考虑、农民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险费暂不考虑、本工程无创标化工程要求、本工程不得分包、本工程无暂列金额、计日工。

工程量清单计价(投标报价)的关键是分析确定各清单项目综合单价, 首先要确定施工 方案, 从而确定各清单项目的组合工作内容, 并按照各工作内容对应的定额计算规则计算 定额(报价)工程量, 再根据工程类别和《浙江省建设工程施工费用定额》(2010 版)确定管理 费、利润的费率, 确定人工、材料、机械台班单价, 最后计算各清单项目的综合单价。然后根据《浙江省建设工程施工费用定额》(2010 版)的费用计算程序计算分部分项工程量清单项目费、措施项目清单费、共和项目清单费、规费、税金、最后合计得到工程造价。

#### 1. 确定施工方案

同土石方工程定额计量与计价实例,即【例 4-30】。

- 2. 人材机单价及管理费、利润、风险费率及施工组织措施各项费率的取定
- 同土石方工程定额计量与计价实例,即【例 4-30】。

#### 3. 确定清单项目组合工作内容

参照《浙江省建设工程工程量清单计价指引 一市政工程》,结合工程实际情况,根据 工程施工方案确定各清单项目的组合工作内容、并确定每用的定额子目,见表 9-6。

#### 4. 计算各组合工作内容的定额(报价)工程量

按照相应的定额计算规则计算各组合工作内容的工程量,即报价工程量,见表 9-6。

重整额自 且是工作内容 定部平自 操作工程目示 人工挖上方(三类上) 1-2 102.05 挖一般上方(三类土) 挖掘机挖上并装4(三类上) 1-60 1 938.98 机动翻斗车运上(运距 180m 内) 1-32 1 351.24 填方 填上压路机碾压密实 1-82 1 174.99 全方弃置(运距 5km) 自卸车运上(运距 5km) 1-68+1-69×4 689.79 大型机械进出场 Im<sup>1</sup>以内挖掘机场外运输 1台次 3001 大型机械讲出场 压路机场外运输 3010 1 台次

表 9-6 清单项目组合工作内容及其定额(报价)工程量表

#### 5. 计算分部分项清单各清单项目的综合单价

填表计算分部分项 L程量清单各清单项目的综合单价, 见表 9-7。



表 9-7 工程量清单综合单价计算表

-	2及专业工程名	9位及专业工程名称; 集市风华路!方工程		ò							第一	第1页 共1页
- 4			) - m					综合单价/元	ne.			MALERIA
th tile	5	#		+	<b>#</b>	ilis	28.60	高輝景	Part Code	北	Traffe	361
-	040101001001	1 040101001001   松   次(:大:)	m <sup>3</sup>	2 041 03	0.52	0.00	3.44	0.79	0+0	0.00	5.15	10 511 30
	1-2	人「挖上方一类十	100m³	1 020 5	09 189	000	000	136 32	68 16	0 00	886 08	904 24
	1-60	挖掘机挖 类七, 装4	1 000m <sup>1</sup>	1.938 98	192.00	000	3 620.08	762.42	381.21	0.00	4 955.71	9 609.02
2	040103001001	回戒方	m	1 174.99	4.35	0.01	12 23	3.32	1.66	0.00	21.57	25 344.53
	1-82	内域压路机。填土碾压	1 000m³	1.174 99	192.00	1475	14,75~ 2 143.45	467.09	233.55	0.00	3 050.84	3 584.71
	1-32	机动翻斗车运士, 运服 200m 内	100m²	13.512.4	361.60	0000	, 876.74	247.67	123.83	00'0	1 609.84	21 752.80
3	040103002001	余方介門(起野 5km)	III I	689 79	0.00	\$0.0	10.29	2.06	1.03	0.00	13.42	9 256.98
	1 68-1 69×4	1 68-1 69×4 自卸汽车运生, 遠距 Skm 以内 1 000m3	1 000m³	0.689 79	0.00	35.40	10.288.41 2.057.68	2 057.68	1 028.84	0.00	13 410,33	9 250.31
				<=1	1		ì					45 112.81

如清单项目挖一般土方(三类土)综合单价组成中的各项费用计算如下;

人工费=
$$\frac{681.60\times1.0205+192.00\times1.93898}{2.041.03}$$
  $\approx 0.52(元)$ 

材料费=
$$\frac{0.00 \times 1.0205 + 0.00 \times 1.93898}{2.041.03} \approx 0.00(\hat{\mathcal{L}})$$

机械费=
$$\frac{0.00 \times 1.0205 + 3620.08 \times 1.93898}{2.041.03} \approx 3.44(元)$$

利润=
$$\frac{68.16 \times 1.0205 + 381.21 \times 1.93898}{2.041.03} \approx 0.40(元)$$

或: 利润=(0.52+3.44)×10% ≈ 0.40(元)

风险费用=0.00

综合单价=0.52+0.00+3.44+0.79+0.40+0.00=5.15(元/m3)

#### 6. 计算分部分项工程量清单项目费

填表计算分部分项工程量清单项目费, 见表 9-8。

表 9-8. 分部分项工程量清单与计价表

单位及 5. 少了积夕称, 史市风作路十万工程

独工市 计工程

序		- 垣目	KK	计量	VX	经合单。		其	村元
号	DIMI	名称		单位	XX	价/元		人工费	机械费
1	040101001001	拉一般上方	.类上	m¹	2 041.03	5.15	10 511.30	1 067.85	7 019.26
2	040103001001	回填方	密实度 95%	m³	1 174.99	21.57	25 344.53	5 111.68	14 365.39
3	040103002001	余方弃置	运卸 5km	m <sup>3</sup>	689.79	13.42	9 256.98	0.00	7 096.84
		本	页小计				45 112.81	6 179.53	28 481.49
		台	it				45 112.81	6 179.53	28 481.49

表中: (1) 综合单价根据分部分项工程量清单综合单价计算表填写。

- (2) 分部分项清单项目项目合价-分部分项工程量清单项目的工程数量×综合单价 (9-1)
- (3) 分部分项清单项目费 5 分部分项 「程量清单项目合价

(9-2)

#### 7. 计算施工技术措施清单项目综合单价

施工技术措施项目综合单价的计算方法与分部分项工程量清单项目综合单价的计算方法相同。

本道路上方工程施工技术措施考虑大型机械进出场,主要是  $1 m^3$  以内的履带式挖掘机 1 个台次、压路机 1 个台次,其综合单价计算见表 9 - 9 。

#### 8. 计算施工技术措施项目清单费

施工技术措施项目清单费 ∑(技术措施清单项目的工程数量×综合单价) (9-3) 施工技术措施项目清单费见表 9-10。

3 506.36

3 021.81 6 528.17

3 021.81



表 9-9 措施项目清单综合单价计算表

		0.00	Ŧ.	中国工学	人工器 村叫器	7.67005	15.5	Wfr.	美用		
Α,	041106001001 格、大學是權基則场數 台。次	₩•₩	-	516.00	1115,31	516.00 1115.31 1323.27	367.85	183.93	00 0	3 506.36	
等 水	履带式挖漏机 1m,以内场处址	台班	-	516.00	.4 115,31	516.00 1115.31 1.323.27	367.85	183.93	0.00	3 506.36	
-	2 041106001002 特、大型机械连曲场费 台・次	台•沃	-	215.00	215.00 1 022 05	1 323.27	307 65	153.83	0.00	3 021.81	
144	压路机场外运输费用	台州	-	215.00	1 022.05	215.00 1 022.05 1 323.27	307.65	153.83	0.00	3 021.81	
				40	-	91					

				100	HE		一个一种		**	息中/元	Academ
-	MILY		William Higher	S ANKEDY.		1		OCATA .	人工製	机械更	선
	041106001001	徐.	041106001001 特、大型机械进出场数 1m <sup>2</sup> 履带式控掘机 台·次	lm³履带式控編机	台·浓	_	3 506.36	3 506 36	516.00	1 323.27	
01	041106001002	华	041106001002 特、大型机械进出场费	压路机	台•次	_	3 021.81	3 021.81	215.00	1 323.27	
			本 贝	本页小引				6 528.17	731	2 646.54	
			40	17				6 528.17	731	2 646.54	

表 9-10 技术措施项目清单与计价乘

#### 9. 计算施工组织措施项目清单费

各项施工组织措施项目费用=取费基数×施工组织措施费率

(9-4) (9-5)

施工组织措施项目清单费=Σ(取费基数×各项施工组织措施费率)

取费基数为分部分项清单项目中的人工费、机械费与施工技术措施清单项目中的人工费、机械费之和。

取费基数=6 179.53+28 481.49+731+2 646.54=38 038.56(元)

本道路上方工程各项施工组织措施费费率按《浙江省建设工程施工费用定额》(2010 版)规定的费率范围中值计取。

施工组织措施费计算见表 9-11。

表 9-11 措组织施项目清单与计价表

单位及专业工程名称:某市风华路上方工程

第1前 共1前

序号	项目名称	计算基数	费率/%	金额/元
ı	安全又明施工费	人1+机械	10.61	4 035.89
2	施工扬尘污染防治增加费	人工+机械	2.00	760.77
3	工程定位复测费	. \	0.04	15.22
4	夜间施工增加费 /	<b>大 □+机械</b>	0.03	11.41
5	己完工程及设备保护费	一 人工+机械	0.04	15.22
6	行车、行人上扰增加费	人工+机械	2.50	950.96
	· · · · it	1 1		5 789.47

#### 10. 计算其他项目清单费

本道路上方工程其他项目暂不考虑,故其他项目清单费为0元。

#### 11. 计算规费、税金,并计算工程造价

(9-6)

税金=(分部分项清单项目费+措施项目清单费+其他项目清单费+规费)×费率 (9-7) L程运价=分部分项清单项目费+措施项目清单费+其他项目清单费+规费+税金 (9-8) 本道路上方工程语价计算见表 9-12。

表 9-12 单位(专业)工程投标报价计算表

单位及专业 [程名称: 某市风华路上方 [程

第1页 共1页

序号	费用名称	计算公式	金额/元
	L程量清单分部分项L程费	Σ(分部分项 L程量×综合单价)	45 112.81
其中	1. 人工费+机械费	Σ(分部分项人工费+分部分项机械费)	34 661.02
1	措施项目费	( ~)+(~.)	12 317.64
2.1	(一)施工技术措施项目费	Σ(技术措施项目 L程量×综合单价)	6 528.17
其中	2. 人工费+机械费	Σ(技措项目人工费+技措项目机械费)	3 377.54
2.2	(二) 施 L组织措施项目费	3+4+5+6+7+8	5 789.47

结表

#### 市政工程计量与计价(第三版)

序号	费用名称	计算公式	金额/元
	3. 安全文明施工费	(1+2)×10.61%	4 035.89
	4. 施 L扬尘污染防治增加费	(1+2)×2.00%	760.77
	5. 工程定位复测费	(1+2)×0.04%	15.22
	6. 夜间施工增加费	(1+2)×0.03%	11.41
	7. 已完工程及设备保护费	(1+2)×0.04%	15.22
	8. 行车、行人干扰增加费	(1+2)×2.50%	950.96
Ξ	其他项目费		0.00
四	规费	9+10	2 776.81
	9. 排污费、社保费、公积金	(1+2)×7.30%	2 776.81
	10. 农民工工伤保险费	- 1	0.00
£	危险作业意外伤害保险费	-	0.00
六	税金	(一+二+三+四+五)×3.\$77%	2 153.61
Ł	合计	1+2+3+4+5	62 360.87



从上述土石方工程分别采用定额计价模式、清单计价模式的计算过程可以得出:如果 定额相同,人材机的单价相同,组织措施项目、企业管理费、利润、风险等各项费用的费 率相同,则两种模式的计算结果是相同的。这也说明了定额计价模式、清单计价模式下建 筑安装工程费用的组成在本质上是相同的。

# (思考题与习题)

#### 一、简答题

- 1. 市政土石方工程设置了哪几个分部分项清单项目?
- 2. 清单项目中的挖沟槽土方、挖基坑土方、挖一般土方应如何区分?
- 3. 挖一般土方清单项目的工程量计算方法有哪些?
- 4. 挖一般土方清单项目与相应定额子目的工程量计算规则相同吗?
- 5. 挖沟槽(基坑)土方时,因放坡、工作面增加的土方量如何处理?
- 6. 挖沟槽土方清单项目通常包括哪些组合工作内容?
- 7. 清单计价模式下, 工程造价计算的基本步骤是什么?
- 8. 如何确定清单项目的组合工作内容?

#### 二、计算题

已知 Y2~Y3 雨水管道,管径为 D500,采用钢筋混凝土承插管、135°钢筋混凝土条形 基础,基础结构如图 9.2 所示。该设管道沟槽采用大开挖施工,已知 Y2 处原地面标高为 4.000m, 沟槽底标高为 1.500m; Y3 处原地面标高为 3.800m, 沟槽底标高为 1.410m, Y2~Y3 管段长 30m,

沟槽开挖采用挖掘机在槽边作业, 距离槽底 30cm 用人工辅助清底, 土质类别为三类土, 诚计算:

- (1) 该管道沟槽开挖的定额工程量。
- (2) 该管道沟槽开挖的清单工程量。
- (3) 该清单项目"挖沟槽土方(三类土、挖深 4m 内)"的综合单价、人、材、机单价按 2010 版预算定额取定、各项费率自行考虑。




图 9.2 管道基础图(单位: mm)


# 第10章 道路工程清单计量与计价

#### 本章学习要点

- 1. 道路工程清单项目的工程量计算规则、计算方法。
- 2. 道路工程招标工程量清单编制步骤、方法、要求。
- 3. 道路工程清单计价(投标报价)的步骤、方法、要求。

# 引言

某道路工程,长 200m. 道路横断面为 4m 人行道+18m 车行道+4m 人行道,车行道采用水泥混凝土路面,路面板块划分示意图、伸缩缝结构图如下。计算水泥混凝土路面的相关清单工程量、定额工程量、定额工程量相等吗? 有什么区别?



# 10.1 道路工程清单项目

#### 10.1.1 道路工程分部分项清单项目

《市政工程工程量计算规范》(GB 50587—2013)附录 B 道路工程中,设置了 5 个小节 80 个清单项目,5 个小节分别为:路基处理、道路基层、道路面层、人行道及其他、交通管理设施。

#### 1. 路基处理

本节主要按照路基处理方式的不同,设置了23个清单项目: 预压地基、强穷地基、振 冲密实(不填料)、掺石灰、掺干土、掺石、抛石挤淤、袋装砂井、塑料排水板、振冲密实(填 料)、砂石桩、水泥粉煤灰碎石桩、深层水泥搅拌桩、粉喷桩、高压水泥游喷桩、石灰桩、



灰土将密桩、柱锤冲扩桩、地基注浆、碾垫层、土下合成材料、排(截)水沟、盲沟。

#### 2. 道路基层

本节主要按照基层材料的不同,设置了16个清单项目:路床(槽)整形、石灰稳定土、 水泥稳定土、石灰粉煤灰土、石灰碎石土、石灰粉煤灰碎(砾)石、粉煤灰、矿渣、砂砾石、 卵石、碎石、块石、山皮石、粉煤灰三渣、水泥稳定碎(砾)石、沥青稳定碎石。

#### 3. 道路面层

本节上要按照道路面层材料的不同,设置了9个清单项目:沥青表面处理、沥青贯入 式、透层粘层、封层、黑色碎石、沥青混凝土、水泥混凝土、块料面层、弹性面层。

#### 4. 人行道及其他

本节主要按照道路附属构筑物的不同,设置了8个清单项目:人行道整形碾压、人行道块料铺设、现浇混凝上人行道及进口坡、安砌侧(平、缘)石、现浇侧(平、缘)石、检查井升降、树池砌筑、预制电缆沟铺设。

#### 5. 交诵管理设施

本节按不同的交通管理设施设置了24个清单项目。

#### 6. 其他

除上述分部分项清单项目以外,道路工程通常还包括《市政工程工程量计算规范》(GB 50587-2013)附录 A 上石方工程、J 钠筋工程中的有关分部分项清单项目。如果是改建道路工程,还包括附录 K 拆除工程中的有关分部分项清单项目。

道路工程的上石方工程清单项目主要有: 挖一般上方、挖一般石方、回填方、余方 弃置。

道路工程的钢筋工程清单项目主要有: 现浇构件钢筋、预制构件钢筋、钢筋网片。

改建道路工程的拆除工程清单项目主要有: 拆除路面、拆除人行道、拆除基层、铣刨 路面、拆除侧、平/缘/石、拆除湿凝土结构、拆除电杆等。

各清单项目名称、项目编码、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工作内容、可 组合的主要内容、对应的定额子目可参见本书附录。

#### 10.1.2 道路工程分部分项清单项目工程量计算规则

#### 1. 路基处理

路基处理方法不同,清单项目工程量计算规则及工程量计量单位不同。

- (1) 颅压地基、强夯地基、振冲密实(不填料)、上工合成材料:按设计图示尺寸以加固面积计算,计量单位为 m²。
  - (2) 掺石灰、掺干土、掺石、抛石挤淤: 按设计图示尺寸以体积计算, 计量单位为 m3。
- (3) 袋装砂井、塑料排水板、排(截)水沟、盲沟: 按设计图示尺寸以长度计算, 计量单位为 m。
- (4) 深层水泥搅拌桩、粉喷桩、高压水泥旋喷桩、石灰桩、灰上挤密桩、柱锤冲扩桩: 按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算,计量单位为m。
- (5) 振冲密实(填料): 按设计图示尺寸以桩长计算, 计量单位为 m; 或者按设计桩截面 乘以桩长以体积计算, 计量单位为 m³。

- (6) 砂石桩: 按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算, 计量单位为 m; 或者按设计桩截面乘以桩长(包括桩尖)以体积计算, 计量单位为 m³。
- (7) 地基注浆: 按设计图示尺寸以深度计算,计量单位为 m; 或者按设计图示尺寸以加固体积计算,计量单位为  $m^3$ 。
- (8) 褥垫层:按设计图示尺寸以辅设面积计算,计量单位为 $m^2$ :或者按设计图示尺寸以辅设体积计算,计量单位为 $m^3$ 。

#### 2. 道路基层

(1) 路床(槽)整形:按设计道路底基层图示尺寸以面积计算,不扣除各类井所占面积,计量单位为 ${\bf m}^2$ 。

【例 10-1】 某道路工程采用水泥混凝土路面、现施工 K0+000~K0+200 段, 道路平面 图、横断面图如图 10.1 所示, 试计算其路床整形清单工程量。



图 10.1 水泥混凝土道路平面、横断面图

【解】路床宽度=14+2×(0.2+0.1+0.4)=15.4(m)

路床长度=200m

路床整形清单工程量=15.4×200=3.080(m2)

【例 10-2】 某道路工程采用水泥混凝土路面、现施工 K0+000~K0+200 段, 道路平面图、横断面图如图 7.1 所示, 试计算其路床整形定额工程量。

【解】根据《浙江省市政工程预算定额》(2010版)第二册《道路工程》工程量计算规则规定、路床整形碾压宽度按设计道路底层宽度加加宽值计算,加宽值无明确规定时,按底层两侧各加 25cm 计算。

路床宽度 [14+2×(0.2+0.1+0.4)]+2×0.25-15.9(m)

路床长度 200m

路床整形定额工程量 15.9×200=3 180(m2)



# 特别提示

从上述计算可知,由于路床整形项目清单工程量计算規則与定額工程量计算規則不同, 其清单工程量与定額工程量是不同的。

(2) 道路基层。

不同材料的道路基层, 工程量计算规则相同, 均按设计图示尺寸以面积计算, 不扣除 各种并所占面积, 计量单位为 m<sup>2</sup>。

# 特别提示

道路基层设计截面为梯形时,应按其截面平均宽度计算面积,并在项目特征中对截面 参数加以描述。

【例 10-3】 某道路工程采用水泥混凝土路面、现施工 K0+000~K0+200 段, 道路平面 图、棒断面图如图 7.1 所示、试确定其基层清单项目名称、项目编码并计算清单工程量。

【解】本例有两层基层,基层材料、厚度不同。由 2 个道路基层的清单项目。

(1) 项目名称: 水泥稳定碎石道路基层

项目特征: 厚度 30cm、水泥含量 6%。

项目编码: 040202015001

清单工程量计算: 水稳基层宽度=14+2×0.2=14.4(m)

水稳基层长度=200m

水稳基层工程量=14.4×200=2 880(m2)

(2) 项目名称: 山皮石道路基层

项目特征: 厚度 40cm、1:1 放坡铺设

项目编码: 040202013001

清单工程量计算:塘渣基层的截面平均宽度=14+2×0.2+2×0.1+2×0.2=15.0(m)

塘渣基层长度=200m

塘渣基层工程量=15.0×200=3 000(m2)

#### 3. 道路面层

不同材料的道路面层,工程量计算规则相同,均按设计图示面层尺寸以面积计算,不扣除各种并所占面积,带平石的面层应扣除平石所占面积,计量单位为 $m^2$ 。

# 特别提示

水泥混凝土路面中的传力杆、拉杆及角隅加强钢筋的制作、安装均不包括在"水泥混凝土道路面层"清单项目中, 应按"钢筋工程"中的相关项目编码列项。

【例 10-4】 某道路工程采用水泥混凝土路面,现施工 K0+000~K0+200 段,道路平面 图、横断面图如图 10.1 所示、述计算其面层清单工程量。

【解】面层宽度-14m

面层长度 200m

而层面积=14×200=2.800(m2)

【例 10-5】 某道路工程采用沥青混凝上路面、现施工 K0+000~K0+200 段、道路平面 图、横断面图如图 10.2 所示、试计算其面层清单工程量。



【解】面层宽度=14 0.5×2=13(m)

面层长度⇒200m

面层面积=18×200=2 600(m2)

4. 人行道 平侧石及其他

(1) 人行道整形碾压: 按设计人行道图示尺寸以面积计算, 不扣除侧石、树池和各类 井所占面积, 计量单位为m2。

# 特别提示

人行道擊形碾压项目清单工程量计算规则与定额工程量计算规则不同、定额工程量计 算时要计入加宽值,清单工程量计算时不考虑加宽。

(2) 人行道块料铺设、现浇混凝土人行道及进口坡、按设计图示尺寸以面积计算,不 扣除各种并所占面积,但应扣除侧石、树池所占面积,计量单位为 m2。

【例 10-6】 某交叉道路如图 10.3 所示, 两条道路斜交, 交角为 60°, 已知交叉口一侧 人行道外侧半径  $R_1$  12m, 人行道内侧半径  $R_2$  9m, 人行道宽 3m, 侧石宽 15cm, 试计算交 叉口转弯处该侧人行道面积。

【解】该侧转弯处人行道实际铺设宽度-3-0.15-2.85(m)

人行道设计长度=
$$\frac{(12+9)}{2} \times \frac{60^{\circ}}{180^{\circ}} \pi \approx 11.00(m)$$

该侧转弯处人行道面积=2.85×11=31.35(m2)

(3) 安砌侧(平、缘)石、现浇侧(平、缘)石: 按设计图示中心线长度计算, 计量单位 为m。

# 知识链接

平侧石工程量计算方法如下。

(1) 直线段:

设计长度等于道路中线长度、按道路平面图桩号计算。

(2) 交叉口转弯处(计算至切点):

设计长度按转弯处圆弧长度计算、等于转弯半径乘以圆心角、如图 10.4 所示。

半径 
$$R_1$$
 处圆弧长度  $AB = GH - R_1\pi \frac{\alpha}{180^{\circ}}$   
半径  $R_2$  处圆弧长度  $CD = EF = R_1\pi \frac{(180^{\circ} - \alpha)}{180^{\circ}}$ 

上两式中 $\alpha$ 单位以度(°)计,交叉口转弯处平侧石总长度=AB+CD+EF+GH。




图 10.3 某交叉道路示意图 图 10.4 交叉口转弯处平侧石长度计算示意图

- (4) 检查并升降,按设计图示路面标高与原有的检查并发生正负高差的检查并的数量 计算, 计量单位为序。
  - (5) 树池砌筑: 按设计图示数量计算, 计量单位为个。
  - (6) 预制电缆沟铺设: 按设计图示中心线长度计算, 计量单位为 m。
  - 5. 交诵管理设施
  - (1) 人(手)孔井、值警亭: 按设计图示数量计算, 计量单位为座。

- (2) 电缆保护管、隔离护栏、架空走线、管内配线、减速垄;按设计图示数量计算, 计量单位为 m。
  - (3) 标杆、警示柱: 按设计图示数量计算, 计量单位为根。
  - (4) 标志板: 按设计图示数量计算, 计量单位为块。
  - (5) 视线诱导器:按设计图示数量计算,计量单位为只。
- (6) 标线:按设计图示长度计算,计量单位为m:或者,按设计图示尺寸以面积计算,计量单位为 $m^2$ 。
- (7) 标记:按设计图示数量计算,计量单位为个;或者,按设计图示尺寸以面积计算,计量单位为 $m^2$ 。
  - (8) 横道线、清除标线: 按设计图示尺寸以面积计算, 计量单位为 m2。
  - (9) 环形检测线圈、防撞筒(墩): 按设计图示数量计算, 计量单位为个。
- (10) 信号灯、数码相机、道闸机、叮变信息情报板:按设计图示数量计算,计量单位 为套。
  - (11) 设备控制机箱、监控摄像机:按设计图示数量计算,计量单位为台。
  - (12) 交通智能系统调试: 按设计图示数量计算, 计量单位为系统。

#### 10.1.3 道路工程技术措施清单项目

根据道路工程的特点及常规的施工组织设计,道路工程通常可能有以下技术措施清单项目。

#### 1. 大型机械设备进出场及安拆

工程量按使用机械设备的数量计算, 计量单位为台•次。

具体包括哪些大型机械的进出场及安拆,须结合工程的实际情况、结合工程的施工组织设计确定。

#### 2. 其他现浇构件模板

工程量按混凝土与模板接触面积计算, 计量单位为 m2。

其他现浇构件模板包括道路工程中的水泥混凝土道路面层的模板、现浇混凝土人行道 模板、现浇侧混凝土(平)石模板、现浇侧(平)石坞垮混凝土模板等。

#### 3. 便道

工程量按设计图示尺寸以面积计算, 计量单位为 m2。

# 10.2 道路工程招标工程量清单编制实例

【例 10-7】 某市风华路道路工程,为城市次干道,于 2016 年 3 月 10 日—3 月 16 日进 行工程招投标活动。风华路起论桩号为 0+560~0+800,于桩号 0+630 处与风情路正交,风



情路实施至切点外 20m, 风华路路幅宽为 34m, 风情路路幅宽 26m, 详见图 5.9 道路平面 图、图 5.10 道路标准横断面图。风华路道路结构层采用沥青混凝土面层、粉煤灰三渣基层、 塘渣垫层, 详见图 5.11 道路结构图, 风情路道路结构同风华路。已知该道路工程挖方量为 2 900m³, 填方量为 1 200m³, 土质类别为三类土。

根据工程图纸、编制该道路工程的招标工程量清单。

【解】1. 根据施工图纸、依据《市政工程工程量计算规范》(GB 50857—2013),参考 《浙江省建设工程工程量清单计价指引》(市政工程),确定分部分项清单项目的项目名称、 项目特征、项目编码、并计算其清单工程量、见表 10-1.

该道路工程的基础数据的计算同【例 5-16】

表 10-1 分部分项清单项目及其工程量计算表。

序	· 项目编码	分部分项清单项	· 原己特征	计量	计计公式	工程》
9	-	自名称	and the second	日日		F
ı	040101001001	把一般主方	三类土	-	已知	2 900
2	040103001001	回填方	三类上、场内平衡运距 200m 内	m <sup>3</sup>	已知	1 200
3	040103002001	余方弃置	运距由投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	2 900: 1 200×1.15	1 520
4	040202001001	路床整形	车行道、	m²	6 737.40+1 167.36× (0.15+0.1+0.1+0.4)	7 612.92
5	040202013001	山皮石基层	40cm 厚, 1:1 放坡铺设	in	6 737.40+1 167.36× (0.15+0.1+0.1+0.2)	7 379.45
6	040202014001	粉煤灰二流居层	30cm 厚,顶面洒水条护	m <sup>2</sup>	6 737.40+1 167.36× (0.15+0.1)× 20/30	6 931.96
7	040203003001	透层"	乳化沥青,喷油量1.1kg/m²	m <sup>2</sup>	6 737.40-1 167.36×0.3	6 387.19
8	040203003002	粘层	乳化沥青,喷油量 0.52kg/m2	m <sup>2</sup>	6 387.19×2	12 774.38
9	040203006001	沥青混凝土面层	7cm、粗粒式	m <sup>2</sup>	同透层油面积	6 387.19
10	040203006002	沥青混凝土面层	4cm、中粒式	m <sup>2</sup>	同透层油面积	6 387.19
П	040203006003	沥青混凝土面层	3cm、细粒式	m <sup>2</sup>	同透层油面积	6 387.19
12	040204001001	人行道整形碾压	人行道	m <sup>2</sup>	同基础数据中的人行 道面积	1 554.27
13	040204002001	人行道块料铺设	250mm×250mm×50mm 人行 道板人字纹安装、3cm 厚 M7.5 水泥砂浆、12cm 厚 C15 混凝土基础	m <sup>2</sup>	1 554.27-522.80×0.15	1 475.85
14	040204004001	安砌侧石	15mm×37mm×100mm C30 混凝上侧石、2cmM7.5 水泥 砂浆垫层	m	522.80+644.56	1 167.36
15	040204004002	安砌平石	30mm×30mm×12mm C30 混 凝 上平石、2cmM7.5 水泥砂 浆垫层	1	522.80+644.56	1 167.36

2. 根据工程图纸、结合相关的施工技术规范要求及常规的施工方法,确定施工技术措施消单项目的项目名称、项目特征、项目编码、并计算其消单工程量、见表 10-2。

表 10-2 施工技术措施清单项目及其工程量计算表

1000	on the department	技术措施 清单项目名称	жытар	) 计量 单位	计算公式	工程量
1	041102037001	其他现浇构件模板	粉煤灰三渣基层	m	1 167.36×0.3	350.21
2	041102037002	其他现浇构件模板	人行道混凝土基础	m²	$(240+240-60+\frac{2\pi \times 17}{4} \times 2 +20\times 2)\times 0.12$	61.61
3	041106001001	大型机械设备进出 场及安拆	lm³履带式挖掘机	台・次	X	1
4	041106001002	大型机械设备进出 场及安拆	90kW 内履带式推 土机	台·洪	K.	1
5	041106001002	大型机械设备进出 场及安拆	压路机	行。次		2
			11.11			

3. 根据工程实际情况,确定施工组织措施清单项目的项目名称、项目编码,见表 10-3。

表 10-3 施工组织措施清单项目及其工程量计算表

序号	项目编码	组织措施清单项目名称
1	041109001001	安全文明施工费
2	041109002001	<b>教</b> 间施工增加费
3	Z041109009001	工程定位复测费
4	041109005001	行车、行人干扰增加费
5	041109007001	己完工程及设备保护费

4. 编制本工程的招标工程量清单, 见表 10-4~表 10-9。

表 10-4 招标工程量清单封面

某市风华路道路工程

#### 工程量清单

				Ľ.	程道	价	
招	标	人:	1	答	询	人:	

(单位盖章)

(单位资质专用章)

#### 市政工程计量与计价(第三版)

法定代表人 或其授权人:		法定代表人 或其授权人:	
编 制 人:	(签字或盖章)	复核人:	(签字或盖章)
<b>福斯时间</b> 。	(造价人员签字盖专用章)	复核时间.	(造价工程师签字盖专用章)

#### 表 10-5 招标工程量清单总说明

总说明

#### 工程名称: 某市风华路道路 L程

第1页 共1页

一、工程概况及工程量清单编制范围

某市风华路道路上程,为城市次十道,风华路起论桩号为0\*560~0\*800,于桩号0\*630处与风情路 正交,风情路实施全切点外20m,风华路路幅宽为34m,风情路路幅宽26m。风华路道路结构层采用沥 青混凝土而层、粉煤灰三连基层、塘渣垫层。风情器罩路结构同风华路。

- 1、工程量清单编制依据
  - 1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)。
  - 2.《浙江省建设工程工程量清单让价指引》(市政工程)。
  - 3. 《市政工程工程量计算规范》(GB 50857-2013)。
  - 4. 市政道路工程施工相关规范。
  - 5、某市风华路道路。[程施 [图。
- 三、编制说明
  - 1. 该道路工程控方量为 2 900m3, 填方量为 1 200m3, 上质类别为三类上。
  - 2. 多余的上方外运、运距由投标人自行考虑: 场内平衡的上方运输方式由投标人自行考虑。
  - 3. 沥青混凝土、人行道板、平石、侧石均采用成品。

#### 四、其他

- 1. 本工程风险费用暂不考虑,农民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险费暂不考虑,本工程无仓]标化工程要求,本工程不得分包,本工程无管列金额、计日工。
  - 2. 安全文明施工费按市区一般工程考虑。

表 10-6 分部分项工程量清单与计价表

H ob	in the			- N		综合单价		集中/元	元	
	040101001001	控 版:力	· 1	· Œ	2 900:00			ľ	ı	
7	040103001001	回填方	三类土、场内平衡运取200m内	E	1 200.00					
m	040103002001	余方序置	运距由投标人自行考虑	"m	1 520,00					
4	040202001001	路床(槽)整形	4.行道	m <sup>2</sup>	7 612 92					
8	040202013001 日東石	. 1度石	40cm 月.1:1 放坡铺设	m <sub>2</sub>	7379.45					
9	040202014001	粉煤灰三谱	30cm [7, 1 样, 顶前海水靠护	m <sub>2</sub>	6 9 3 1 9 6					
-	040203003001	造原	乳化沥青,喷油每1.1kg/m2	M.	6 387.19					
ac	040203003002	料员	乳化沥青,喷油草0.52kg/m²	m	1 2774 38					
6	040203006001	沥青混凝土	7cm、租稅式 //	m <sup>2</sup>	6387.19					
2	040203006002	动并混译士	4cm, ilitizat	-uı	6 387,19					
=	040203006003	助者混凝口	3em、细粒式	m,	6 387 19					
12	040204001001	040204001001 人行道整形碾压	人行.其	m,	1 554.27					
13	040204002001	040204002001 人行道效料梯及	250mm~250mm~50mm 人行道极大学 纹安装、3cm Pl M7.5 水溶砂浆、12cm 厚C15 湿袋干等配	°E	1 475.85	W.	,			
14	040204004001	安砌侧石	15mm×37mm×100mm C30 混凝 上侧 石、2cmM7.5 水泥砂浆地层	m	1 167.36	1				
15	040204004002	交側半石	30mm×30mm×12mm C30 混凝   平行、 2cmM7.5 水泥砂浆华层	m	1 167.36					
			本页小引							
			7							



表 10-7 施工技术措施项目清单与计价表

-	1	3.000		一番		MAMA	4	一一一	19.4
A Line	- VIII on the second	AND ST	- Constant	单位		元		人工员。机械类	H.I
-	041102037001	其化规法码件税收	粉煤灰一角单层	m <sup>2</sup>	350.21				
2	041102037002	其他現影构件機板	人们道池梯上基础	m <sup>2</sup>	19.19				
m	041106001001	大型机械设备进出场及 变坏	lm <sup>3</sup> 似带式挖掘机	/s- x	-				
4	041106001002	大型机械设备进出场及 90kW 内服带式推设拆	90kW 内取带式性上机	φ. ¥.	-				
lin.	041106001003	大型机械设备进出场及 安拆	民路机	な・※	2				
			N		1				
			<b>本页小</b> :			100			
			41	``					

#### 表 10-8 施工组织措施项目清单与计价表

单位(专业) [程名称: 道路 [程 市政

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基数	蒉率/%	金額/元
1	安全文明施工费	人工费+机械费		
2	冬雨季施工増加费	人工费+机械费		
3	夜间施 工增加费	人工费+机械费		
4	己完工程及设备保护费	人工费+机械费		
5	:次搬运费	人工费+机械费		
6	行车、行人干扰增加费	人工费+机械费		
7	提前竣工增加费	人工费+机械费	,	
8	工程定位复测费	人工费+机械费	1	
9	特殊地区施工增加费	人工费+机械费		
10	其他施工组织措施费	按相关规定计算		

表 10-9 其他项目清单汇总表

**厂程名称**,市政

寫1页 共1页

and today had be	1 114.676	1 1 1 1		71174 74174
序号	项目名称	计量单位	金额/元	备注
1	暂列金额 二///,	/L	0.00	
2	暂估价	元	9.00	
2.1	材料暂估价	元元	0.00	
2.2	专业工程暂估价	<b>大</b>	0.00	
3	计日本	7/2		
4	总承包服务费			
	合 计			

注:本工程无其他清单项目,其他项目清单包括的明细清单均为空白表格。本例不再放入空白的明细 清单的表格。

# 10.3 道路工程清单计价(投标报价)实例

【例 10-8】 某市风华路道路工程,为城市次干道,于 2016年3月10日—3月16日进行工程招投标活动。风华路起讫桩号为0+560~0+800,于桩号0+630处与风情路正交,风情路实施至切点外20m,风华路路幅宽为34m,风情路路幅宽26m,详见图5.9道路平面



图、图 5.10 道路标准横断面图。风华路道路结构层采用沥青混凝土面层、粉煤灰三渣基层、 塘渣垫层, 详见图 5.11 道路结构图, 风情路道路结构同风华路。已知该道路工程挖方量为 2.900m³, 據方量为 1.200m³, + 质类别为三类+。

根据工程图纸和招标工程量清单,试按清单计价模式采用综合单价法编制该道路工程的投标报价。

本工程风险费用暂不考虑,农民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险费暂不考虑, 本工程不创标化工程要求,本工程不得分句,本工程无额列金额、计日工。

# 2 知识链接

清单计价模式下编制投标报价,需根据招标图纸、招标工程量清单,结合工程的施工方案进行,每个投标单位考虑的施工方案不同、投标报价也会不同。

本例题中道路工程的施工方案、与定额计价模式下编制投标报价相同、具体可见 【例 5-16】。

- 【解】1. 根据招标工程量清单中的分部分项工程量清单、工程图纸、结合施工方案、 参考《浙江省建设工程工程量清单计价指引》(市政工程),确定分部分项清单项目的组合 工作内容、计算各组合工作内容的定额工程器、并确定基套用的定额子目、见表 10-10.
- 2. 根据招标工程量清单中的施工技术措施项目清单、工程图纸、结合施工方案、参考 《浙江省建设工程工程量清单计价指引》(市政工程)、确定技术措施清单项目的组合工作内 容、计算各组合工作内容的定额工程量,并确定其套用的定额子目,见表10-11。
  - 3. 确定人、材、机单价,判定工程类别、确定各项费率。
- (1) 粉煤灰三渣基层单价为 120 元/m³, 塘渣垫层单价为 35 元/t, 30mm×30mm×12mm C30 混凝土平石单价为 13 元/m, 一类人工工日单价为 65 元, 二类人工工日单价为 70 元, 其他人、材、机单价按《浙江省市政工程预算定额》(2010 版)计取。
  - (2) 城市次干道为二类道路工程。
- (3)企业管理费、利润、各项组织措施费的费率按《浙江省建设工程施工费用定额》(2010版)及浙江省有关规定的费率范围的低值计取;规费、税金按《浙江省建设工程施工费用定额》(2010版)的规定计取。
  - 4. 计算清单计价模式下,本道路工程的工程造价,详见表 10-12~表 10-24。

表 10-10 分都分项清单项目的组合工作内容工程量计算表

計		01 - 40	10	<b>杂割分项清单项目所包含的组合工作内</b> 理		
	大部分 国际中国 1944年	関盟・計画	經濟學作的報名等	组合工作内容定额工程量计算式	工程	定额子目
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 0000	<b>杉畑h、だ十. // 英竹( . 美 1.)</b>	2 900 1 200-1.15	1.520m²	1 60
-	25	2 Mulin	挖掘机论十个装车(一类上)	1 200-1.15	1 380m³	1 57
-	同道方(三类上、场内平衡运	2 000	机动桶 引 ( i.e.   ( ies)!! 200m 均)	1.200×1.15	1 380m³	1 32
7	第F 200m 14)	TWW.	近十届几内然几路机	已知条件	1 200m³	1-82
ω.	余方并胄(远距由投标人自 4.考虑)	1 520m³	兵卸车运士/近68世 5km)	2 900 1 200×1.15	l 520m³	1 69 × 4
4	路床(槽)整形	7612.92m²	7612,92m <sup>2</sup> 路床碌Lk检验	6 737 40+1 167.36×(0.15-0 1+0 1+0 4 +9.25),	7 904.76m²	2 1
W)	山皮和(40cm 厚, 1:1 放坡 網设)	7 379,45m²	7.379,45m <sup>2</sup> 40cm 厚塘濟墊层	6 737,40+1 167,36×(0.15-0.1+0.1+0.2) 7 379,45m <sup>2</sup> 2 101×4 2 100×3	7 379.45m²	2 101×4 2 100×3
9	粉煤火三流(30cm 17 一样。	6 931.96m²	30cm 粉煤灰三渣基层	6 737.40+1 167.36 <(0.15-0.1) < 20	6 931.96m²	12 47 2 48×5 ×2
	项间淬水差型)		三沧华层顶面洞水养护	等于平台近面根(含字石)	6 737.40m²	2-51
-	透层(乳化沥青,喷油量11kgm²)	6 787.19m <sup>2</sup>	途层池(乳化沥青, 110kg/m²)	6 737 40-1 167 36 0.3	6 387.19m²	2-1411
90	将层(乳化沥青,喷油膏 0.52kg/m²)	12 774 38m²	吊层油(乳化沥青,052kg/m²)	6387.19×2	12 774.38m² 2 149 <sub>H</sub>	2 149 <sub>H</sub>
6	沥青混凝+(7cm 粗粒式)	6 387.19m²	6.387,19m <sup>2</sup> 7cm 组料式沥青混凝土由层	间透层油面积	6.387 I9m²	6.387 19m² 2 175+2 176
10	10 海青混凝 [ (4cm 中校式)	6 387.19m2	4cm 中拉式沥青尾猴上面层	同透层油面积	6 387.19m2	2 183
=	11 沥青混凝 1 (3cm 细粒式)	6 387.19m²	3cm 维模式沥青灌灌上面层	同透层油面积	6 387 19m²	2 191
12	12 人让近整形似床	1 554.27m²	1554.27m <sup>2</sup> 人行道整形戰陆	1 554.27+522 80×0.25	1 684.97m² 2-2	2-2



年 27

E	<b>新花田新田市</b>	A Commission of the Commission		分部分項潰阜項目所包含的組合工作內案	feii	
0	10000000000000000000000000000000000000		组合工作内容名称	组合工作内容定額工程量计算式	工程》	定额于目
	人行道块料铺设(250mm>		人行 頁 12cm 四 C15 拒款 1 体配	1 554.27 522.80 - 0.15	1 475.85m²	1 475.85m <sup>2</sup> 2 211+2 212×2
	250mm×50mm 人行道板人		机功酮斗车运输港源土(200m)	1 475.85 × 0.12	177.10m <sup>3</sup>   1 319	1 319
2	13 字纹安装、3cm F M7.5 水 1475.85m <sup>2</sup> 泥砂浆、12cm F C15 混凝 土场研)	475.85m²	250mm -250mm -50mm 人们道极人 字纹安装(3cm 序 M7.5 水池砂浆)	1 554.27 522.80 -0.15	1 475.85m² 2 215 <sub>H</sub>	2 215 <sub>H</sub>
4	安島 附 4: (15mm·37mm× 14 100mm C30 混潑于倒有,	E	15mm×37mm×100mm·C30 說該士. 個有安砌	32.80+644.56	1 167.36m 2 228	2 228
	2cmM7.5 水泥砂浆特层)		侧平有特层(2cmM7.5 水泥砂浆)   167.36×0.15×0.02	1 167,36×0,15×0,02	3.50m <sup>3</sup> 2 227	2 227
5	安朗平石i(30mm-30mm- 15 12mm C30 混凝上平石,	Е	30mm 30mm 12mm C30 混凝 上于 石安國	522,80+644,56	1 167.36m 2 230	2 230
	2cmM7.5 水說砂浆垫层)		侧十年特层(2cmM7.5 水泥砂浆) 1167.36-03-002	1 167.36-0 3-0 02	7.00m³ 2 227	2 227

表 10-11 施工技术措施清单项目的组合工作内容工程量计算表

枝木播新潘地面自名新		No.			
		组合工作内容名称	组合工作內掌定額工程量计算式	ト福祉	正即十四
其他现清构件模板(粉煤灰三清基层)	350.21m <sup>2</sup>	粉煤灰二滑基层模板	1 167,36×0.3	350.21	2 197
其他规浇构件模板(人行道混凝土基础)	61.61m²	61.61m² 人行道基础混凝土模板	$\left(240 + 240 - 60 + \frac{2\pi x}{4} \times 2 + 20 \times 2\right) \times 0.12$	61 61	2 197
大型机械设备进出场及安拆(1m <sup>3</sup> 短带式 挖掘机)	1台 次	1台 次 1m, 履带式控料机边出场 机机箱工方案确定	根據施工方案确定	-	3001
大型机械设备进机场及变折(90kW 内服带式建土机)	16.次	90kW 内限带式推上机造 出场	机塘油 1. 方案确定	-	3003
5 大型机械设备进出场及安拆(床路机)	2 台 次	2台 次 压路机边出场	根据施工方案确定	2	3010

#### 表 10-12 投标报价封面

#### 投标总价

加 你 八	
工程名称:	某市风华路道路工程
投标总价(小写):	1 674 375 ரம்
(大写):	查佰陆拾集万肆仟叁佰集拾伍元
投标 人:	
	(单位盖章)
法定代表人	
或其授权人:	
	(签字或盖章)
编制人:	
	(造价人员签字盖专用章)
编制时间:	

T.程名称: 某市风华路道路 T.程

第1页 共1页

某市风华路道路工程, 为城市次十道, 风华路起讫桩号为 0+560~0+800, 于桩号 0+630 处与风情路 正交, 风情路实施全切点外 20m, 风华路路幅宏为 34m. 风情路路幅宽 26m。

风华路道路结构层采用沥青混凝上血层、粉煤灰三流基层、塘点稳层,风情路道路结构间风华路。已知该道路工程挖方量为2900m³,填方量为1200m³,上质类别为三类上。

1、工程施工方案

一、丁程樞况

- 挖方采用挖掘机进行。多余的七方直接装车用门卸车外运、运距为5km;场内平衡的五方用机动翻斗运至临回填的路段用于回填。填方用内燃压路机扁压密实。
  - 2. 塘渣垫层采用人机配合铺筑。
  - 3、粉煤灰三流基层施工时两侧支立钢模板、顶面采用洒水养护。
- 4. 人行道基础混凝土采用现场拌和,拌和机设在桩号 0+700 处,拌制后混凝上采用机动翻斗车运 至施工点,混凝土浇筑时支立钢模板。
  - 5. 水泥砂浆采用砂浆搅拌机在施工点就地拌制。
  - 6. 沥青混凝土、人行道板、平石、侧石均采用成品。
  - 7. 沥青混凝土采用沥青摊铺机摊铺。
- 8. 配备以下大型机械: lm³ 履带式挖掘机 1 台、90kW 内履带式推上机 1 台、压路机 2 台。
- 三、人、材、机价格取定

粉煤灰: "渔基层单价为 120 元/m", 塘渣垫层单价为 35 元/t. 30mm×30mm×12mm C30 混凝上平石 单价为 13 元/m. 一类人工 L日单价为 65 元. 二类人工 L日单价为 70 元. 其他人、材、机单价按《浙 红省市政工程預算定额》(2010 版)计划。

四、费率取定

企业管理费、利润、各项组织措施费的费率按《浙江省建设工程施工费用定额》(2010 版)及浙江省 有关规定的费率范围的低值计取;规费、税金按《浙江省建设工程施工费用定额》(2010 版)的规定证取。 五、编邮依据

- 1. 《浙江省市政工程预算定额》(2010版)。
- 2. 《浙江省建设 口程施 口费用定额》(2010版)。
- 3. 浙建站计[2013]64号——关于《浙江省建设工程费用定额》(2010版)费用项目及费率调整的通知。



#### 市政工程计量与计价(第三版)

- 4. 建建发[2015]517号——关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知。
- 5. 《建设 L程 L程量清单计价规范》(GB 50500-2013)。
- 6.《浙江省建设工程工程量清单计价指引》(市政工程)。
- 7. 浙江省造价管理机构发布的信息价。

#### 表 10-14 工程项目投标报价汇总表

T 程 名称, 某市风 化路道路 T 程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额/元
1	道路工程	1 674 375.13
1.1	市政	1 674 375.13
	合 计	1 674 375.13

#### 表 10-15 单位工程投标报价计算零

单位(专业)工程名称: 道路工程-市政

第1页 共1页

- 15T &	张月上年117年117年11118	- < 1	30 L 94 - 25 L
序号	汇总内容	计算公式	金额/元
	工程量清平分部分项工程费	Σ(分部分项工程量×综合单价)	1 528 654.55
其中	1. 人 [.费+机械费	Σ(分部分项人工费+分部分项机械费)	247 092.22
:	指施项目费		68 581.38
2.1	(一) 施工技术措施项目费	按综合单价计算	32 596.95
其中	2. 人工费+机械费	Σ(技措项目人工费+技措项目机械费)	17 499.12
2.2	(二) 施工组织措施项目费	按项计算	35 984.43
	3. 安全文明施工费(含扬华污染增加费)	(1+2)×11.54%	30 533.84
	4. 冬雨季施工增加费	(1+2)×9%	0.00
	5. 夜间施工增加费	(1+2)>0:01%	26.46
	6. 己完工程及设备保护费	(1+2)×0.02%	52.92
	7. 二次搬运费	(1+2)×0%	0.00
	8. 行车、行人干扰增加费	(1+2)×2%	5 291.83
	9. 提前竣工增加费	(1+2)×0%	0.00
	10. 工程定位复测费	(1+2)×0.03%	79.38
	11. 特殊地区施工增加费	(1+2)×0%	0.00
Ξ	其他项目费	按清单计价要求计算	0.00
四	规费	12+13	19 315.17
	12. 排污费、社保费、公积金	(1+2)×7.3%	19 315.17
	13. 农民工工伤保险费	按各市有关规定计算	0.00
Ħ	危险作业意外伤害保险费	按各市有关规定计算	0.00
六	单列费用	单列费用	0.00
七	税金	( ~+=+ +:+四+五+计税不计费)×3.577%	57 824.03
八	下浮率	( -+二+ -(+四+五+六+七)×0%	0.00
ħ.	建设工程造价	+二+ :+四+五+六+七-八	1 674 375.13

# 表 10-16 分部分项工程量清单与计价表

社			<b>光热用来</b>	事故		综合单		# # ·	其中/元
olr	A THE SECTION AND ADDRESS OF THE SECTION	the state of		교육			The second	※エソ	机械费
_	040101001001	挖 殿 L.为	二条二	"m	2 900 00	4.19	12 151.00	00 668	8 642.00
2	040103001001	回境方	三类1、场内平衡运距 200m 内	"E	1 200.00	24.56	29 472.00	8 484.00	14 676.00
	040103002001	余力弃置	运野出投标人自行考虑	"EL	1 520 00	13.13	19 957.60	0.00	15 640.80
4	040202001001	路床(槽)終形	4年7道	=E	7612.92	1.64	12 485.19	1 827.10	7 993.57
20	040202013001	山茂布	40cm 厚, 1:1 放坡铺设	m <sup>2</sup>	7 379 45	32.82	242 193.55	6.715.30	16 382 38
9	040202014001	粉燥火 消	30cm 厚. 厂拌、项面两水淬护	- m	6 931.96	47.71	330 723.81	19 216.92	8 179.71
7	040203003001	透层	乳化沥青, 喷油导 1 tkg/m²	Έ.	6 387.19	5.39	34 426.95	191.62	766.46
00	040203003002	報展	乳化沥青,吸油量0.52kgm2	, m	12 774 38	2.68	34 235.34	1 021.95	1 149.69
6	040203006001	沥青粗凝土	7cm、相构式	m. <sup>3</sup>	6 387 19	45.05	287 742 91	4918.14	17 756 39
10	040203006002	沥青湘凝土	4cm、中华人	m <sub>2</sub>	6 387.19	29.01	185 292 38	3 449 08	9 644.66
Ξ	040203006003	沥青混凝土	3cm、细粒式	m <sup>2</sup>	6 387 19	24.43	156 039.05	3 385.21	9 453.04
12	040204001001	040204001001 人名道整形碾压	人们道	m <sub>2</sub>	1 554,27	1,66	2 580.09	1 834.04	186.51
13	040204002001	040204002001 人行道块料制设	250mm~250mm~50mm 人行道版人字段   安祿、3cm   F M7.5 水泥砂浆、12cm   F   C15 保護   未離	Ë	1 475.85	86.03	126 967.38	38 121.21	3 483.01
4	040204004001	安夜阆石	15mm×37mm×100mm C30 組織上側右、 2cmM7.5 水泥砂浆墊层	E	1 167.36	26.95	31 460.35	8 241.56	00.00
15	040204004002	安藏平石	30mm×30mm×12mm C30 混凝十平右、 2cmM7.5 水泥砂浆特层	Е	1 167.36	19.64	22 926.95	4 832.87	00:00
$\Box$			本页小训				1 528 654.55	133 138.00	113 954.22
1			- <					100 001 001	20 20 21 00 001 201 33 130 003 1



表 10-17 分部分项工程量清单综合单价计算表

30	单位(专业)工程名称:	道路工程一小政									第1页	页 共4页
							2	一世の一世				
5 75	:				4	athe	3-g-10-1	2	Puzh	東	of Market	maphilin.
-	100100101010	挖一般土力: :类土.	m³	2 900.00	0.31	00'0	2.98	09:0	0.30	000	4.19	12 151.00
	1-60	挖碾机挖三类上,装工	1 000m <sup>3</sup>	1.52	312.00	0.00	3 620.07	715.64	353,89	00.00	5 001.60	7 602.43
	1 57	挖塘机挖、类土, 不装车	1 000m <sup>3</sup>	138	312.00	0.00	2 265 54	469.11	231 98	0.00	3 278.63	4 524.51
7	040103001001	同玩方:一类1.场内平衡 远距200m内	É	1 200.00	7.07	0.01	12.23	3.51	1.74	0.00	24.56	29 472.00
	1 32	机功翻斗车运士, 运跑 200m 内	100m <sup>3</sup>	13.8	587.60	0.00	876.75	266.51	131 79	000	1 862.65	25 704.57
	1 82	内燃压路机, 项上碾压	1 000m <sup>3</sup>	1.2	312.00	14.75	2 143.41	446.88	220.99	0.00	3 138.03	3 765.64
6	040103002001	余方斧咒; 巡距山投标人自 行考虑	m³	1 520.00	00.00	0.04	10.29	1.87	0.93	0.00	13.13	19 957.60
	1 68+1 69×4 <sub>H</sub>	自卸汽车运士,运路 5km	1 000m <sup>3</sup>	1 52	0.00	35 40	10 288.35	1 872.48	925 95	0 00	13 122 18	19 945.71
4	040202001001	路体(槽)整形: 车行道	m²	7 612.92	0.24	0.00	1.05	0.23	0.12	0.00	1.64	12 485.19
	2 1	路朱陽凡奇點	100m²	79.047 6	22.68	00.00	100.87	22.49	11.12	0.00	157.16	12 423.12
10	040202013001	山皮右: 40cm 厚, 1:1 放 核補改	E E	7 379.45	16'0	29.64	2.22	5	0.28	0.00	32.82	242 193,55
	2 101 - 1411	人机配合轴装带液层, 厚度 25cm, J*4	100m²	73.794 5	273.00	7 210.76	546.59	149.17	73.76	0.00	8 253.28	609 046.67
	2 100~J 3 <sub>H</sub>	人机配合铺装贴造底层, 序度 20cm, J* 3	100m²	73.794 5	181.65	4 326.41	324.91	92.19	45.59 0.00	0.00	4 970.75	366 814.01

200
臣
瑟
鑑
277
な物
野山
(A)
10
東信

÷	T-12( 7 22) 1.4: 414/2: ABOTT 1.42 10.53	Just Life 1935	ı	I	I	ı	ı	ı	١	ı	CK CK	M+X X+X
E	the second second		11.00				综合	综合单价厅				
		韓	曹불	報	人工条	机料条	(1) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	製製	東京	<b>阿斯</b>	林	II II
9	040202014001	和煤灰 冷: 30cm 厚. F 拌, 顶面滴水条铲	m <sup>2</sup>	6 931.96	7.10	37.17	1.18	1.51	0.75	0.00	47.71	330 723.81
	2 47+2 48× 5 <sub>H</sub>	粉煤灰二渣炼层,厂件,原度 15cm	100m²	69,3196	352.80	1 856.30	51.50	73.58	36.39	0.00	2 370.57	164 326.96
	2 47+2 48× 5 <sub>H</sub>	粉煤灰、渣垢层,厂件,厚 度 15cm	100m²	9618'69	352,80	1 856.30	51.50	73.58	36.39	000	2 370.57	164 326.96
	2 51	清水午湖水	100m²	67.374	4.90	4.35	15.32	3.68	1.82	00.00	30.07	2 025.94
7	040203003001	透层: 乳化沥青, 喷油量1.1kg/m²	m <sup>2</sup>	6 387.19	0.03	5.30	0.12	0.03	10.0	0.00	5.39	34 426.95
	2 148 <sub>11</sub>	透层乳化沥青, 平烟性基层	100m²	63.8719	2.52	519.96	12,29	2.70	1.33	0.00	538.80	34414.18
90	040203003002	粘反: 乳化沥音, 喷油量 0.52kg/m²	m <sup>2</sup>	12 774.38	0.08	2.46	0,09	0.03	0.02	0.00	2.68	34 235.34
	2 150 <sub>11</sub>	料层乳化沥青, 沥青层	100m²	127,743 8	8.40	245.85	8.56	3.09	1.53	0.00	267.43	34 162.52
6	040203006001	加并混凝上: 7cm、相构式	IR <sup>2</sup>	6 387.19	0.77	40.53	2 78	>0.65	0.32	0.00	45.05	287 742.91
	2 175+2 176×1,11	机械缝轴和粒式沥青滤器 +路面,厚度7(cm)	100m²	63.871 9	76.65	4 053.26	278.22	64.59	31.94	0.00	4 504.66	287 721.19
0	10 040203006002	· 小青混凝 1: 4cm、中粒式	m <sup>2</sup>	6 387.19	0.54	26.41	1.51	0.37	0.18	0.00	29.01	185 292.38
	2-183	机械推销中拉式沥青混散 十路面,厚度 4cm	100m²	63 871 9	53.90	2 640.80	150.76	37,25	18.42	000	2 901.13	185 300.69
=	11 040203006003	沥青混凝土: 3cm、细粒式	rn <sup>2</sup>	6 387.19	0.53	21.87	1 48	0.37	0 18	000	24 43	156 039.05
	2 191	机械裸铺细粒式沥青混凝 1路面,厚度3cm	100m²	63.871 9	53.20	2 187.33	148.48	36.71	18 15	00 0	2 443.87	156 094.62

第3页 共4页

单位(专业)工程名称; 道路工程 由政

							400	一世の日本の				
И								7. 3118 Warm				Contract of the Contract of th
e ile	1			ik.	人工業	Uhhate	Same?	4		東田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田		
12	040204001001	人句.童幣杜.···································	m²	1 554 27	1.18	0.00	0.12	0.24	0.12	000	1.66	2 580 09
	2.2	人行道整形編具	100m²	16.8497	108.50	0.00	81 48	21.84	10.80	0.00	152.62	2 571.60
13	040204002001	人庁遊映等職役: 250mm- 250mm-50mm 人小道板人 字校交鞍、3cm 序 M7.5 本 記砂鉄、12cm 戸 C15 混凝 1 基础	É.	1 475.85	25,83	50.17	2.36	5.13	2.54	0.00	86.03	126 967.38
	2 215H	人行道板安砌水泥砂浆鞋层, 厚度 3cm, 人行道板如 采用异型板	100m²	14.758 5	1 609.30	2 604.64	30.75	298.49	147.60	0,00	4 690,78	69 228.88
	2 211+2 212×2 <sub>H</sub>	人行燈混凝土基础, 厚度 12cm	100m²	14.758 5	850.92	2 411.88	151.93	182.52	90.26	0.00	3 687.51	54 422.12
	1-319	机动翻斗车运水泥泥罐干(熟料), 远距 200m	10m³	17.71	102.20	0.00	44.22	26.65	13.18	0.00	186.25	3 298.49
4	040204004001	安閱閱石: 15mm×37mm× 100mm C30 港港上網石, 2cmM7.5 水泥砂浆垫层	æ	1 167 36	7.06	17.97	0000	1.28	0.64	0.00	26.95	31 460.35
	2-228	混凝!例不安则	100m	11.673 6	676.90	1 745.47	0.00	123.20	60.92	00.00	2 606.49	30 427.12
	2-227	人工铺装刨平右,砂浆黏 给房	m <sub>3</sub>	3.502 08	95.76	172.70	0.00	17.43	8.62	0.00	294.51	1 031.40
100	15 040204004002	安朗平石: 30mm×30mm 、12mm C30 混蒸   平石: 2cmM7.5 水液砂浆物层	ш	1 167.36	4.14	14.38	0000	0.75	0.37	0.00	19.64	22 926.95

						64	<b>给合单价</b> 标				
:	or.		ŭ			110	9	19.5	E E	(prisation	8
230 <sub>H</sub>	池嶺十平石立砌	100m	100m 11.673 6 357 00 1 334.63	357 00	1 334.63	00.0	64.97	32.13	00.0	64.97 32.13 0.00 1.788.73	20 880.92
2 227	人工 <b>帕装侧</b> 半石,砂浆结 结层	, E	7,004 16	95.76	172.70	0.00	17.43	17.43 8.62 0.00	00.0	294.51	2 062 80
			4	70							1 578 654 55

表 10-18 施工技术措施项目清单与计价表

			A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	THE SECTION AND THE	-	201.00				
) (\$7.6	单位(专业)工程名称; 道路工程 市政	道路工程 市政		>	N				第1页 共1页	共1页
			T. W.	11.	12.	W# 74		1 1		1
ě	And the same of			平	K		The second	を正文	据书 D*	4
-	041102037001	其他現法构件模板	粉煤灰一渔棒层	m.	350.21	47.00	16 459.87	7 795.67	917.55	
2	041102037002	其他观洛构件模板	人行送混凝土基础。	m²	61.61	7-47.00	2 895.67	1371.44	161.42	
3	041106001001	大型机械设备过用场及安拆 1m <sup>3</sup> 報帶式挖掛机	Im <sup>3</sup> 報帶式控辦机	台·次	-	3 447.97	3 947.97	840.00	1 323.26	
4	041106001002	041106001002 大型机械设备进用场及安排。90kW 内履铅式推上机	90kW 内限带式推 1 机	\$ \$	-	2 925.06	2 925.06	420.00	1 323.26	
80	041106001003	大型机械设备进出场及安排 压路机	压路机	10. % %	2	3 184.19	6 368.38	700.00	2 646 52	
		4	<b>本</b>				32 596.95	11 (27,11	6 372.01	
		<□	12				32 596.95	32 596.95 11 127.11	6 372.01	



表 10-19 施工技术措施项目清单综合单价计算表

1						ı	2	生合单体师	1	4000		
	¥			1	1	4444	- Control of the Cont	P. P. P. V.	1425.4	旺	, Per y	A R
	041102037001	其他规语构件模板: 粉煤灰三渣 基层	m <sup>2</sup>	350.21	22.26	15.35	2.62	4 53	2.24	0.00	47.00	16 459.87
	2-197	水泥泥煤上路面,道路模板	100m²	3.502 1	2 226.00	1 535 01	262.01	452.82	223.92	0.00	4 699.76	16 459.03
7	041102037002	民他观淡构件模板: 人行道混凝 上基础	m <sup>2</sup>	19.19	22.26	15.35	2.62	4.53	2.24	0.00	47.00	2 895.67
	2-197	水泥泥膜上路面, 道路模板	100m²	0.6161	2 226.00	2 226.00 77535.01	262.01	452.82	223.92	0.00	4 699.76	2 895.52
62	041106001001	大型机械设备过出场及会拆; 1m, 规带式挖掘机	Œ.		840.00	1196.31	1 323 26	393.71	194 69	0.00	3 947 97	3 947.97
	3001	极带、"比控据机, 1m3 以内	针拼	-	840.00	119631	1 323.26	393.71	194.69	0.00	3 947.97	3 947.97
4	041106001002	大型机械设备进出场及安拆; 90kW 內限借式推土机	# #	.'-	420.00	707.64	1 323,26	317.27	156.89	0.00	2 925.06	2 925.06
	3003	规带式排 1 机, 90kW 以内	行班	-	420.00	707.64	1 323.26	317.27	156.89	0.00	2 925.06	2 925.06
~	041106061003	大學机械设备进出场及安訴; 压 路机	台 次	2	350.00	1 055 81	1 323 26	304.53	150.59	0.00	3 184.19	6 368.38
	3010	压路机	护马	2	350.00	1 055 81	1 323 26	304.53	150 59	0.00	3 184 19	6 368.38
1				<=	+:							32 596.95

### 表 10-20 施工组织措施项目清单与计价表

#### 单位(专业) [程名称: 道路 [程 市政

第1页 共1页

序号	<b>新日名前</b>	计算基数	蒉率/%	金额/元
1	安全文明施工费(含扬尘污染增加费)	人工费+机械费	11.54	30 533.84
2	其他组织措施费			5 450.59
2.1	冬雨季施工増加费	人工费+机械费	0	0.00
2.2	夜间施 工增加费	人工费+机械费	0.01	26.46
2.3	己完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.02	52.92
2.4	二次搬运费	人工费+机械费	0	0.00
2.5	行车、行人干扰费增加费	人工费+机械费	2,5	5 291.83
2.6	提前竣 Ľ增加费	人工费+机械费	, 10	0.00
2.7	工程定位复测费	人工费+机械费く	0.03	79.38
2.8	特殊地区施工増加费	人工费+机械费	0	0.00
		12		
	合 计	1/1/2		35 984.43

#### 表 10-21 其他项目清单与计价表汇总表

丁程夕称, 市政

第1回 井1回

Res Color Se	a have the same	. 2	VAL	74 , 77 , 71 , 71
序号	项目名称	计量单位	金额/元	备注
1	暂列金额	ni .	0.00	
2	暂估价	7	0.00	
2.1	专业工程暂估价。	1. 16	0.00	
3	计日工	プ元	0.00	
4	总承包服务费	亢	0.00	
	合 计		0.00	

注:本  $\Gamma$ 程无其他清单项目,其他项目清单包括的明细清单中金额均为零。本例不再放入相应的明细清单。

#### 表 10-22 主要工日价格表

单位(专业)工程名称; 道路工程-市政

第1页 共1页

序号	工 种	单位	数 量	单价/元
1	- 类人 L	LH	144.432	65
2	:类人 [	LH	1 927.090	70

#### 表 10-23 主要材料价格表

单位(专业)工程名称: 道路工程 市政

第1页 共1页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价/元	备注
1	0401031	水泥	42.5	kg	49 429.178	0.33	
2	0403043	黄砂(净砂)	综合	ε	253.149	62.5	
3	0407001	塘渣		ŧ	6 027.830	35	
4	0407071	厂拌粉煤灰 : 渣		m <sup>3</sup>	2 121.180	120	
5	0433071	细粒式沥青商品 混凝土		m <sup>3</sup>	193.532	713	
6	0433072	中粒式沥青商品 混凝土		m³	258.042	648	
7	0433073	粗粒式沥青商品 混凝土		· m³	451.574	568	
8	1155031	乳化沥青	, , ,	kg	14 286.356	4.5	
9	3305061	人行道板	250mm×250mm×50mm	m <sup>2</sup>	1 520.126	20	
10	3307001	混凝上平石	500mm×500mm×120mm	m	1 184.870	13	
11	j1201011	柴油(机械)	10.15	kg	8 172.200	6.35	
12	8021201	现浇现拌混凝土:	Č15(40)	m <sup>2</sup>	179.759	183.249 5	

#### # 40 24 + # th tot company #

単位(た小)「科タ林、海路「和 市内

第1页 其1页

毒性(A) ( 在 A)	/ } 1. 作 名 标: JEE静 1. 作 用项			第1页 共1页	
序号	<b>、 机械设备名</b> 称	单位	数量	单价/元	
1	其信机械费	ri.	689.817	1	
2	履带式推上机 75kW	台班	7.585	576.516 5	
3	履带式推土机 90kW	台班	2.708	705.633 5	
4	平地机 90kW	台班	13.800	459.544	
5	履带式单斗挖掘机(液压)Im3	台班	6.230	1 078.38	
6	内燃光轮压路机 8t	台班	30.730	268.336 5	
7	内燃光轮压路机 12t	台班	24.511	382.671 5	
8	内燃光轮压路机 15t	台班	55.892	478.822 5	
9	汽车式沥青喷酒机 4 000L	台班	1.916	620.473	
10	沥青混凝上推铺机 8t	台班	19.928	789.950 5	
11	汽车式起重机 5t	台班	4.453	330.21	
12	载货汽车4t	台班	0.659	282.438	
13	自卸汽车12t	台班	23.712	644.776 5	
14	平板拖车组 40t	台班	4.000	993.049 5	
15	机动翻斗车1t	台班	131.700	109.730 5	

续表

序号	机械设备名称	单位	数 量	单价/元
16	洒水汽车 4 000L	台班	4.327	383.056
17	双锥反转出料混凝土搅拌机 350L	台班	5.889	96.726 1
18	灰浆搅拌机 200L	台班	7.748	58.572 9
19	木工园锯机 ø 500	台班	19.479	25.386
20	木工平刨床 300mm	台班	19.479	12.774 4
21	混凝土振捣器平板式 BLL	台班	5.889	17.556

# ⑥ 思考题与习题

#### 一、简答题

- 1. 《计价规范》中, 道路工程主要列了哪些清单项目?
- 3. 人行道整形清单项目与定额子目的工程量计算规则相同吗?
- 4. 树池砌筑清单项目与定额子目的工程量计算规则相同吗?
- 5. 现浇侧(平)石清单项目与定额平目的工程量计算规则相同吗?
- 6. 道路基层设计截面为梯形时。如何计算清单项目工程量? 与定额的工程量计算规则 相同吗?
  - 7. 如何区分诱层油与粘层油?
  - 8. 道路面层清单项目工程量计算时、需注意哪些事项?
  - 9. "水泥混凝土面层"清单项目通常包含哪些组合工作内容?
- 10. 水泥混凝土面层的钢筋是否包含在"水泥混凝土面层"清单项目中? 编制工程量 清单时, 如何处理钢筋?
- 11. 水泥混凝土面层施工时的模板是否包含在"水泥混凝土面层"清单项目中? 編制 工程量清单时,如何处理其模板?
  - 12. 新建的水泥混凝土面层工程通常包括哪些分部分项清单项目?
  - 13. 新建的沥青混凝土面层工程通常包括哪些分部分项清单项目?

#### 二、计算题

某道路工程车行道结构如图 10.5 所示,已知车行道宽 16m,道路长 600m,试确定该 道路车行道工程清单项目及项目编码、计算各清单项目工程量、并计算各清单项目的组合 工作内容定额工程量。

#### 市政工程计量与计价(第三版)



# 第 1 章 排水管网工程清单 计量与计价


#### 本章学习要点

- 1. 排水管网工程清单项目的工程量计算规则、计算方法。
- 2. 排水管网工程招标工程量清单编制步骤、方法、要求。
- 3. 排水管网工程清单计价(投标报价)的步骤、方法、要求。





某管道平面图如下图所示,已知Y1、Y2、Y3、Y5为1100mm×1100mm 溜槽井(非落底井),Y4为1100mm×1100mm 落底井。该管道工程的检查井清单工程量、定額工程量相管吗?有什么不同?

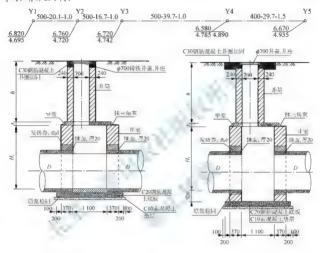

管道平面图

# 11.1 排水管网工程清单项目

#### 11.1.1 排水管网工程分部分项清单项目

《市政工程 L程量计算规范》(GB 50587—2013)附录 E 管网工程中,设置了 4 个小节 51 个清单项目,4 个小节分别为:管道铺设、管件阀门及附件安装、支架制作及安装、管道附属构筑物。管网工程包括了市政排水、给水、燃气、供热等管网工程,本章主要介绍市政排水管网工程相关内容。

#### 1. 管道铺设

本节根据管(樂)道材料、铺设方式的不同,设置了20 个清单项目,混凝土管铺设、钢管铺设、铸铁管铺设、塑料管铺设、砌筑方沟、混凝土方沟、砌筑渠道、混凝土渠道、水平导向钻进、夯管、项管、项(夯)管 工作坑、预制混凝土工作坑、隧道(沟、管)内管道铺设、 宣埋式预制保温管铺设、管道架空跨越、临时放水管线、新旧管连接、土壤加固、警示(示路)带铺设。

其中铸铁管铺设、直埋式预制保温管铺设、管道架空跨越、临时放水管线等清单项目 主要存在于给水、燃气、供热等管网工程。



管道铺设项目的做法如为标准设计,可在项目特征中标注标准图集号及页码。

管道舗设项目特征中的检验及实验要求应根据专业的施工验收规范及设计要求, 对已 穿管道工程进行的严密性诚验。闭水诚验、吹扫、冲洗消毒、硬度诚验等内容进行描述

#### 2. 管件、阀门及附件安装

本节主要是给水工程、燃气、供热管网工程的清单项目。

#### 3. 支架制作及安装

本节主要是给水工程、燃气、供热管网工程的清单项目。

#### 4. 管道附属构筑物

本节共设置了9个清单项目;砌筑井、混凝土井、塑料检查井、砖砌井筒、预制混凝 土井筒、砌体出水口、混凝土出水口、雨水口、整体化粪池。

# 特别提示

管道附属构筑物为标准定型构筑物时,在项目特征中应标注标准图集编号及页码。

#### 5. 其他

除上述分部分项清单项目以外,排水管网 L程通常还包括《市政 L程 L程量计算规范》 (GB 50587—2013)附录 A 土石方 L程、J 钢筋 L程中的有关分部分项清单项目。如果是改建排水管网 L程,还包括附录 K 拆除 L程中的有关分部分项清单项目。

排水管网 L程的 上石方 L程清单项目 上要有: 挖沟槽 上方、挖沟槽石方、回填方、余方弃置。

排水管网 L程的钢筋 L程清单项目 上要有:现浇构件钢筋、预制构件钢筋、预埋铁件。 改建排水管网 L程的拆除 L程清单项目 上要有:拆除管道、拆除砖石结构、拆除混凝 十结构、拆除出。

各清单项目的项目名称、项目编码、项目特征、计量单位、 L程内容、 L程量计算规则、 可组合的主要内容可参见本 其附录。

#### 11.1.2 排水管网工程分部分项清单项目工程量计算规则

本章主要介绍市政排水管网工程常见的分部分项清单项目的工程量计算规则。



#### 1. 管道铺设

常见的清单项目包括:混凝土管道铺设、塑料管道铺设、水平导向钻进、顶管、顶管 工作坑、砌筑渠道、混凝土渠道等。

(1) 洞凝上管道铺设、塑料管道铺设、按设计图示中线长度以延长米计算, 不扣除井、 阀门所占长度, 计量单位为 m。



管道铺设清单工程量=设计图示井中至井中的距离

(11-1)(11-2)

渠道铺设清单工程量=设计图示渠道长度

在计算管道铺设清单工程量时、要根据具体工程的施工图样、结合管道铺设清单项目 的项目特征, 划分不同的清单项目, 分别计算其工程量,

- 如"混凝土管铺设"清单项目的特征有7点、雲结合工程实际加以区别。
- ① 垫层、基础材质及厚度:
- ② 管座材质:
- ③ 规格、即管内径:
- ④ 接口形式: 区分平(企)接口、承插接口、套环接口等形式;
- ⑤ 铺设深度:
- ⑥ 混凝土强度等级:
- ⑦ 管道检验及试验要求: 是否要求做管道严密性试验。

如果上述7个项目特征有1个不同,就应是1个不同的具体的清单项目,其管道铺设 的工程量应分别计算。

【例 11-1】 某段雨水管道平面图如图 11.1 所示、管道均采用钢筋混凝土管、承插式橡 胶圈接口,基础均采用钢筋混凝土条形基础,管道基础结构如图 11.2 所示。试计算该段雨 水管道清单项目名称、项目编码及其工程量。



图 11.1 某段雨水管道平面图



图 11.2 管道基础结构图

【解】由管道平面图可知,该段管道有两种规格: D400 管道、D500 管道、所以有两个管道铺设的清单项目、工程量分开计算。

(1) 项目名称: D400 混凝土管道铺设(橡胶圈接口、C20 钢筋混凝上条形基础、C10 素 混凝土垫层)

项目编码: 040501001001

清单工程量=29.7m

(2) 项目名称: D500 混凝上管道铺设(橡胶圈接口、C20 钢筋混凝上条形基础、C10 素 混審+ 垫层)

项目编码: 040501001002

清单工程量=20 1+16 7+39 7=76 5(m)

# 特别提示



(1)管道舗设清单项目包括:垫层、管道基础(平基、管座)混凝土浇筑、管道舗设、管道接口、井壁(墙)凿洞、混凝土管截断、闭水试验等内容。

【例 11-1】中, D400 混凝土管道铺设清单项目包括: C10 素混凝土垫层、C20 钢筋混凝土平基、D400 管道铺设、C20 混凝土管座、橡胶围掉口、管道闭水试验。

- (2)管道铺设清单项目不包括管道基础铜筋的制作安装、铜筋制作安装按附录】铜筋工程另列清单项目计算。管道基础混凝土浇筑时模板的安拆可列入施工技术措施项目计算、也可作为管道铺设清单项目的组合工作内容。
- (2) 水平导向钻进:按设计图示长度以延长米计算,扣除附属构筑物(检查井)所占长度, 计量单位为 m。
- (3) 项管: 按设计图示长度以延长米计算, 扣除附属构筑物(检查井)所占长度, 计量单位为 m。
  - (4) 顶管工作坑: 按设计图示数量计算, 计量单位为座。
- (5) 砌筑渠道、混凝土渠道;按放水管线长度以延长米计算,不扣除管件、阀门所占长序。

#### 2. 管道附属构筑物

常见的清单项目包括:砌筑井、混凝上井、塑料检查井、雨水口、砌体出水口、混凝上出水口。

1) 工程量计算规则

按设计图示以数量计算, 计量单位为座。

管道附属构筑物工程量 附属构筑物的数量 (11-

【例 11-2】 某段雨水管道平面图如图 11.1 所示,已知 Y1、Y2、Y3、Y4、Y5 均为 1100mm×1100mm 砖砌检查井,其中落底井落底为 50cm,试计算该段管道检查井清单项 目名称、项目编码及清单工程量。

【解】由管道平面图可知: Y1、Y2、Y3、Y5 均为雨水流槽井、Y4 为雨水落底井。

另外,根据平面图所示标高计算各井的井深如下。

# 市政工程计量与计价(第三版)

Y1 井井深=2.125m

Y2 井井深=2.040m

Y3 井井深=1.978m

Y5 # #深=1.735m

Y1、Y2、Y3、Y5 平均井深=1.97m

Y4 井井深=2.4m

该段雨水管道检查井根据井的结构、尺寸、井深等项目特征、可设置两个具体的清单项目。

(1) 项目名称: 1100mm×1100mm 砖砌雨水检查井(不落底井、平均井深 1.97m)。

项目编码: 040504001001

清单工程量=4座

(2) 项目名称: 1100mm×1100mm 砖砌雨水检查井(不落底井、井深 2.4m)。

项目编码: 040504001002

清单工程量=1座



在计算工程量时,要根据具体工程的施工图料,结合检查井清单项目的项目特征,划 分不同的具体清单项目,分别计算其工程量,

- (1)检查井、雨水口清单项目一般包括以下组合工作内容:并垫层铺筑、井底板混凝土浇筑、井身砌筑、井身勾缝、抹灰、井内爬梯制作安装、盖板制作安装、过梁制作安装、井閣制作安装、井嵩(箅)座制作安装。
- (2)检查井、雨水口清单项目不包括井底板、盖板、过梁、井围等钢筋混凝土结构中钢筋的制作安装、钢筋制作安装按附录】钢筋工程另列清单项目计算。
- (3)检查井、雨水口的井底板、盖板、过梁、井園等钢筋混凝土洗鏡时,模板的安拆可列入施工技术措施项目计算。也可作为检查井、雨水口清单项目的组合工作内容。
- (4) 检查井、雨水口清单项目不包括井深大于 1.5m 砌筑时所需的井字架工程、不包括砌筑高度超过 1.2m 及抹灰高度超过 1.5m 所需脚手架工程、井字架、脚手架均列入施工技术措施项目计算。

# 11.2 排水管道工程招标工程量清单编制实例

【例 11-3】 某市中华路排水管道 L程,于 2016 年 3 月 1 日—3 月 5 日进行 L程招投标 活动。雨水管道实施的起讫井号为 W1~W4, 均不包括沿线的支管及支管井、不包括雨水口及连接管。管径 D < 400mm 采用承插式 UPVC 管、砂基础; 管径 D > 500mm 采用承插式钢筋混凝土管、钢筋混凝土条形基础。雨污水均采用砖砌矩形或方形检查井。管道平面图、纵断面图、结构图如图 6.7~图 6.22 所示。

已知本工程沿线土质为砂性土,地下水位于地表以下1.3~1.5m。

根据工程图纸,编制该道路工程的招标工程量清单。

【解】1. 根据施工图纸、根据《市政工程工程量计算规范》(GB 50857—2013)、参考 《浙江省建设工程工程量清单计价指引》(市政工程)、确定分部分项清单项目的项目名称、 项目特征、项目编码,并计算其清单工程量,见表 11-1。

该排水管道工程的基础数据的计算同【例 6-14】。

表 11-1 分部分项清单项目及其工程量计算表

序	1 项目编码	分部分项 清单项目名称	项目特征	计量	计算公式	工程》
Ī	040101002001	挖沟槽上方	一、二类土, 4m 以内	$m^3$	1-1-1-465 1 1A-4#	1 143.60
2	040103001001	回填方	一、二类土,场内平衡	Nen3)	同定额计价模 式的 L 程量	862.30
3	040103002001	余方弃置	运距由投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	2 dhù trit air	151.96
4	040501001001	混凝土管道铺设	D500, 10cm 厚 C10 素混凝土基层, C20 钢筋混凝土条形基础, 承插式橡 胶糊接口, 闭水试验, 含混凝土模板	m	45+45	90
5	040501004001	塑料管道铺设	DN400, 砂基础。承插式橡胶圈接口, 闭水试验	m	27+30+30	87
6	040504001001	7	1100mm×1100mm 砖砌污水流價井。 平均井深 3.098m,10cm 厚 C10 素混 菱上 地层 20cm 厚 C20 镇筑混凝上成 板、M10 水泥砂浆砌 MU10 机砖 1 2 火泥砂浆抹麻。 C20 網筋混凝土井室 盖板、C30 實際虛凝上井圖, 6700 镑 铁井盖、座、管混凝上模板		4	4
7	040504001002	砌筑井	1 100mm×1 100mm 硅砌雨水溶底井, 井深 2.991m,10cm 厚 C10 索混凝土	随	1	1
8	040504001003	砌筑井	1100mm×1250mm 硅砌雨水落底井, 井深 3.201m, 10cm 厚 C10 套混凝土	,	1	1

续表

序号	ocal optica	分部分项 清单项目名称	Assertab	<b>计量</b> 单位	www.	
9	040504001004	砌筑井	1 100mm×1 100mm 砖砌流槽井, 井深 2.521m, 10cm 厚 C10 底混凝土地层, 20cm 厚 C20 锅筋混凝土底板, M10 水泥砂浆砌 MU10 机砂, 1:2 水泥砂 浆抹面, C20 锅筋混凝土井室盖板, C30 锅筋混凝土井圆, 4700 铸铁井盖、 座, 含混凝土模板	座	1	1
10	040901001001	现浇构件钢筋	圆钢	1	765.091/1 000	0.765
11	040901001001	现浇构件钢筋	螺纹钢	12	380.759/1 000	0.381
12	040901002001	预制构件钢筋	圆钢 人	t	36.166/1 000	0.036
13	040901002001	预制构件钢筋	圆铜 / 大一	t	163.682/100	0.164

2. 根据工程图纸、结合相关的施工技术规范要求及常规的施工方法、确定施工技术措施清单项目的项目名称、项目特征、项目编码、并计算其清单工程量,见表 11-2。

表 11-2 施工技术措施清单项目及其工程量计算表

序号	项目编码	技术措施之		建位	- WARREN	
I	041107002001	排水、浴水	轻型井点降水	特夜	7+10	17
2	041101005001	井字架	4m 以内 ·	座	4+3	7
3	041106001001	友型机械设备进 出场及安拆	lm³履带式挖掘机	台・次	1	ì

3. 根据工程实际情况,确定施工组织措施清单项目的项目名称、项目编码,见表 11-3。

表 11-3 施工组织措施清单项目及其工程量计算表

序号	项目编码	组织措施清单项目名称
1	041109001001	安全文明施工费
2	041109002001	夜间施工增加费
3	Z041109009001	工程定位复测费
4	041109005001	行车、行人干扰增加费
5	041109007001	己完工程及设备保护费
6	041109004001	冬雨季施工增加费

#### 4、编制本工程的招标工程量清单、见表 11-4~表 11-9。

#### 表 11-4 招标工程量清单封面

	<b>米</b> 印	中华路排水官坦工程		
	I	程量清单		
		工程造价		
招标人:		咨 询 人:		_
	(单位盖章)		(单位资质专用章)	
法定代表人		法定代表人		
或其授权人:		或其授权人:	1	
	(签字或盖章)	0.7	(签字或盖章)	
编制人:		复核人:		
		930		_
	(造价人员签字盖专用章)		(造价工程师签字盖专用章)	
编制时间:	11.	复核时间:		
	111			
	表 11-5 招	松丁程量清单总说明		

工程名称:某市中华路排水管道工程

第1页 共1页

#### 一、L程概况及实施范围

某市中华路排水管道工程雨水管道实施的起论并写为 Y1~Y3. 污水管道实施的起论并号为 W1~W4, 均不包括消线的支管及支管井、不包括雨水口及连接管。管径 D≤400mm 采用承插式 UPVC 管、砂基础。管径 D≥500mm 采用承插式钢筋混凝土管、钢筋混凝土条形基础,雨污水均采用砖砌矩形或方形检查井。工程消线上插为砂性土、地下水位于地表以下 1.3~1.5m。

- 1、工程量清单编制依据
  - 1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)。
  - 2. 《浙江省建设 [程 [程量清单计价指引》(市政 [程)。
  - 3. 《市政 L程 L程量计算规范》(GB 50857-2013)。
  - 4. 市政给水排水管道 L程施 L相关规范。
  - 5. 某市中华路排水管道工程施工图。
- 一、编制说明

多余的上方外运、运距由投标人自行考虑; 场内平衡的上方运输方式由投标人自行考虑。

#### 四、其他

- 1. 本工程风险费用暂不考虑,农民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险费暂不考虑,本工程无仓标化工程要求,本工程不得分包,本工程无管列金额、计日工。
- 2. 安全文明施 L费按市区 ·般 L程考虑。



表 11-6 分部分项工程量清单与计价表

共2页 第一页 1 143 60 862 30 151.96 87.00 90.00 ¥ Ë Ε 8 Ē Ē 垂 美 础, 承插式橡胶圈接口, 因水试验, 会港港 疑: 并室盘极, C30 納筋混凝| 序圖, \$700 淡土 上井室盖板, C30 钢筋混凝土井圖, ♦700 铸 D500, C10 混凝上倍层, C20 網筋混凝土基 **井** 57 井 深 3.098m, C10 表混凝 L垫层, C20 钢筋混 转制流槽, 1:2 水泥砂浆抹面, C20 钢筋混 2.521m, C10 表混凝 | 朴层, C20 树筋混凝 七成版, MIO 水泥砂浆圆道 MUIO 机底, 板 1:2 水泥砂浆抹面, C20 钢筋混凝 M10 水泥砂浆砌筑 MC10 机码. 砂塘础。承插式橡胶圈接口, 1100mm×1100mm 妈妈肉水流槽井, 1100mm×1100mm 乾燥污水溶劑井。 二米十、地内半窓しく 含混凝土模板 **含混凝上模板** 运距由投标人自行确定 本页小引 , 二九1, 4m以内 场铁井盖、座, 世 湿,成板. 铁炸盖、厂 的溶槽, DN400. 十極极 投沟票一方 单位(专业)工程名称; 排水工程-上政 温淡上管 众方兵翼 製料管 研筑井 過筑井 040103001001 同北方 040504001001 040504001004 040101002001 040103002001 040501001001 040501004001 ~ 2 9 -

川政	
LMI-	
排水	
如称:	
工程為	
专业)	
N	

100mm×1   100mm×1	1							
1100mm×1100mm 時期格務底井, 井   120mm×1100mm 時期 格   120mm×1100mm 時期	d'u		面目各称	The state of the s	□ ++		<b>社会当你</b> /元	中/元 机械费
1100mm×1250mm 等別商水系統。	oc	040504001002	每次井	1100mm*1100mm 好别别水落底并深 2291m、C10 素饲料 45元、C3 6600基 46元、C3 6600基 66元,C3 6600基 66元,C3 6600元,C3 6600元,C3 660元,C3 660元,C3 660元,在3		-		
040901001001 現淡粒件網絡 図線         図線         日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本	6	040504001003	研究儿	1100mm×1250mm 转到两水落块等 将 3.20m。C10 家冠旗上站后、C 防泥板上成板、N10 水湿砂浆结构。C20 岭 长岭,11.2 水焰砂浆结构。C20 岭 梯上 F12盘板。C30 峨岭流梯上 岭 700 惨跃上后。 将,有地路上绕板	ALUTO N. B.	<del>-</del>		
040901001002 現港時件網務 螺旋網 11 040901002002 原制档件網務 螺旋網 12 10 040901002002 医制档件網務 螺旋網 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	01		观洗构件铺筋	[33 (b)	-	0.765		
040901002002         原制构件網筋         原稿         t         t           040901002002         原制构件網筋         螺纹钢         t         t	=	040901001002		螺纹钢	4	0.381		
0409611002002 预制构件钢筋 螺纹钢 本页小引	13	040901002001		的特別	1	0.036		
本典小司	22	_	_	螺纹钢	1	0.164		
				本页小司				
				40			1	

#### 表 11-7 施工技术措施项目清单与计价表

#### 单位(专业)工程名称: 排水 工程-市政

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量	丁程	<b>総合単</b>			<b>Þ/元</b>	鲁江
ㅋ			-	里位	帮	が/元	抗	人上板	机械器	14
1	041107002001	排水、降水	轻型井点降水	量夜	17					
2	041101005001	井字架	4m 以内	座	7					
3	041106001001	大型机械设备 进出场及安拆	lm³ 履带式挖 掘机	台・次	1					
		4	5页小计							
			合计			1				

#### 表 11-8 施工组织措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称; 道路工程-市政

第1页 共1页

A . A . A			金额/元
安全文明施工费	人工费+机械费		
冬雨季施工增加费	,人工费+机械费		
夜间施工增加费	工费+机械费		
已完工程及设备保护费	人工费+机械费		
:次搬运费	人工费+机械费	1	
行车、行人干扰增加费	人工费+机械费	1	
提前竣工增加费 、 _	人工资+机械费		
工程定位复测费	<b>★工费</b> ◆机械费		
特殊地区施工增加费	<sup>3</sup> 人工费+机械费		
其他施工组织措施费	按相关规定计算		
	夜间施工增加费 已完工程及设备保护费 : 次搬运费 行车、行人干扰增加费 提前竣工增加费 一工程定位复制费 特殊地区施工增加费	夜间施工增加费	夜间施工增加费

#### 表 11-9 其他项目清单汇总表

L程名称: 市政

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	金额/元	备注
I	暂列金额	儿	0.00	
2	暂估价	亢	0.00	
2.1	材料暂估价	元	0.00	
2.2	专业工程暂估价	尤	0.00	
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			

注:本工程无其他清单项目,其他项目清单包括的明细清单均为空白表格。本例不再放入空白的明细 清单的表格。

# 11.3 排水管道工程清单计价(投标报价)实例

【例 11-4】 某市中华路排水管道工程,于 2016年3月1日—3月5日进行工程招投标活动。 雨水管道实施的起讫井号为 Y1~Y3, 污水管道实施的起讫井号为 W1~W4, 均不包括沿线的支管及支管井、不包括雨水口及连接管。管径 D < 400mm 采用承插式 UPVC 管、砂基础、管径 D > 500mm 采用承插式钢筋混凝土管、钢筋混凝土条形基础。 雨污水均采用砖砌矩形或方形检查井。管道平面图、纵断面图、结构图如图 6.7~图 6.22 所示。

已知本工程沿线土质为砂性土,地下水位于地表以下 1.3~1.5m。

根据工程图纸和招标工程量清单,试按清单计价模式采用综合单价法编制该道路工程的控标报价。

本工程风险费用暂不考虑,农民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险费暂不考虑, 本工程不创标化工程要求,本工程不得分包,本工程无额列金额、计日工。

本例题中排水管道工程的施工方案、与定额计价模式下编制投标报价相同、具体可见 【例 6-14】

- 【解】1. 根据招标工程量清单中的分部分项工程量清单、工程图纸、结合施工方案、参考《浙江省建设工程工程量清单计价指引》(市政工程),确定分部分项清单项目的组合工作内容,计算各组合工作内容的定额工程量,并确定其套用的定额子目,见表11-10。
- 2. 根据紹标工程量清单中的施工技术措施项目清单、工程图纸、结合施工方案、参考 《浙江省建设工程工程量清单计价指引》(市政工程)、确定技术措施清单项目的组合工作内 容,计算各组合工作内容的定额工程量、并确定其套用的定额子目、见表 11-11。
  - 3. 确定人、材、机单价, 判定工程类别、确定各项费率。
- (1) DN400UPVC 管道橡胶圈单价为 20 元/只,圆铜单价为 3 400 元/t, 螺纹铜单价为 3 300 元/t, DN400 UPVC 管道单价为 95 元/m, D500 铜蘅混凝土管道单价为 150 元/m, 砖块单价为 400 元/千块; 一类人工工日单价为 65 元, 二类人工工日单价为 70 元; 其他人、材、机单价按《浙江省市政工程预算定额》(2010 版)计取。
  - (2) 本管道工程为三类排水工程。
- (3)企业管理费、利润、各项组织措施费的费率按《浙江省建设工程施工费用定额》(2010版)及浙江省有关规定的费率范围的低值计取;规费、税金按《浙江省建设工程施工费用定额》(2010版)的规定计取。
  - 4. 计算清单计价模式下,本道路工程的工程造价,详见表 11-12~表 11-24。



表 11-10 分部分项清单项目的组合工作内容工程量计算表

世			会社 会社	分割分项清单项目所包含的组合工作内容		
			通信工作内容名款	组合工作内容定额工程量计算式	工程量	定额子目
			校備机た1 升液1(二一类1)	1 051.31 899.36	151.96m³	1 59
	挖沟槽上方( · :类上: 4m	140000	挖掘机控1不淡在(一、三类上)	862.30×1.15 92.29	899.36m³	1 56
	(MX)	145.00m	人1 控為槽土力 (一二类土、4m以内、辅助消耗)	92.29	92.29	1-5 <sub>H</sub>
	回班方(一、一,卷下,场内平衡)	151,96m³	槽坑坑上夯实	F v-F n E F n-92,29-1 051.31 281.30 -862.30	151.96m³	1 87
	余方弁翼(运距由投体人自 行考虑)	862,30m³	自即作远上次(这型 5km)	2 900 1 200 1.15	151.96m³	1-68+
			C10 赤混湖 + 墊层	47.1-4.7.4	9,48m <sup>1</sup>	6 268
			C20 混凝   平基	6.74+6.74	13.48m³	6 276 <sub>H</sub>
			D500 混凝土苦运铺改(人 E)	45-1.1-45-1.1	87 8m³	6-27
	STANCE AND THE PROPERTY.	4	19500 資承插式橡胶閱接口	14+14	28 个口	6 1 1 9
	(EME 1. E. LE WE (A) (A) (U)	mox.	13500 管道图水试验	45+45	90m	6 212
			成法告追混凝土垫层模板	0.1×(45 1.1)>2×2	17.56m²	6 1044
			现况管道半块模板	0.08×(45 1.1)×2×2	14.05m²	6 1094
			現法管道管座模板	0.208×(45-1.1)×2×2	36.52m <sup>2</sup>	6-1096
			砂垫层	4.95+5.53+5.53	16.01m <sup>3</sup>	6 266
			沟槽区域砂	40.79+45.51+45.51	131.81m³	6-286
5	塑料管道铺设(DA400)	87m	DN400 UPVC 管道舗设	27 1.1+30 1.1+30 1.1	83.7m	6 46
			DN400UPVC 管條股圖接口	4+4+4	12 个口	6-194
			DN400 管道闭水试验	27+30+30	87m	6-211

1						× 60
业	15 DATE	The second second		分帮分场清单项目所包含的组合工作内容		
	1. 大公工中公工中台		组合工作内容名称	组合工作内容定额工程量计算式	工程	定额于目
			C10 井桂尼	(2.04:2-0.1) (2.04:2>0.1)>0.154	2.01m³	6 229н
			C20 井成物/	2.04×2.04×0.2×4	3.33m³	6 27611
			井空砌筑(地形、Akto 砂浆)	2.18×1.845×4+0.35×4	17.49m³	6-231 <sub>H</sub>
			井筒砌筑(网形、M10 妙浆)	0.71 -0.843 -4	2.39m³	6 230,1
			井野抹灰	(11.76 - 1.845+5.91 - 0.843) < 4	106.72m <sup>2</sup>	6 237
			流槽抹灰 , , , ,	2.14.4	8.56m²	6 239
	刻		C20 井室盖板 原制	0.197-4	0.79m³	6 337
9	转倒的水流植井, 平均井深	愛す	C20 井室温板安装	0.197-4	0.79m³	6 348
	3.098m)		C30 井國 預制	< 0.182×4	0.73m³	6 249 <sub>H</sub>
			C30 井岡安徽、大	0.182×4	0.73m³	6 353
			●700 铸铁井盖、粤安集	4	4 13	6 252
			現沈井梅居機板	2.24 0 1 4 4	3.58m²	6-1044
			<b>电流并压板板板</b>	2.04-0.2-4-4	6.53m²	6 1094
			強制井安益板模板	0.179×4	0.79m³	6 1111
			随制月灣模板	0.182.4	0.73m²	6 1121
			CIO井桂居	(2.04:2-0.1)-(2.04:2-0.1)-0.1	0.50m²	6-229 <sub>H</sub>
			C20 井底板	2.04×2.04×0.2	0.83m³	6-276 <sub>11</sub>
	成筑井(1100mm×1100mm		井室砌筑(灯形、M10 砂浆)	2.18^2.3	5 01m <sup>3</sup>	6 231 <sub>H</sub>
7	砖砌雨水落底井, 井深	쾊	并简明筑[6]形、M10 砂浆]	0.71×0.281	0.20m <sup>3</sup>	6 230 <sub>f1</sub>
	2 991m)		并帖林灰	11,76×2,3+5,91×0,281	28.71m²	6 237
			C20 井室盖板预制	0.197~1	0.20m <sup>3</sup>	6 337
			C20 井室温板安装	0.197×1	0.20m³	6-348
l						

外外

		7 日本	李额今回20年后日春日,西西州一条日光		
長さ					
e commente de la commenta del commenta de la commenta del commenta de la commenta del commenta de la commenta del commenta de la commenta del commenta del commenta de la commenta de la commenta del commenta del commenta de la commenta de la commenta del commenta dela commenta del commenta del commenta del commenta del commenta de		组合工作内容名称	報告工作网络定额工程量计算式	工程	定順子目
		C30 井園預詢。	0.182×1	0.18m³	6-249 <sub>H</sub>
		(30 月間交換	0.182×1	0.18m³	6 353
<b>坳</b> 筑 井(1 100mm×1 100mm		◆700 铸铁片条、摩安装	1		6 252
我创商水落舷井, 井深	·왕 -	现浇井华层模板	2.24×0.1×4	0.90m²	6-1044
2.991m)		现洛井底板铁板	2.04 - 0.2 × 4	1.63m²	6 1094
		预制井室盖板模板	0.197	0.20m³	6 1111
		仮判井階模板	0.182	0.18m³	6-1121
		C10 非垫层	(2.04+2 < 0.1) < (2.19+2 < 0.1) < 0.1	0.54m³	6 229 <sub>H</sub>
		C20 井底板	2.04-2.19×0.2	0.89m³	6 276 <sub>H</sub>
		井军砌筑(产形、M10 砂浆)	229-23 n0.932 ×0.37	5.02m <sup>3</sup>	6 231,1
		并简创筑(圆形、M10 妙浆)	0.71-6.491	0.35m³	6 230 <sub>H</sub>
		井壁林疾 "太太"	12.36×2/3+5,91×0,491	31.33m²	6-237
福 第 計 (1 f00mm・1 250mm		C20 非变蓝板 向制	0.224×1 /°/>	0.22m <sup>3</sup>	6 337
8 故闽西水浴版片,	造	C20 井宣孟板安装	0.224×1 ( 🔨 🔾 🚶	0.22m <sup>3</sup>	6 348
		C30 井陸紋制	0.182×1	0.18m³	6 249 <sub>H</sub>
		(74) 井閣安装	0.182×1	0.18m <sup>3</sup>	6 353
		♦700 铬铁井盖、座安装	1	-	6 252
		现济井华层模板	2.24×0.1×2+2.39×0.1×2	0.93m²	6 1044
		现洗片底板模板	2.04×0.2×2+2.19×0.2×2	1.69m²	6-1094
		預制井室盖板模板	0.22	0.22m³	6-1111
		预制非關模板	0.182	0.18m³	6 1121

						12.21
业				<b>分割分质增速即包除毛含的相合工机构类</b>		
βļr			组会工作内容名称	METHERS SMITHER	= 11	定數子目
			C10 非特层	(2.04+2 -0.1) - (2.04+2 -0.1) - 0.1	0.50m°	6-229 <sub>H</sub>
			C20 井底板	2.04-2.04-0.2	0.83m³	6 276 <sub>H</sub>
			并穿刷筑(矩形、MIO 砂浆)	2.18<1.875+0.35	4.44m³	6 231 <sub>II</sub>
			并简调氧(闪形、M10 妙浆)	0.71×0.236	0 17m3	6-230н
			<b>炸蜂林</b> 较	11.76-1.875-5.91×0.236	23,44m³	6 237
			流槽林灰	2.14-1	2.14m <sup>2</sup>	6 239
	战策井(1100mm×1100mm		C20 外空高板横响	0.197<1	0.20m <sup>1</sup>	6 337
6	房间后水流槽井, 井深	<b>是</b>	C20 井宅高板安装	1-2610	0.20m	6 348
	2.52lm)		C30 井岡頂 海	0.18241	0 I8m <sup>3</sup>	6 249 <sub>H</sub>
			C30 排圖安装	0.182<4	0.18m³	6 353
			♦700 铬铁井备、座安装		44	6-252
			現淺井垫层模板 工工	2.24×0.1×#71	0.90m²	6 1044
			现法并底板模板	2.04×0.2×4	1.63m <sup>2</sup>	6-1094
			预期井室高板模板	0197	0.20m³	6-1111
			<b>负部,并囤模板</b>	0 182	0.18m³	6 1121
10	现法构件钢筋(圆钢)	0.7651	规范构作钢筋, 圆钢(淀凝土条形基础)	0.006 17×10²×(5+4)×(45-1.1)×2+0.006 17 ×8²-8.005×(45 1.1)×2	0.765	6 1124
Ξ	现活构件钢筋(螺纹钢)	0.381t	现流构件钢筋, 螺纹钢(非底板)	53.754×6+58 233×1	0.381	6-1125
12	预制构件钢筋(划钢)	0.0361	预制构件钢筋,圆钢(基圈)	0.006 17×6²×(5.38+7.64+3 44)×7+0.006 17 ×4²×15.30×7	0.036	6 1126
13	顶侧构件钢筋(螺纹钢)	0.164t	顶制构件钢筋,螺纹钢(井室盖板)	23.232 - 6+24.290 - 1	0.164	6 1127

#### 表 11-11 施工技术措施清单项目的组合工作内容工程量计算表

	.,		3-3C1-3E3C311-1-3CE113C		-	
			技术措施	清单项目所包含的组合工	作内容	-
序号	技术措施清量			组合 I 作内容定额 I 程量计算式	300	<b>二川</b> ヶ目
			轻型井点井点管安装	(27+30+30+20) ÷ 1.2+ (45+45+20) ÷ 1.2	183 根	1 323
1	排水、降水(轻型 井点降水)	17 昼夜	轻型井点井点管拆除	(27+30+30+20) : 1.2+ (45+45+20) ÷ 1.2	183 根	1-324
			井点使用	2×7+2×10	34 套 * 天	1 325
2	井字架(4m 以内)	7座	钢管井字架(4m 以内)	根据施工方案确定	7	6 1138
3	大型机械设备进 出场及安拆(Im <sup>3</sup> 履带式挖掘机)	1台•次	Im <sup>3</sup> 挖掘机进出场	根据施工方案确定	1	3001

#### 表 11-12 投标报价封面

#### 投标总价

招标人:	7.:	
E. 程 名 称:	某市中华路排水管道工程	
投标总价(小写):	183,595,00 70	
(大写):	查拾捌万叁仟伍佰玖拾伍元整	
投标 人;		
	(単位盖章)	
法定代表人		
或 其 授 权 人:		
	(签字或盖章)	
编 制 人:		
	(造价人员签字盖专用章)	

编制时间:

#### 表 11-13 总说明

#### L程名称; 某市中华路排水管道 L程

第1面 井1面

#### 工程概况

- :、施工方案
- 1. 本工程上质为砂性上,地下水位高于沟槽底标高,考虑采用轻型井点降水,在雨水、污水管道沟槽、侧设置单排井点,井点管间距为 1.2m, 井点管布设长度超出沟槽两端各 10m。
- 2. 沟槽挖方采用挖掘机在槽边作业、放坡开挖,边坡根据上所情况确定为1:0.5; 距离槽底30cm 的上方用人 [辅助清底。W1~W4 三段普道一起开挖、Y1~Y3 两端管道一起开挖,先施工污水管道, 再施「每水管道。
  - 3. 沟槽所控土方就近用于沟槽回填, 多余的土方直接装车用自卸车外运、运距为 5km。
    - 4. 管道均采用人厂下管。
    - 5. 湿凝土、砂浆均采用现场排制。
- 倒筋混凝上条形基础、井底板混凝上施工时采用钢模,其他部位混凝土施工时采用木模或复合木模。
- 7. 检查并施工时均搭设钢管井字架。检查井砌筑、抹灰时不考虑脚手架。
  - 8. 配备 lm³ 履带式挖掘机 l 台。
- 三、人、材、机单价的取定

DA400 UPVC 管道橡胶圏 管所为 20 元/只、 関網单价为 3 400 元/元、 螺紋網单价为 3 300 元/、 DA400 UPVC 管道单价为 95 元m、 D500 储衡温線上管道单价为 150 元m、 砂块单价为 400 元 千块、 一类人 エエ日单价为 65 元、 二类人 エエ日单价为 70 元、 共他人、材、机单价按 (新工管市政工程後算定額) (2010 版) 计取。

四、费率的取宠

企业管理费、利润、各项组织措施费的费率按《浙江省建设工程施工费用定额》(2010 版)及浙江省 有关规定的费率范围的低价计取;规费、税金按《浙江省建设工程施工费用定额》(2010 版)的规定计取。 五、编制依据

- 1,《浙江省市政工程预算定额》(2010版)。
- 《浙江省建设 L程施 L费用定额》(2010版)。
- 3. 浙建站计[2013]64 号——关于《浙江省建设工程费用定额》(2010 版)费用项目及费率调整的通知。
- 4、建建发[2015]517号——关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知。
- 5. 某市中华路排水管道 口程招标 L程量清单及 L程图纸。

#### 表 11-14 工程项目投标报价汇总表

□程名称:某市中华路排水管道 □程

第1页 共1页

胂厚	单位工程名位	金额/元
1	排水工程	183 595.00
1.1	市政	183 595.00
	合 计	183 595

#### 表 11-15 单位工程投标报价计算表

### 单位(专业) [程名称:排水 [程-市政

第1页 共1页

序号	汇总内容	计算公式	金額/元
	工程量清单分部分项工程费	Σ(分部分项 L程量×综合单价)	106 150.48
其中	1. 人工费+机械费	Σ(分部分项人工费+分部分项机械费)	36 105.79
:	措施项目费		65 676.00
2.1	(一) 施 L技术措施项目费	按综合单价计算	55 488.99
其中	2. 人工费+机械费	Σ(技措项目人工费+技措项目机械费)	38 251.95
2.2	(二) 施工组织措施项目费	按项计算	10 187.01
	3. 安全文明施工费	(1+2)×11.54%	8 580.88
	4. 冬雨季施工增加费	(1+2)×0.1%	74.36
	5. 夜间施工增加费	(1+2)×0.01%	7.44
	6. 已完工程及设备保护费	(1+2)×0.02%	14.87
	7. 二次搬运费	(1+2)×0%	0.00
	8. 行车、行人干扰增加费	(L+2)×2%	1 487.15
	9. 提前竣工增加费	(1+2)×0%	0.00
	10. [程定位复测费	(1+2)×0.03%	22.31
	11. 特殊地区施工增加费	(1+2)×0%	0.00
-4	其他项目费	按清单计价要求计算	0.00
ĮΖQ	规費 ンヘ	13+14/	5 428.12
	13. 推污费、社保费、公积金	(1+2)×4.3%	5 428.12
	14. 农民工工伤保险费	按各市有关规定计算	0.00
£	危险作业意外伤害保险费	按各市有关规定计算	0.00
六	单列费用	单列费用	0.00
Ł	税金	(一+二+三+四+五+计税不计费)×3.577%	6 340.40
八	下浮率	(一+二+三+四+五+六+七)×0%	0.00
九	建设工程造价	一+二+三+四+五+六+七-八	183 595.00

表 11-16 分部分项工程量清单与计价表

1141 601   502   5740 87   7   5740 87   5481 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
### ##################################
\$\pi_{\pi_{\pi_{\pi_{\pi_{\pi_{\pi_{\pi_
4 216.83 16 827.32 5 066.48
大工票 人工票 6 1943.51 0.00 6 494.40 4 316.94 4 316.94
大工票 人工票 6 1943.51 0.00 6 494.40 4 316.94 4 316.94
4/7. 4/16.20 1 500.40 1 694.35 515.70 113.97 404.20



单位(专业)工程名称: 建水工超三川路

世		101.46	107.72	37.28	28.42	4 94	15.42	295.24	6 6 6 6 9 6 9
1530	1	1 278.30	1358.58	592.80	170.95	29.38	69.45	3 499.46	27 500 00
₩₩.	H	4 279.89	4 467.70	3 453.08	1 544.78	167.52	663.52	14 576.49	the same of the sa
M444	ř.	4 279.89	4 467.70	4 513.83	4 054.53	4 653.25	4 045,86		
		-		0.763	0.381	0.036	0.164		
# #	8.	耄	. V E	ı	+	-	_		
-1111111		1100mm×1100mm 检测的水溶度并,并 深 2.991m. C10 香油酸十华5. C20 的 溶铝键 Liebe, M10 水配砂塞地双 NE10 机场, 1:2 水泥砂浆水和。C20 锅的泥 液 上,于空温板。C30 锅的泥煤上升场。 4700 铅煤井盖、单、介地湿土墁板。	1100mmv1250mm 每期商水溶胀升、苯 浓 320lm、C10 素溶液土垫房、C20 码 沥泥烧 1原长、M10 水泥砂浆砌板 MC10 K14、1.2 水泥砂浆炒桶。C20 铜粉液 液 1- 非单磁k、C30 铜粉油液 1- Fin 4700 粉以非温、脂、含油酸、螺旋	圆树	螺纹钢	MICH	螺纹钢	<b>本页小</b> 排	1. 4
		即放井	砌筑井	现浇构件钢筋	東流构作例筋	放制均值的影	放制均值知道		
		040504001002	9 040504001003	10 040901001001 现选构件网面	11 040901001002	12 040901002001	13 040901002002		
10	þ		6	10	=	12 (	13 (		

表 11-17 工程量清单综合单价计算表

单位(专业)下户名称: 排水工程 南政

							Ź.	10个单个厂				
2 4	=			ER		THAT			- P. C.	歌		合计/元
	040101002001	挖沟槽上方:一、二类七,4m以内	~E	1143.60	2.17	00:0	1.98	0.54	0.33	00.00	5.02	5 740.87
	1 56	挖漏机烧 、 类土, 不装车	1000m <sup>3</sup>	0.899 36	312.00	0.00	65.186.1	298.17	183.49	0.00	2 775.25	2 495.95
	1-59	松漏机控 、二类下, 数4	1000m <sup>2</sup>	0.151.96	312.00	000	3 140.82	448.87	276.23	0.00	4 177.92	634.88
	- 5 泰	人工控沟南、基坑土方、深 4m以内, 、二类土、人工输助 开控(也括切边、徐整底边)	100m³	0.922 9	2 331.88	0.00	0.00	303.14	186.55	0.00	2 821.57	2 604.03
	040103001001	同填方:一、二类七,场内下衡	m.	862.30	7.18	00'0	1.74	1.16	0.71	00.00	10.79	9 304.22
	1 87	棉、坑,填土夯实	100n	8.623	717.60	000	173.94	115.90	71.32	0.00	1 078.76	9 302.15
	040103002001	余方矣翼; 這距由投标人自行 确定	E E	151.96	0.00	0.04	. HL/S	1.45	0.89	0.00	13.53	2 056.02
	1 68+1 69×4 <sub>H</sub>	自卸汽车运士。运即 Skm	1000m <sup>3</sup>	0.151.96	0.00	35.40	11 146.95	14 49.10	891.76	0.00	13 523.21	2 054.99
4	040501001001	福祿上曾: D500, C10 經級上 特层, C20 賴筋混凝上基础, 承 插式橡胶橄铁口, 闭水试验, 含混液上模板	E	90.09	72.16	231.89	5.73	10,13	6.23	00.00	326.14	29 352.60
	6 268	规法规扩准数/垫层, C10(40)	10m <sup>3</sup>	0.948	842.80	1814.57	93.56	121.73	74.91	0.00	2 947.57	2 794.30
	6-276 換	集(管)道灌蔽土华基, 现浇现拌灌装土, C20(40)	10m <sup>3</sup>	0.618	1 190.70	2 055.77	192.11	179.77	110.62	00.00	3 728.97	2 304,50
	6 282 换	温凝土省域,现浇现井温凝土, C20(40)	10m³	1.348	1 362.20	2141.71	173.50	199.64	122.86	0.00	3999,91	5391.88



第2页 株8页

1							3	<b>经合当价</b> 厅				1
271	•			8		See Assess	David.	7	-Pater	最用	d region	
	6 27	水岳式海液十普道辅设, 人工 下答, 管径 500mm 以均	100m	0.878	1 267 00	15 150.00	0.00	164.71	101.36	0.00	16 683.07	14 647.74
	6 179	排水管道、混凝 1 管於國(承插) 接口, 實修 200mm 以均	10 10	40	114 10	169.44	0.00	14.83	9.13	0.00	307.50	861.00
	6 212	常道团本试验, 管径 500mm 以内	100m	6.0	160 30.	146.76	00 0	20.84	12.82	0 0 0	340 72	306.65
	6 1044	建設上管道格层木機	100m <sup>2</sup>	01756	860 16	1 851.93	41.92	117.27	72.17	000	2 943,45	516,87
	6-1094	现流混凝上管, 渠道平基钢模	100m²	0.140.5	0 140 5 1 905 75	1 497 73	133.10	265 05	163 11	0.00	3 964 74	557.05
	9601 9	現洛混散上作座領機	100m²	0 365 2	3 090.78	1 501.09	133,10	419.10	257.91	0.00	5 401.98	1 972.80
5	040501004001	塑料管: DN400, 砂基電, 承 福式橡胶圈接口, 闭水试验	E	87.00	49.62	217.94	131	6.62	4.07	0.00	279.56	24 321.72
	6 266	砂塘层	10m³	1.601	329 00	727.15	17,44	45.04	27.72	0.00	1 146.35	1 835.31
	6 286	實砂沟槽回城	10m <sup>3</sup>	13.181	242,90	711.86	6.50	32.42	19.95	0.00	1 013.63	13 360.66
	6 46	塑料排水管铺设、管径 400mm 以内	m001	0.837	422.80	9 654.73	00:00	54.96.	33.82	0.00	10 166.31	8 509.20
	6 194	塑料排水管,承插式橡胶圈接 [1]、管径400mm以内	10 个日	1.2	110.60	208.40	00:00	14,38	96 96	0.00	342.23	410.68
	6-211	管道闭水试验, 管径 400mm以内	100m	0.87	116.90	95.05	00.00	15.20	9.35	0.00	236,50	205.76

单位(专业)1 超交级: 桂水下超一川的

P. (12)	5 V() L K2 2 K	单位(专业)工程名称: 排水工程=山斑	4				<b>1</b>	综合单价厅		П	第3页	出るの
4. 4	海	称	N 4	## A	JEY.	S takes	2000	TOL	1 4 3 4	阿爾斯	1	合计/元
9	040504001001	80.32月: 1100mm #1100mm #9 140mm #9 14	- 登	) 4	1,266.62	2 551.95	101.05	177.80	109.41	0.00	4 206.83	16 827 32
	6-229 模	混被上井巷屋, 現洗規拌混凝   C10(40)	10m³	6 201	973.00	1.839,54	193 02	151 58	93.28	0.00	3 250.42	653.33
	6 276 换	井底板現浇児排滤器土, C20(40)	10m³	0.333	1 190.70	2 055.77	192.11	179.77	110.62	0.00	3 728.97	1 241.75
	6-231 换	矩形片砖砌, 水泥砂浆, MI0.0	10m³	1.749	797.23	2 611 59	71.98	113.00	69.54	0.00	3 663.34	6 407.18
	6 230 旅	a形片码砌, 水泥砂浆, M100	10m <sup>4</sup>	0 239	66 090 1	2 672 10	101 05	151 07	95.96	0.00	4 078.17	974.68
	6 237	岐端 片壁抹灰	100m²	1.0672	11 059 1	505.18	67.54	223 29	137.41	00.00	2 583.53	2 757.14
	6 239	岭坳沁槽沐灰	100m <sup>2</sup>	0.0856	1 389.99	505.18	67.54	84.681	116.60	0.00	2 268.79	194.21
	6 337	钢筋混凝上并氧盖板预制, C20(40)	10m³	0.079	1 947.40	2 239.24	191.70	278.08	171.13	00.00	4 827.55	381.38
	6 348	的防湿湿干井室即形產板安養, 每块体积在0.3m3以内	10m³	0.079	1 056.58	270.79	185.10	161.42	99.33	0.00	1 773.22	140.08
	6-249 换	的的混造上并撤割作, 現涂現 排電凝土, C30(40)	10m³	0.073	1 277.50	2 290.01	192 60	191.11	117.61	0.00	4 068.83	297.02

単位(小小) 程序級: 棒水工程-川政

孔位	単位(专业)1世名称: 拝水工程=市政	排水上程− <b></b> 市域									海4以	TE 8 10
1							M	2000年6年				
at a	Ī			#	7	Append	10.00	1974		田山	A Paris	
	6 353	井國文装, 体积 0.5m <sup>3</sup> 以内	1001	0.073	1 383.62	307.76	185.10	203.93	125.50	00'0	2 205.91	161.03
	6 252	份机检查并并盖交装	- 英 01	800	348.60	6 585.77	0.00	45.32	27.89	0.00	7 007.58	2 803.03
	6 1044	并格尼本模	100m²	0.053 8	860.16	1 851.93	41.92	117.27	72.17	00.0	2 943.45	105.38
	6 1094	<b>井底板钢模</b>	100m <sup>2</sup>	0.0653	1 905.75	1 497.73	133.10	265.05	163.11	00.0	3 964.74	258.90
	6-1111	[6]   中安語板复合本機	10m <sup>1</sup>	0.079	943,86	\$02.96	63.50	131.18	80.72	00'0	1 723.92	136.19
	6-1121	<b>原的限数 1 井    本                              </b>	10m³	0 073	1 993.74	1 900.40	13.52	260.94	160.58	0.00	4 329.18	316.03
1	040504001004	與項月: 110kmm: 1100mm 好 相相不能停止。 中級 221m。 C10 素油酸十铯厚, C20 特的 電液中处。 M10 水泥砂火阳 页 M10 水泥砂火阳 页 M10 水泥砂火阳 互 水泥砂火焰。 C20 特筋溶液 十二 十二等面低,C30 特筋溶液 十二 样面, 4700 体形并盖。 全 名 精液 上級	墨	+	1172.46	2 437 69	94 94	164 76	101.39	00 0	3 971.24	3 971.24
	6 229 换	超載上井棒层,現港現井福祉 上,C10(40)	10m³	0.05	973.00	1 839.54	193.02	157.58	93.28	00:00	3 250.42	162.52
	6 276 換	井底板塊洗現井滬凝上, C20(40)	10m³	0.083	1 190.70	2 055.77	192.11	77 671	110.62	00:00	3 728.97	309.50
	6 231 换	页形并砝砌, 水淀砂浆 M10.0	10m³	0.444	797.23	2 611.59	71.98	113.00	69.54	0.00	3 663.34	1 626.52
	6 230 换	网形井崎側, 水泥砂浆 M10.0	10m³	0.017	1 060.99	2 672.10	101.05	151.07	95.96	0.00	4 078.17	69.33
	6 237	展播并坐採灰	100m <sup>2</sup>	0 234 4	1 650.11	505.18	67.54	223.29	137.41	0.00	2 583.53	605.58
	6 239	标编流槽法灰	100m <sup>2</sup>	0 021 4	1 389.99	505.18	67.54	189 48	116.60	0.00	2 268.79	48.55

单位(专业)工程名称: 排水工程 七改

							<b>综合单价</b> 师				
	AN		ŧ,	V de C	1. Shifter	- Transport	4 4 h	i Para Para	華	SPEAN.	
6 337	钢筋電線上井宇函板 版制, C20(40)	10m²	200	1 947.40	2 239.24	191.70	278 08	171.13	0.00	4 827.55	96.55
6 348	钢筋混凝土并至华形温板交装, 每软体积低 0.3m3以内	10m³	0 05	1 056.58	270.79	185.10	161 42	99.33	0.00	1 773.22	35.46
6-249 换	的的混凝上并固制作,現浇現 拌泡凝土,C30(40)	10m³	0 018	1277.50	2 290.01	192.60	11 161	11761	0.00	4 068 83	73.24
6 353	并割安装, 体积 0 5m 以内	10m³	0.018	1 383.62	307 76	185.10	203 93	125.50	0.00	2 205 91	39.71
6 252	铸铁给合井井盖安装	9 01	0.1	348.60	6 585.77	00.00	45.32	27.89	0.00	7 007.58	700.76
6 1044	并垫层水板	100m²	0.009	860.16	1.851.93	41 92	117.27	72.17	0.00	2 943.45	26.49
6 1094	井底板钢模	100m²		0.0163 1.905.75	1 497.73	133.10	265.05	163.11	0.00	3 964.74	64.63
6 1111	预制井室盖板复合本模	10m3	0.02	945.56	502.96	63.50	131.18	80.72	0.00	1 723.92	34,48
6 1121	负勒提議十井國本機	10m³	0.018	1 993.74	1 900.40	13.52	260.94	160.58	00.00	4 329.18	77.93
040504001002	- 前辺月: 1100mm・1160mm 時 - 前房水常柱- 井澤 2.991m - 行成 1.64 - 村澤 2.991m 電機 1.64 - M10 水電砂楽局 英 MUI 0 旧。 1.2 水電砂楽 将面,Cの 領防温隆上井電 長 C.30 約筋温隆 - 月間。4700 移後井重、建。含電線上機延	£	-	1 278.30	2 610.38	101.46	179.37	110.38	0.00	4 279.89	4 279.89
6 229 换	混凝上并垫层,现浇现排混溢 上,CI0(40)	10m³	9 0 0	973.00	1 839.54	193.02	151.58	93.28	0.00	3 250.42	162.52



第6页 共8

1835.33 4 467.70 309.50 92.00 741,73 12.68 8156 96.55 35.46 73.24 56.49 54.63 34.48 77.93 4 ()68.83 4 467.70 7 007.58 2 943.45 3 964.74 1 723.92 4 329,18 3 728.97 3 663.34 4 078.17 2 583.53 4 827.55 1 773.22 2 205.91 0.00 000 00.0 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 00.0 00.0 117.30 11062 92.96 137.41 171.13 117.61 125.50 163.11 160.58 69.54 99,33 27.89 80.72 190.62 223.29 131 18 779.77 113.00 151.07 278.08 161.42 191.11 203.93 117.27 265 05 260.94 45.32 107.72 91.70 85,10 92.60 85.10 33,10 101.05 92.11 67.54 11.92 63.50 71.98 13 \$2 0.00 2 290.01 2 693.48 2 611.59 2 672, 10 505.18 270.79 307.76 502.96 1 900.40 2 055.77 2 239.24 6 585.77 1 851.93 1 497.73 358.58 1 947.40 1 190.70 1 060.99 650.11 1 056.58 1277.50 1383.62 860.16 1905.75 1 993.74 348.60 945.56 797.23 0.287 1 0.018 6000 0.018 0.083 0.02 0.018 0.0163 機器 0.501 0.05 0.02 0.02 0.1 10m3 100 100m2 10m3 100m<sup>2</sup> 10m3 10m3 10m 37 01 (00m 10m3 10m3 10m3 规论规 城(言)坦、混隆二十基,現洛規 水流砂浆, M10.0 动形并岭砌, 水泥砂浆, M10.0 刻策并: | 100mm×1250mm 時 C10 素洗凝土垫层, C20 納筋 混凝土底板, M10 水泥砂浆侧 筑 MUI0 机砖, 1:2 水泥砂浆 抹面, C20 钢筋混凝十并室盖 板,C30 锅煎灌凝上炸圈, 4700 含混凝上模板 妈的记录一井宅出板原制, 的雨水落底井, 井深 3.201m。 知治混凝一并容節形在板 每块体积在 0.3m3 以内 体积 0.5m3 以内 网络范蠡士 片圆制作, 後剛紀数上井岡木模 铸铁检作并并盖安装 拌泥椽土, C20(40) 并流溢七, C30(40) 爱 位(专业)工程名称, 排水工程, 而 砖墙井堆林灰 均形片砖砌, 井垃板钢模 **川格尼木模** 并固安装, 路铁片盖、 C20(40) 040504001003 6 249 换 6 230 换 6 276 换 6-231 操 6 1044 6 1121 6 1094 6 237 6-337 6-348 6 353 6-252 6-1111

第7页 共8页

	-		-					<b>给合单价</b> 层				Vita
生中	业康	1	単位		人工廠	林旭栗	机线槽		惠	1 3		元
	6 229 換	启凝于并华层,现法现开混凝 : E, C10(40)	10m,	0.034	973.00	1 839.54	193.02	151.58	93.28	0.00	3 250 42	175.52
	6 276 後	渠(管)道, 混凝土平蓋, 鬼溶現 杵混凝土, C20(40)	10m,	0.089	1,190.70	2 055.77	192.11	17977	110.62	0.00	3 728.97	331.88
	6 231 换	年形井岳朝, 水池砂浆, MIOO	10m3	0.502	797.23	2 611.59	71 98	113.00	69.54	000	3 663 34	1 839.00
	6 230 换	网形井砖砌, 水滩砂浆, MI0.0	10m³	0.035	1 060.99	2 672.10	101.05	151.07	92.96	000	4 078 17	142.74
	6 237	妈墙   中华林攻	100m²	0.3133	1 650 11	505.18	67 54	223.29	137.41	0000	2 583.53	809.42
	6 337	钢筋混凝上并至盖板预制, C20(40)	10m³	0.022	1 947,40	2 239.24	191.70	278.08	171.13	0.00	4 827.55	106.21
	6 348	倒的溫凝一月童拖形攝板安 沒, 60以体积(f.0.3m²以内	10m3	0.00	1,056.58		270.79 185,10	161.42	99.33	0.00	1 773.22	39.01
	6 249 换	钢筋混凝上井區制作, 规浇规 作建波上, C30(40)	10m3	0.018	1 277.50	2 290.01	192,60	11 161	117.61	0.00	4 068 83	73.24
	6 353	月1四支装, 体积 0.5m 以内	$10m^3$	0.018	1 383.62	307.76	185.10	203 93	125.50	000	2 205.91	39.71
	6 252	的铁枪合并并盖女装	10 条	0.1	348.60	6 585.77	000	45.32	27.89	0.00	7 007.58	700.76
	6 1044	井堡层本模	100m <sup>2</sup>	0.009 3	860.16	1 851.93	41.92	11727	72.17	0.00	2 943,45	27.37
	6 1094	井底板納模	100m²	0.0169	1 905.75	1 497.73	133.10	265.05	163.11	00.00	3 964.74	67.00
	1111 9	預知, 井室 蓝板 复合 木模	10m,	0.022	945.56	502.96	63 50	131.18	80.72	0.00	1 723 92	37 93
	6 1121	<b>长和,混液上井圈木模</b>	10m3	0.018	1 993.74	1 900.40	13 52	260.94	160.58	0.00	4 329.18	77 93
10	040901001001	规浇构件树筋, 圆钢	-	0.765	774.90	3 517.24	48.73	107.07	68.89	0.00	4 513.83	3 453.08
	6 1124	現法构件網筋(网網), 直径 ≠10、≠8	3	0.765	774.90	3 517.24	48.73	107.07	62.89	0.00	4 513.83	3 453.08

第8页 共8页

单位(专业)工程名称: 排水工程-市政

m 5	1	4		Ŧ		THE PERSON	机瓶面	1000	- Alexandria	形電	Prese	
-	040901001002	规法构件树筋; 螺纹钢	-	0.381	448.70	3 421.34	74.60	68.03	41.86	0.00	4 054.53	1 544.78
	6-1125	現浇构件钢筋(螺纹钢),直径 ≠10	1	0.381	448.70	3 421.34	74.60	68.03	41.86	00.00	4 054.53	1 544.78
12	040901002001	预制构件钢筋: 网锅	-	0.036	816 20	3 499.76	137.10	123 93	76.26	0.00	4 653 25	167 52
	9 1126	顶切构件钢筋(周钢),再往644、 46	-	0.036	816 20	3 499.76	137.10	123.93	76.26	0.00	4 653.25	167.52
2	040901002002	负制构件钢筋·螺纹钢	ı	0.164	423,50	3 419.63	94.05	67.28	41.40	0.00	4 045.86	663.52
	6 1127	预制构件钢筋(螺纹钢), 直径 ≠10、≠12	-	0.164	423.50	3 419.63	94.05	67.28	41.40	0.00	0.00 4 045.86	663.52
			,	41	7.7	1						106 150.48

表 11-18 施工技术措施项目清单与计价表

	4.1					
		73		96	66	66
其中/元	九黨隊	1 4342.73	00.00	1 404.26	15 746 99	15 746
¥	人工順	2 0794.23	870.73	840.00	22 504.96	22 504.96 15 746 99
452	- Audi	5 0462,29	1 094.59	3 932 11	55 488.99	55 488.99
MAMAN.		2 968.37	156.37	3 932.11		
7		17	7	-		
1	1000	小夜	圕	台·决		
The state of the s		经单用户降水	4m 以内	lm。服带式挖掘机	本页小计	h &
and Advanced	The Part of	打水、碎木	井字架	大型机械设备进出 场及安拆		
Divini	The state of the s	041107002001	2 041101005001 井字梨	3 041106001001		
批	uje	-	2	6		

表 11-19 措施项目清单综合单价计算表

						**	综合单价师				
=	-	El.	3	MIX	有科學	机械等	-	N. Carlot	服	in the second	
041107002001	手水、游水: 特型井·ri 路水	保夜	J. K.	JA -1 223.19	467.46	843 69	268 69	165 34	000	2 968.37	50 462.29
323	程型非点降水安装	10 概	18.3	645.82	379.61	294 74	122 27	75.24	000	1 517 68	27 773.54
1 324	轻型并点降水拆除	10 根	18.3	230.37	0.00	180 30	\$3.39	32.85	00.0	16'961	9 093.45
1 325	使用给型井点降水	<b>统·</b> 火	34	140.00	29.41	166.16	39.80	24.49	000	399.86	13 595.24
041101005001	井字架: 4m 以内	堂	7	124.39	5.86	0.00	16.17	9.95	0.00	156.37	1 094.59
6 1138	创价井字架, 井深 4m 以内	堂	7	124.39	5.86	0.00	16.17	9.95	00.0	156.37	1 094.59
041106001001	大型机械设备进出场及安 拆: lm <sup>3</sup> 假带式挖掘机	令 ※	-	840.00	1 216.56	1 404.26	291.75	179.54	00'0	3 932.11	3 932,11
3001	模带式挖掘机, 1m 以内	台班	-	840.00	1 216.56	1 404.26	291.75	179.54	00'0	3 932.11	3 932.11
			<=	***		į					SS 488 99

#### 表 11-20 施工组织措施项目清单与计价表

单位(专业) [程名称: 排水 [程 市政

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基数	赛率/%	金额/元
1	安全文明施工费	人工费+机械费	11.54	8 580.88
2	其他组织措施费			1 606.13
2.1	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0.1	74.36
2.2	夜间施工增加费	人工费+机械费	0.01	7.44
2.3	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.02	14.87
2.4	二次搬运费	人工费+机械费	0	0.00
2.5	行车、行人干扰费增加费	人工费+机械费	· · · 2	1 487.15
2.6	提前竣工增加费	人工费+机械费。	0	0.00
2.7	工程定位复测费	人工费+机械费	0.03	22.31
2.8	特殊地区施工增加费	人工费+机械费	0	0.00
2.9	其他施工组织措施费	按相关规定计算	0	0.00
	合 计	1 /11 m		10 187.01

#### 表 11-21 其他项目清单与计价表

工程名称: 市政

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	金額/元	备注
1	智女,金额	心。	0.00	
2	暂估价 .:	· / 、、	• 0.00	
2.1	专业工程智估价	承少	0.00	
3	计目 [ ]	· 1	0.00	
4	总承包服务费	元	0.00	
	合 计		0.00	

注: 本工程无其他清单项目,其他项目清单包括的明细清单中金额均为零。本例不再放入相应的明细 清单。

#### 表 11-22 主要工日价格表

单位(专业)工程名称:排水工程-市政

第1页 共1页

序号	工种	单位	数量	单价/元
1	·类人工	TH	133.353	65
2	二类人工	EI.	615.070	70
3	人工(机械)	ĽН	38.177	70

表 11-23 主要材料价格表

#### 单位(专业)工程名称:排水工程 市政

第1页 共1页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价/元	备注
- 1	0101001	螺纹钢	Ⅱ级综合	t	0.556	3 300	
2	0109001	阅钢	(综合)	t	0.817	3 400	
3	0403045	黄砂(毛砂)	综合	t	348.034	40	
4	0413091	混凝土实心砖	240mm×115mm×53mm	干块	19.193	400	
5	1431437	UPVC 双壁波纹排 水管	DN400	m	84.956	95	
6	1445021	钢筋混凝土承插管	φ500×4 000mm	m	88.678	150	
7	3301031	铸铁井盖	<b>∮700 轻型</b>	套	7,000	649	
8	j3115031	电(机械)		kW h	13.769.765	0.854	
9	0205605	橡胶圏	DN400	. 兒	12.180	20	
10	8021211	现浇现拌混凝土	C20(40)	- Tm <sup>2</sup>	27.354	192.937	
11	9908042	射流井点泉	最大抽吸深度 9.5m	台班	102.000	55.387 9	

表 11-24 主要机械台班价格表

单位(专业)工程名称: 排水工程-市政

第1页 共1页

序号	机械设备名称	单位	数量	单价/元
1	履带式推土机 90kW	台班人	0.360	732.633 5
2	履带式单斗挖掘机(液压)1m3	、台班X一	1.806	1 105.38
3	电动夯实机 20~62kg•m	台班	70.092	21.796 4
4	履带式电动起重机 5t	<b>长</b> / 台班	19.215	171.71
5	汽车式起重机 50	台班	1.212	357.21
6	裁货汽车 5t	台班	0.215	344.136 5
7	自卸汽车 12t	台班	2.371	698.776 5
8	平板拖车组 40t	台班	1.000	1 047.049 5
9	机动翻斗车lt	台班	4.481	136.730 5
10	洒水汽车 4 000L	台班	0.091	410.056
11	电动卷扬机单筒慢速 50kN	台班	0.332	120.744 4
12	双锥反转出料混凝土搅拌机 350L	台班	2.355	123.726 1
13	灰浆搅拌机 200L	台班	1.370	85.572 9
14	钢筋切断机 φ 40	台班	0.139	38.823 4
15	钢筋弯曲机 🛮 40	台班	0.280	20.951 2
16	木工圆锯机ø500	台班	0.089	25.386
17	木工压刨床单面 600mm	台班	0.029	33.414 4
18	电动多级离心清水泵 H<180m	台班	10.431	400.579 5
19	污水泵ø100	台班	10.431	116,51
20	射流井点泵最大抽吸深度 9 5m	台班	102.000	55.387 9

续表

序号	机械设备名称	单位	数 量	单价/元
21	直流弧焊机 32kW	台班	0.227	94.274 4
22	对焊机容量 75kV·A	台班	0.038	123.056 6
23	点焊机长臂 75kV·A	台班	0.049	175.914
24	混凝土振捣器平板式 BLL	台班	7.076	17.556
25	混凝土振捣器插入式	台班	2.393	4.826

## ① 思考题与习题 〕

#### 一、简答题

- 1. 《建设工程工程量清单计价规范》中,市政管网工程主要列了哪些清单项目?
- 2. "钢筋混凝土管道铺设"清单项目与定额子目的工程量计算规则相同吗?
- 3. "混凝土管道铺设"清单项目通常包括哪些组合工作内容?
- 4. 混凝土管道的混凝土基础施工时,模板的安拆否包含在"混凝土管道铺设"清单项目中? 編制工程量清单时,如何处理其模板?
  - 5. "塑料管道铺设"清单项目通常包括哪些组合工作内容?
  - 6. "砌筑检查井"清单项目通常包括哪些组合工作内容?
- 砌筑检查井的混凝土基础底板、垫层施工时、模板的安拆否包含在"砌筑检查井" 清单项目中? 编制工程量清单时,如何处理其模板?
  - 8. "砌筑检查井"清单项目是否包括检查井施工时搭设的脚手架、井字架?

#### 二、计算题

某段雨水管道平面图、基础图如图 11.3 所示, 试确定"管道铺设"清单项目及项目编码, 计算各清单项目工程量, 并确定其组合工作内容、计算其定额工程量。




图 11.3 某段雨水管道的平面图、基础图

# 第12章

# 桥涵工程清单 计量与计价

# 本章学习要点

- 1. 桥涵工程清单项目的工程量计算规则、计算方法。
- 2. 桥涵工程招标工程量清单编制龙骤、方法、要求。
- 3. 桥涵工程清单计价(投标报价)的步骤、方法、要求





某桥梁采用钻孔灌注桩基础,如下图所示。灌注桩直径为1m,共28根、入岩0.5m,钻孔灌注桩采用回旋钻机成孔,计算钻孔灌注桩相关的清单工程量、定额工程量。清单工程量、定额工程量相同吗?有什么区别?



# 12.1 桥涵工程清单项目

#### 12.1.1 桥梁工程分部分项漕单项目设置

《市政工程工程量计算规范》(GB 50587—2013)附录桥插工程中,设置了9个小节105 个清单项目,9个小节分别为: 桩基、基坑及边坡支护、现浇混凝土构件、预制混凝土构件、确筑、立交箱源、钢结构、装饰、基体。

本节主要介绍桩基、现浇混凝土构件、预制混凝上构件、砌筑、装饰、其他等小节中 清单项目的设置。

#### 1. 桩基

本小节根据不同的桩基形式设置了 22 个清单项目: 预制钢筋混凝 上方桩、预制钢筋混凝 上方管桩、钢管桩、泥浆护壁成孔灌注桩、沉管灌注桩、干作业成孔灌注桩、挖孔桩 上(石) 方、人工挖孔灌注桩、钻孔压浆桩、灌注桩后注浆、截桩头、声测管。

# 特别提示

桩基陆上工作平台搭拆工作内容包括在相应的清单项目中,若为水上工作平台搭拆, 应柱措施项目单独编码列项。

#### 2. 现浇混凝土构件

本小节根据桥涵工程现浇混凝土构件的不同结构部位设置了 24 个清单项目;混凝土垫层、基础、承台、墩(台)帽、墩(台)身、支撑梁及横梁、墩(台)盖梁、拱桥拱座、拱桥拱肋、拱上构件、箱梁、连续板、板梁、拱板、挡墙墙身、挡墙压顶、楼梯、防撞护栏、桥面铺装、桥头搭板、桥塔身、连系梁、其他构件、钢管拱混凝土。

## 特别提示

台帽、台盖梁均应包括耳墙、背墙。

#### 3. 预制混凝土构件

本小节根据桥涵工程预制混凝土构件的不同结构类型设置了 5 个清单项目:预制混凝 上梁、立柱、板、挡上墙墙身、其他构件。

## 特别提示

浙江省朴充规定: 对于基础、柱、梁、板、墙等结构混凝土, 混凝土模板应按措施项目单独列项。

预制混凝土构件清单项目均包括构件的场内运输

#### 4 研究

本小节按测筑的方式、部位不同设置了5个清单项目: 垫层、干砌块料、浆砌块料、砖砌体、护坡。

#### 5. 装饰

本小节按不同的装饰材料设置了 5 个清单项目: 水泥砂浆抹面、剁斧石饰面、镶贴面层、涂料、油漆。

#### 6. 其他

本小节主要是桥梁栏杆、支座、伸缩缝、泄水管等附属结构相关的清单项目, 共设置 了10个清单项目:金属栏杆、石质栏杆、混凝土栏杆、橡胶支座、钢支座、盆式支座、桥 梁伸缩装置、隔声屏障、桥面排(泄)水管、防水层。

各小节清单项目的项目名称、项目编码、项目特征、计量单位、 C程内容、 C程量计算规则、可组合的主要内容可参见本书附录。

# 特别提示

除上述清单项目以外, 常规的桥梁工程的分部分项清单项目一般还包括《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013)附录 A 土石方工程、附录 J 钢筋工程中的相关清单项目, 如果是改建的桥梁工程, 还应包括附录 K 拆除工程中的有关清单项目。



附录 J 钢筋工程中与桥涵工程相关的清单项目主要有: 现浇构件钢筋、预制构件钢筋、 钢筋宽、先张法预应力钢筋、后张法预应力钢筋、预理软件等。

附录 K 拆除工程中与桥涵工程相关的清单项目主要有:拆除混凝土结构。

#### 12.1.2 桥涵工程分部分项清单项目工程量计算规则

本节重点介绍桥涵工程中常见的清单项目的计算规则及计算方法。

#### 1. 桩基

(1) 预制钢筋混凝土方桩:以米计量,按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算;或以立 方米计量,按设计图示桩长(包括桩尖)乘以桩的断面积计算;或以根计量,按设计图示数 量计算。

# 知识链接

在计算工程量时,要根据具体工程的施工图、结合桩基清单项目的项目特征,划分不同的清单项目,分别计算其工程量。

如"钢筋混凝土方桩"项目特征有5个,需结合工程实际加以区别。

- (1) 地层情况。
- (2) 送桩深度、桩长。
- (3) 桩截面。
- (4) 桩倾斜度.
- (5) 混凝土强度等级。



如果上述 5 个项目特征有 1 个不同, 就应是 1 个不同的具体的清单项目, 其钢筋混凝土方桩的工程表应分别计算。

【例12-1】某单跨小型桥梁,采用轻型桥台、钢筋混凝土方桩基础,桥梁桩基础如图 12.1 所示,试计算桩基清单工程量。

【解】根据图 12.1 可知,该桥梁两侧桥台下均采用 C30 钢筋混凝土方桩,均为直桩。 但两侧桥台下方桩截面尺寸不同,即有 1 个项目特征不同,所以该桥梁工程桩基有 2 个清单项目,应分别计算其工程量。

- (1) C30 钢筋混凝土方桩(400mm×400mm),项目编码: 040301001001 清单工程量=15×6=90(m)
- (2) C30 钢筋混凝土方桩(500mm×500mm), 项目编码: 040301001002 清单工程量-15.5×6-93(m)

# 特别提示

- (1) 打入桩清单项目包括以下工程内容: 搭折桩基础支架平台(陆上)、打桩、送桩、接桩: 但不包括桩机进出场及安折, 桩机进出场及安折单列施工技术措施项目计算。
  - (2) 本节所列的各种桩均指作为桥梁基础的永久桩, 是桥梁结构的一个组成部分, 不

是临时的工具桩。《浙江省市政工程预算定额》(2010版)第一册《通用项目》中的"打拔工 具桩",均指临时的工具桩、不是永久桩、要注意两者的区别。

(3) 各类预制桩均按成品构件编制,购置费用应计入综合单价,如采用现场预制,包括预制构件制作的所有费用。

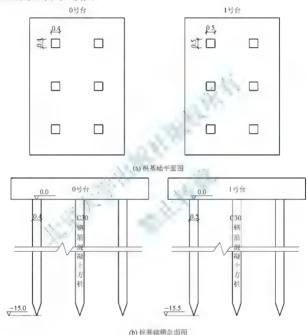


图 12.1 桥梁桩基础图(单位: m)

(2) 泥浆护壁成孔灌注桩:以米计量,按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算;或以立 方米计量,按不同截面在桩长范围内以体积计算;或以根计量,按设计图示数量计算。

【例 12-2】 某桥梁钻孔灌注桩基础如图 12.2 所示,采用回旋钻机施工,桩径为 1.2m, 桩项设计标高为 0.00m, 桩底设计标高为 -29.50m, 桩底要求入岩,桩身采用 C25 水下混凝



- 土。试计算桩基(1根)清单工程量和定额工程量(成引、灌注混凝土的工程量)。
- 【解】(1) 清单项目名称: 泥浆护壁成孔灌注桩(ø1 200、桩长 29.5m, 回旋钻机, C25 水下混凝土)


项目编码: 040301004001

清单工程量=0.00-(-29.50)=29.50(m)

(2) 定额工程量

成孔工程量=[1.00-(-29.50)]×(1.2/2)<sup>2</sup>  $\pi \approx 34.49 (\text{m}^3)$ 

灌注混凝土工程量={[0.00-(-29.50)]+0.8}× $(1.2/2)^2\pi$  ≈ 34.27(m<sup>3</sup>)



- 特别提示
- (1)"泥浆护壁成孔灌注桩"清单项目可组合的工作内容包括: 搭拆桩基支架平台(陆上), 埋设钢护筒、泥浆池建造和拆除、成孔、入岩增加费、灌注混凝土、泥浆外运。计算时, 应结合工程实际情况、施工方案确定组合的工作内容, 分别计算各项工作内容的定额工程量。
- (2) "泥浆护壁成孔灌注桩"清单项目不包括桩的钢筋笼、桩头的截除、声测管的制作安装。
- (3) 人工挖孔灌注桩:以立方米计量,按桩芯混凝土体积计算;或以根计量,按设计图示数量计算。

人工挖孔灌注桩可组合的主要内容为: 安装混凝土护壁、灌注混凝土。

- (4) 挖孔桩上(石)方:按设计图示尺寸(含护壁)截面积乘以挖孔深度,以立方米为单位计算。
- (5) 截桩头:以立方米计量,按设计桩截面乘以桩头长度以体积计算;或以根计量,按设计图示数量计算。

截桩头可组合的主要内容包括: 截桩头、废料弃置。

(6) 声测管:按设计图示尺寸以质量计算;或按设计图示尺寸以长度计算。

#### 2. 现浇混凝土

- (1) 混凝上防撞护栏:按设计图示尺寸以长度计算,计量单位为m。
- (2) 桥面铺装: 按设计图示尺寸以面积计算, 计量单位为 m2。
- (3) 混凝土楼梯:以平方米计量,按设计图示尺寸以水平投影面积计算;或以立方米 计量,按设计图示尺寸以体积计算。
  - (4) 其他现浇混凝土结构: 按设计图示尺寸以体积计算, 计量单位为 m3。

# 特别提示

- (1)桥涵工程现浇混凝土清单项目应区别现浇混凝土的结构部位、混凝土强度等级等项目特征,划分并设置不同的清单项目,分别计算相应的工程量。
  - (2) 现浇混凝土清单项目的组合工作内容不包括混凝土结构的钢筋制作安装。
- (3)浙江省补充规定:对于基础、柱、梁、板、墙等结构混凝土、混凝土模板应按措施项目单独列项。

#### 3. 预制混凝土

预制混凝土清单项目工程量均按设计图示尺寸以体积计算, 计量单位为 m3。

# 特别提示

- (1)桥涵工程预制混凝土清单项目应区别预制混凝土的结构部位、混凝土强度等级等项目特征、划分并设置不同的清单项目、分别计算工程量。
- (2)预制混凝土清单项目包括的组合工作内容主要有:混凝土浇筑、构件场内运输、 构件安装、构件连接、接头灌菜等;不包括混凝土结构的钢筋制作安装。
- (3)浙江省补充规定:对于基础、柱、梁、板、墙等结构混凝土,混凝土模板应按措施项目单独列项。

#### 4. 砌筑

- - (2) 护坡工程量按设计图示尺寸以面积计算, 计量单位为 m2。

# 特别提示

砌筑清单项目应区别砌筑的结构部位、材料品种、规格、砂浆强度等项目特征, 划分 设置不同的具体清单项目,并分别计算工程量。

#### 5. 装饰

装饰清单项目 L程量均按设计图示尺寸以面积计算, 计量单位为 m2。

#### 6. 其他

- (1) 金属栏杆:按设计图示尺寸以质量计算,计量单位为t;或按设计图示尺寸以延长 米计算,计量单位为m。
  - (2) 石质栏杆、混凝土栏杆:设计图示尺寸以长度计算,计量单位为 m。
  - (3) 橡胶支座、钢支座、盆式支座: 按设计图示数量计算, 计量单位为个。
  - (4) 桥梁伸缩装置: 按设计图示尺寸以延长米计算, 计量单位为 m。
  - (5) 桥面排(泄)水管: 按设计图示尺寸以长度计算, 计量单位为 m。
  - (6) 防水层:按设计图示尺寸以面积计算,计量单位为m2。

#### 7. 钢筋工程

现浇构件钢筋、预制构件钢筋、钢筋笼、先张法预应力钢筋、后张法预应力钢筋、预 埋铁件, 按设计图示尺寸以质量计算, 计量单位为 t。

#### 12.1.3 桥涵工程技术措施清单项目

根据桥涵工程的特点及常规的施工组织设计,桥涵工程通常可能有以下技术措施清单项目。

#### 1. 大型机械设备进出场及安拆

工程量按使用机械设备的数量计算, 计量单位为台。次。

具体包括哪些大型机械的进出场及安拆,需结合工程的实际情况、结合工程的施工组织设计确定。

#### 2. 混凝土模板(基础、柱、梁、板、墙等结构混凝土)

工程量按混凝上与模板接触面积计算,计量单位为 m²。

混凝土模板应区别现浇或预制混凝土的不同结构部位、支模高度等项目特征,划分并设置不同的清单项目。

#### 3. 脚手架

- (1) 墙面脚手架: L程量按墙面水平线长度乘以墙面砌筑高度计算, 计量单位为 m2。
- (2) 柱面脚手架: L程量按柱结构外围周长乘以柱砌筑高度计算, 计量单位为 m2。
- (3) 仓面脚手: 工程量按仓面水平面积计算, 计量单位为 m2。

#### 4. 便道

工程量按设计图示尺寸以面积计算, 计量单位为 m2。

#### 5. 便桥

工程量按设计图示数量计算, 计量单位为座。

#### 6. 围堰

工程量以立方米计量,按设计图示围堰体积计算;或以米计量,按设计图示围堰中心线长度计算。

#### 7. 排水、降水

L程量按排、降水日历天计算, 计量单位为昼夜。

# 12.2 桥涵工程招标工程量清单编制实例

【例 12-3】 某工程在 K8+260 处跨越现状月牙河时建设桥梁一座,于 2016 年 3 月 1 日一3 月 7 日进行工程招投标活动,月牙河桥与道路中线斜交 70°、上部结构采用 20m 跨径的 预应力空心板简支梁,下部结构采用重力式桥台, Ø 100cm 钻孔灌注桩基础。桥面铺装采用 3cm 细粒式沥青混凝土和水泥混凝土、采用 GJZ100×150 极式橡胶支座,支座总厚度为 21mm。桥梁工程施工图如图 7.13~图 7.34 所示。本桥梁工程混凝土模板、桥梁栏杆不在本次计算范围,已知恰台基坑开挖方量(一、二类土)为 2 579.90m³, 其中人工辅助清底为 257.90m³, 其余用挖掘机挖土; 基坑回填土方量为 544.90m³, 台背回填砂砾石 1 387.03m³。已知原地面平均标高为 3.690m。

根据工程图纸,编制该桥涵工程的招标工程量清单。

【解】1. 根据施工图纸,依据《市政工程》程量计算规范》(GB 50857—2013),参考 《浙江省建设工程工程量清单计价指引》(市政工程),确定分部分项清单项目的项目名称、项目特征、项目编码,并计算其清单工程量、见表 12-1。

序号		公部分项 名称			HEEC	211
1	040101001001	拉基坑。上方	· . 类土: 4m 以内	m¹	己知	2 579.9
2	040103001001	回填方	· _类土、场内平衡	m <sup>3</sup>	已知	544.9
	040103001002	回填方	台背砂砾回填	m <sup>3</sup>	已知	1 387.03
3	040103002001	余万弃置	运距由投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	2 579.9-544.9×1.15	1 953.27
4	040301004001	泥浆护 壁 成 孔灌注桩	ø1000,设计桩长 50m、 回旋钻机成孔.C25 水下商 品混凝土	根	24×2	48
5	040301011001	截桩头	钻孔灌注桩, C25 混凝土	根	24×2	48
6	040303001001	混凝土垫层	10cm, C10	m³	64.915×(5+0.3×2)×0.1×2	72.70
7	040305001001	垫层	30cm, 片石	m³	查图 7.16	220.1
8	040303003001	混凝土承台	C25 混凝 上	m³	查图 7.16	1 035.0
9	040303005001	混凝土台身	C25 混凝 上	m³	835.7+36	871.7
10	040303004001	混凝土台帽	C30 混凝 上	m <sup>3</sup>	查图 7.16	140.2
11	040303019001	桥面铺装	C30 混凝土厚 8cm、细粒式 沥青混凝土桥面铺装 4cm	m <sup>2</sup>	8×20×2+12.5×20×2	820.00

表 12-1 分部分项清单项目及其工程量计算表

徒事

-		分部分项				续表
序号	项目编码	方部分项 清单项目 名称	项目特征		计算公式	工程量
12	040303020001	混凝 上桥 头 搭板	C30 混凝土	m³	11.97×8+15.32×4	157.04
13	040303021001	混凝土枕梁	C30 混凝土	m³	0.8×8+1.02×4	4.72
14	040303024001	混凝 上其他 构件	C40 小石子混凝土铰缝	m³	0.431×(11+14+29)	23.27
15	040303024001	混凝 上其他 构件	C25 现浇人行道梁、侧石	m³	6.4+8	14.40
16	040304001001	预制混凝土梁	C50, 20m 预应力空心板梁	m³	10.6×4+9.47×53	544.31
17	040304005001	预制混凝土 其他构件	C30,人行道板	λli <sub>3</sub> √	查图 7.33	7.46
18	040309004001	橡胶支座	GJZ100×150 板式橡胶束 座,支座总厚度为 21pm	*	57	57
19	040309007001	桥梁伸缩缝 装置	SPF 伸缩缝	m	64.195×2	129.83
20	040309009001	泄水管	\$10PVC	m-	.20×1.45×2	58
21	040901004001	钢筋笼	钻孔灌注桩	7	(1000 + 712.1+214.9+33.9)×48	94.123
22	040901001001	现浇构件钢筋	<b>则</b> 钢	t	(2 567×2+28.4×12+37.7× 54+8 780.6-1 022.8-277.8 -146.5)/1 000	14.844
23	040901001002	现浇构件钢筋	螺纹钢	t	(15109.2×2+1309.5×2+ (816.0+429.3+850.6+ 447.9)×4+(660.6+347.6+ 667.7+350.9+217.4)×8+ 242.9×12+30.4×54)/1000	66.564
24	040901002001	预制构件钢筋	例钢	t	(474.1×53+461.7×4+ 1 022.8+277.8+146.5)/1 000	28.421
25	040901002002	预制构件钢筋	螺纹钢	t	(193.5×53+208.9×4+ 112.14×57+52.85×4+ 41.73×53)/1 000	19.922
26	040901006001	后张法预应 力钢筋	ø 15.24 钢绞线, YM15-4  锚具, 波纹管压浆管道	t	370.49×57/1 000	21.118

<sup>2.</sup> 根据工程图纸、结合相关的施工技术规范要求及常规的施工方法,确定施工技术措施清单项目的项目名称、项目特征、项目编码、并计算其清单工程量,见表 12-2。

表 12-2 施工技术措施清单项目及其工程量计算表

序号	A FI AVI-L	技术措施 清单项目名称	, June	计量 单位	10 A 20 A 20	
1	041103001001	围堰	编织袋围堰	m¹	550.80	550.80
2	041107002001	排降水	轻型井点降水	昼夜	8	8

3. 根据工程实际情况,确定施工组织措施清单项目的项目名称、项目编码、见表 12-3。

表 12-3 施工组织措施清单项目及其工程量计算表

序号	项目编码	组织措施清单项目名称	3.3
1	041109001001	安全文明施 1.费	
2	041109002001	夜间施工增加费 、	1111
3	Z041109009001	工程定位复测费	- 10
4	041109005001	行车、行人干扰增加费	
5	041109007001	己完工程及设备保护费	

4. 编制本工程的招标工程量清单,见表 12-4~表 12-9。

(造价人员签字盖专用章)

编制时间:

表 12-4 招标工程量清单封面

某道路月牙河桥工程



复核时间:

(造价 工程师签字盖专用章)

#### 表 12-5 总说明

#### L 程名称: 某道路月牙河桥 L 程

第1页 共1页

#### 一、工程概况

月牙河桥与道路中线斜交70°、上部结构采用 20m 跨径的预应力空心板简支梁。下部结构采用重力 式桥台,有 100cm 钻孔灌注框基础。桥面铺装采用 3cm 细粒式沥青混凝土和水泥混凝土。本桥梁工程混 凝土模板、桥梁栏杆不在本次招标范围。已知桥台基坑开挖方量(一、一类上)2 579.90m<sup>3</sup>,其中人 L辅助 清底为 257.90m<sup>3</sup>,其余用挖掘把挖上;基坑回填土方最为 544.90m<sup>3</sup>,台背回填砂砾石 1 387.03m<sup>3</sup>。已知 温地面平均标态为 3.69m。

#### 二、施工方案

- 1. 钻孔灌注桩,采用回旋转机成孔、商品水下混凝土。
- 2. 梁板: 现场预制。
- 施工机械中的履带式挖掘机、履带式推土机、压路机的进出场费在道路工程预算中考虑,本桥架工程不计。
  - 4. 桥台施工过程中采用轻型井点降水,共计安装井点管 250 根,使用 8 天。
  - 5、桥梁施工时设置编织袋围堰、堰顶高上设计水位 0.5m, 围堰体积为 550.80m3。

#### 三、工程量清单编制依据

- 1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)。
- 2.《浙江省建设工程工程量清单计价指引》(市政工程)。
- 3. 《市政工程工程量计算规范》(GB 50857-2013)。
- 4. 市政道路工程施工相实规范。
- 5. 某道路月牙河桥工程施工图。
- 四、编制说明 \ /

多余的上方,泥浆外运、运距由投标人自行考虑;场内平衡的上方运输方式由投标人自行考虑。

#### 五、其他

- 1. 本工程风险费用暂不考虑,农民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险费暂不考虑,本工程无仓] 标化工程要求,本工程不得分包,本工程无管列金额、计日工。
  - 2、安全文明施工费按市区 "般工程考虑。

表 12-6 分部分项工程量清单与计价表

共2页	# 1																
第1页	其中/元 例 机磁素																
	TY THE																
	500年 元														1		
	Time I	2 579 90	544 90	1 387.03	1 953.27	48	48	72.70	220 10	1 635 00	835.70	140.20	544.31	7.46	820.00	157.04	
	#₩ #₩	m	m³	m³	, CLI	敬	報	m,	m,	TH <sub>3</sub>	, LLI	, cur	m3	, LLL	m <sup>2</sup>	E1113	
		一, 二类化, 4m以内	一、一类上、场内平衡	台背砂砾川市	运界由投标人自行考虑	♦1000.设月析长50m、迪旋结 机成化, C25 水下商品混凝土	钻孔推注机, C25混凝1	10cm, C10 73/	30cm, J. 41	C25 抱猴士	C25 混凝土	C30 泡撒十	C50, 20m 预应力学心板梁	C30. 人行道板	C30 港港 E17 8cm、细粒式沥片 泥碛十折面铺卷 4cm	C30 港級土	本原本目
桥梁 市政	11.11	挖基坑土方	同填方	回填方	余方弁置	泥浆护甲成化滞注析	截桁头	混凝土棒层	整层	混聚七条台	混凝土墩(行)身	混凝土墩(行)朝	預制混凝土業	預制混凝土其他构件	桥面编装	混凝土桥头搭板	
单位(专业)工程名称: 桥梁 市政	face state of the state of	040101003001	040103001001	040103001002	040103002001	040301004001	040301011001	040303001001	040305001001	040303003001	04030303005001	040303004001	040304001001	040304005001	040303019001	040303020001	
单位(-	任中	-	71	3	4	vo.	9	1	90	6	10	=	12	13	41	15	

在學 原軍 一個母子

-	N H VEX	and him	10年代	147		るかせる	其中/元	
	Z I I	Specifical Specifical		中位		氘	人工表 机械费	H/M
91	040303021001	混块   潜板枕梁	1 類別 05.3	<u>"</u> E	4.72			
17	040303024001	混凝土其他构件	C40 小小子混凝土软缝	m,	23.27			
00	040303024002	范操士其他构件	C25 規為人行道梁、阆石	m,	14.40			
6	040309004001	橡胶之账	GJZ100×150 极式响放支座, 支 地总厚度为21mm	<b>*</b>	57			
20	040309007001	桥梁伊塔技机	SPF 伸術缝	æ	129.83			
21	040309009001	桥面排(池) 水管	# 10PVC 18	m	58 00			
22	040901004001	彻的光	纪孔游江桥	*	94.123			
23	040901001001	规法构件物筋	风柳	1	14.844			
24	040901001002	规浇构件购筋	螺纹钢	1	66.564			
25	040901002001	预制构件钢筋	则柳	1	28.421			
26	040901002002	演电构件钢筋	螺纹钢	-	19,922			
27	040901006001	后张法询应力钢筋 (網丝束、钢绞线)	后张忠询应力的第 \$1524 解绞线,YMIS-4加良、(網丝束、網绞线) 波纹帝也浆쨤道	1	21.118	. 6		
1			本页小川			( )		
			de de	4				

#### 表 12-7 施工技术措施项目清单与计价表

序		·				<b>综合</b>	其中	1/57	_
号	arms.	31Am	Tives	10	=118	/元	- Amerika	Ushasa	主
1	041103001001	.制堰	编织袋制堰	m³	550.80				
2	041107002001	排水、降水	轻型井点降水	昼夜	8				
	•	本	页小计						
			승난						

#### 表 12-8 施工组织措施项目清单与计价表

				1 4
单位(专业)工程名称。	桥梁 市政		1.XX	-

平1//(:	7 化)工作石体: 你采 申収		(11)	第1页 共1页
序号	项目名称	计算基数	<b>豪率/%</b>	金额/元
1	安全文明施工费	人工费÷机械费/《个	1	
2	冬雨季施工增加费	人 T.费+机械费		
3	夜间施工增加费	人工费一机械费		
4	已完工程及设备保护费	人工费士机械费		
5	二次搬运费	人工费+机械费	.24	
6	行车、行人干扰增加费	人工费+机械费	7	
7	提前竣工增加费	人 T.费+机械费		
8	工程定位复测费	人工费+机械费 ,		
9	特殊地区施工增加费	人工费+机械费		
10	其他施工组织措施费	按相关规定计算		
	,\ "	合 计		

#### 表 12-9 其他项目清单汇总表

工程名称: 市政 第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	金额/元	备注
1	智夕, 金额	λĹ	0.00	
2	暂佔价	朮	0.00	
2.1	材料暂估价	朮	0.00	详见附表
2.2	专业工程暂估价	戊	0.00	
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			

注:本工程无其他清单项目,其他项目清单包括的明细清单均为空白表格。本例不再放入空白的明细 清单的表格。



# 12.3 桥涵工程清单计价(投标报价)实例

【例 12-4】 某工程在 K8+260 处跨越现状月牙河时建设桥梁一座,于 2016 年 3 月 1 日一3 月 7 日进行工程招投标活动。月牙河桥与道路中线斜交 70°、上部结构采用 20m 跨径的 页应力空心板简支梁,下部结构采用重力或桥合, Ø 100cm 钻孔灌注桩基础。桥面铺装采用 3cm 细粒式沥青混凝土和水泥混凝土。采用 GJZ100×150 极式橡胶支座,支座总厚度为 21mm。桥梁工程施工图如图 7.13~图 7.34 所示。本桥梁工程混凝土模板、桥梁栏杆不在本次计算范围,已知桥台基坑开挖方量(一、二类土)为 2 579.90m³, 其中人工辅助消底为 257.90m³, 其余用挖掘机挖土; 基坑回填土方量为 544.90m³, 台背回填砂砾石 1 387.03m³, 已知愿地面平均标高为 3 690m。

根据工程图纸和招标工程量清单、试按清单讨价模式采用综合单价法编制该道路工程的招标报价。

本工程风险费用暂不考虑,农民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险费暂不考虑, 本工程无创标化工程要求,本工程不復分句,本工程无暂列金额、计日工.

- 【解】本例题桥梁工程的施工方案,与定额计价模式下编制投标报价相同,具体可见 【例 7-24】。
- 1. 根据招标工程量清单中的分部分项工程量清单、工程图纸、结合施工方案、参考《浙 江省建设工程工程量清单计价指引》(市政工程)、确定分部分项清单项目的组合工作内容、 计算各组合工作内容的定额工程量、并确定其套用的定额子目。
- 2. 根据招标工程量清单中的施工技术措施项目清单、工程图纸、结合施工方案、参考《浙江省建设工程工程量清单计价指引》(市政工程)、确定技术措施清单项目的组合工作内容、计算各组合工作内容的定额工程量、并确定其套用的定额子目。
  - 3. 确定人、材、机单价, 判定工程类别、确定各项费率。
- (1) 围堰所需黏 上外购单价为 25 元/m³, YM15-4 为 15 元/套, 一类人 L L 日单价为 65 元, 二类人 L L 日单价为 70 元, 其他人、材、机单价按浙江省市政 L 程预算定额(2010 版) 计取。
  - (2) 根据工程类别划分,本工程为三类桥梁工程。
- (3)企业管理费、利润、各项组织措施费的费率按《浙江省建设工程施工费用定额》(2010版)及浙江省有关规定的费率范围的低值计取;规费、税金按《浙江省建设工程施工费用定额》(2010版)的规定计取。
  - 4. 计算清单计价模式下,本桥梁工程的工程造价,详见表 12-10~表 12-22。

#### 表 12-10 投标报价封面

#### 投标总价

招标 人:	
工程名称:	某道路月牙河桥工程
投标总价(小写):	5 060 650.18 $\pi$
(大写):	伍佰零陆万零陆佰伍拾元壹角捌分
	(单位盖章)
法定代表人	
或 其 授 权 人:	
	(签字或盖章)
编 制 人:	
	(造价人员签字盖专用章)

编制时间:

#### 表 12-11、总说明

工程名称: 某道路月牙河桥工程

第1页 共1页

#### 一、工程概况

月牙河桥与道路中线斜交 70°, 上部结构求用 20m 跨径的负应力空心板简支梁。下部结构采用 東力式桥台。 6 100cm 結孔維計柱基础。 桥面锁梁采用 3cm 细块式沥滤凝土和水泥溶凝土。 桥梁 工程施 [图如图 7.3 图 7.34 所3。本桥梁 工程施及 [股级 桥梁栏杆不在本次计价范围。已知 桥台 基坑 F形方 与版(、二类上)为 2 579 90m。 其中人 [加助清底为 257.90m。其余用挖掘机挖上。 基坑回轨 上分量为 544.90m。 合置的填砂砾石 1387 035m。 已知 股地面 "均标态为 3.66m。

- 1、施工方案
  - 1. 钻孔凇注桩: 采用回旋转机成孔、商品水下混凝土。
  - 2. 梁板: 现场顶制。
- 施工机械中的報带式挖掘机、履带式推上机、压路机的进出场费在道路工程预算中考虑,本桥架下程不计。
  - 4. 桥台施工过程中采用轻型井点降水,共计安装井点管 250 根,使用 8 天。
  - 5. 桥梁施工时设置编织袋围堰、堰顶高干设计水位 0.5m, 围堰体积为 550.80m3。
  - 6. 多余土方用白卸车外运。运距 8km: 泥浆外运运距 10km。
- :、人、材、机价格确定

· 类人工 E 日单价为 65 元,:类人工 E 日单价为 70 元,围堰所需黏 上外购单价为 25 元/m³, Y M 15-4 为 15 元 套,其他人、材、机单价按《浙江省市政工程预算定额》(2010 版)计取。

#### 四、工程类别及费率取定

本工程为: 类桥梁 L程。企业管理费、利润、各项组织情能费的费率按《浙江省建设工程施工费用 定额》(2016 版)及新江省有关规定的费率范围的低值计取; 规费、税金按《浙江省建设工程施工费用定 额》(2016 版)的规定计取。

#### 五、编制依据

- 1. 月牙河桥 L程招标图纸。
- 2. 《浙江省市政工程预算定额》(2010版)。
- 3. 《浙江省建设 L程施 L费用定额》(2010 版)。
- 4. 浙建站计[2013]64号 一关于《浙江省建设工程费用定额》(2010版)费用项目及费率调整的通知。
- 5. 建建发[2015]517号——关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知。

#### 表 12-12 工程项目投标报价汇总表

#### 工程名称: 某道路月牙河桥工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额/元		
1	桥梁	5 060 650.18		
1.1	市政	5 060 650.18		
	合 计	5 060 650.18		

#### 表 12-13 工程项目投标报价汇总表

单位(专业)工程名称: 桥梁 市政

第1页 共1页

- Lud 4 2 7	E) Lite 10 1/10: 10 Jac 10 MA		201 24 24 1
序号	汇总内容	计算公式	金额/元
	L程量清单分部分项工程费	Σ(分部分项1程量·综合单价)	4 469 338.26
其中	1. 人 I.费+机械费	Σ(分部分项人 Γ费+分部分项机械费)	1 365 748.05
1	措施项目费	,	312 343.21
2.1	(一) 施工技术措施项目费	按综合单价计算	118 215.88
其中	2. 人工费+机械费	Σ(技措项目人工费+技措项目机械费)	61 658.82
2.2	(二)施工组织措施项目费	按项计算、	194 127.33
	3. 安全文明施工费 、	(1+2)×11.54%	164 722.75
	4. 冬雨季施工增加费	(N+2)×0%	0.00
	5. 夜间施工增加费	(1+2)×0.01%	142.74
	6. 己完工程及设备保护费	(1+2)×0.02%	285.48
	7. 次搬运费	(1+2)×0% .	0.00
	8. 行车、行入干扰增加费	(1+2)×2%	28 548.14
	9. 提前竣工增加费	(1+2)×0%	0.00
	10. 工程定位复测费	(1+2)×0.03%	428.22
	11. 特殊地区施工增加费	(1+2)×0%	0.00
	12. 其他施工组织措施费	按相关规定计算	0.00
Ξ	其他项目费	按清单计价要求计算	0.00
四	规费	13+14	104 200.70
	13. 排污费、社保费、公积金	(1+2)×7.3%	104 200.70
	14. 农民工工伤保险费	按各市有关规定计算	0.00
£	危险作业意外伤害保险费	按各市有关规定计算	0.00
六	单列费用	单列费用	0.00
Ł	税金	( ~+二+ 〔+四+五+计税不计费)×3.577%	174 768.01
八	下浮率	( ~+二+三+四+五+六+七)×0%	0.00
九	建设工程造价	4-二+ 3-四+五+六+七-八	5 060 650.18

表 12-14 分部分项工程量清单与计价表

单位(-	单位(专业)工程名称:	桥梁-市政							第1页 共	共2页
				1		・分割をみ		1	# B/F	1
P H	and the same	200	Andrew .	事位				人工资	机规表	Ħ
1	040101003001	<b>抡基坑土</b> 力	、 类十. 4m 以内	, w	2 579 90	62.9	1 7517 52	6 733 54	6 862.53	
2	040103001001	回超方	一、二类1,场内平衡	m³	544.90	11 48	6 255 45	3 912 38	948.13	
3	040103001002	<b>原</b> 場分	台背砂砾回填	m	1 387 03	82 66	114 651.90	1 1359.78	1 220.59	
4	040103002001	余力介置	运野市投协人自行考虑	m <sup>3</sup>	1 953.27	19.69	3 8459.89	0.00	2 9806.90	
8	040301004001	泥浆护壁成孔灌	♦1000, 设计桩长 30m、回览。 钻机成化,C25 水下闽品混凝土	₩.	48	3 3951.99	162 9 695.52	310 363.20	325 800.96	
9	040301011001	<b>被</b> 桩头	铅孔滞注税, C25 混凝上	根	48	123.40	5 923.20	4 032.48	522.24	
7	040303001001	混凝土垫层	10cm, C10	m,	72.70	307.96	22 388.69	5 048.29	2 258.0%	
00	040305001001	卷层	30cm, 477	m³	220.10	143.62	31 610.76	10 060.77	00'0	
6	040303003001	灌擬   承台	C25 混凝 /	, w	1 035.00	349.84	362 084.40	76 217.40	32 964.75	
10	040303005001	混凝土墩(台)身	C25 沿城十	m,	835.70	415 17	346 957.57	90 247.24	35 425 32	
Ξ	040303004001	混凝上版(台)帽	C30 混碱 P	tm3	140.20	383 92	53 825 58	12 493.22	4 942.05	
12	040304001001	<b>负制起设</b> + 奖	C50, 20m 闵应力空心板梁	III	544.31	552.79	300 889.12	10.889 69	36 060.54	
13	040304005001	預制混凝土其他 构件	C30, 人行道板	m <sup>3</sup>	7 46	764.16	5 700 63	2 307.08	247.75	
14	040303019001	桥面铺装	C30 混凝土序 8cm、细粒式沥青 混凝土桥面削装 4cm	±	820.00	77.60	63 632.00	8 798.60	4 050.80	
15	040303020001	混凝土桥头搭板	C30 混滅十	E	157.04	364.04	57 168 84	13 762.99	3 437.61	
			本页小计				305 6761.07	625 024.98	484 548.23	



中区	中世(专里) 1.母右巻: 6	5万米 川泉							11 × × × × ×
Į.	- 111		目如	1111		你会单价	A Charleston	<b>#</b>	其中/元
£	海転	A H A	接征	重便			- W. W. W.	入工業	机械轰
91	040303021001	混灰上搭板枕梁	C30 混煤 I.	, uu	4.72	368,48	1 739.23	376.66	150,33
17	040303024001	混凝土其他构作	C40 小石 产混炼-1 议缝	"u	23.27	491.13	1 1428.60	2 788,68	526,60
œ	040303024002	混凝上其他构件	C25 規法人行道梁、侧有	m,	14,40	449,66	6 475.10	2 229.70	347,04
61	040309004001	橡胶支膨	GJ71001×150 板式橡胶支座, 支尾总匠度为21mm	4	57	19.53	1113.21	251.37	00'0
20	040309007001	桥梁仲常装置	SPF (中格线	8	129.83	156.82	20 359.94	7 445.75	4 070.17
21	040309009001	桥重排(乘) 水管	ø 10PVC 倍	m	58.00	25.30	1.467,40	284.20	00.0
22	040901004001	网络笼	钻孔灌川桩	1	94 123	5 235.46	492 777.20	63 909.52	30 891.17
23	040901001001	规论构件例筋	以物	1	14 844	5 092,71	75 596.19	12 115 67	828 86
24	040901001002	现法私件钢筋	螺纹钢	-	66 564	4 759.88	316 836 65	37 788 38	5 964 80
25	040901002001	顶机构件铜筋	[51] <b>(18)</b>	1	28.421	5 172.44	147 005.92	24 609.74	1 861.86
26	040901002002	预制、构件纠纷的	螺纹的	1	19.922	4 730.02	94 231.46	10 961.08	1 721.06
27	040901006001	后张公 负应力铜筋 (钢丝束、钢绞线)	♦15.24 網效後, YM15 4權 具, 該稅管/L業管道	, i	21 118	11 532.64	243 546 29	40 262 73	6 789.44
			本贝小沪				1 412 577 19	203 023 48	53 151 36
			÷	1		,	4 469 338.26	828 048.46	537 699.59

表 12-15 工程量清单综合单价计算表(分部分项)

12 日本   13 日本   12 日本   13							۱	100	体企业价压			1	
1-5 換   1, 1, 2, 2, 1, 4m   m   m   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	# F		1				Ultea	- Special		100	町		6年
1-5 接		040101003001	M. 1 1/2: ~		2,579 90	2.61	0.00	2.66	1.10	0.42	0.00	6.79	17 517.52
56   校婚的校一、美工、茶袋和   1000m²   159   按婚的校一、美工、接有   1000m²   167		1-5 茶	人工控沟僧、基坑上方,深4m以内, 、、炎!、人工辅助 下心(包括切边、棒幣底边)		2.579	2331.88	00'0	0.00	485,03	186.55	0.00	3 003,46	7 745.92
1.59   投灣形式之一、一类上、接个   1000m²   104013001001   187   24		1 56	·*:	1 000m <sup>3</sup>	0 368 73	312,00	000	1 981.59	477.07	183.49	0.00	2 954.15	1 089.28
187   184		1 59	-	1 000m <sup>3</sup>	1.953 27	312.00	0.00	3 140.82	718.19	276.23	0.00	4 447.24	8 686.66
87   株、坑、坑し方家   100m <sup>2</sup>   25   台間電方・台背砂場原筑   m <sup>2</sup>   25   台間電方・台背砂場原筑   10m <sup>2</sup>   台口03020201   台上の   白上の   白上の		040103001001	· + ※	E SE	\$44.90	7.18	0.09	1.74	1.85	0.71	0.00	11.48	6 255.45
2.25 有背向预分。 [10m] [10m] [10m] [2.25 有背向预分底。 [10m] [2.25 有背向预分底。 [10m] [2.25 有方型:运即电投标入目 m. 1.68-1.69-7後 [10m] [4.8cm] [100m] [4.8cm]		1 87		100m <sup>3</sup>	5 449	717.60	0.00	163.94	185.44	71 32	0.00	1 148.30	6 2 5 7 . 0 9
2.25		040103001002	回流方, 台背砂砾匝填	m³	1 387 03	8 19	70.97	10.88	1.89	0.73	000	82.66	114 651 90
649103002001		2 25	行背回域砂砾	10m³	138.703	81.90	709.68	8,78	18.86	7.25	0.00	826.47	114 633.87
68-1 69-7 後   前期舎も近十、近距・8km   1000m <sup>2</sup> 海泉が町成石郷社前・61 000. 設計析に50m-四域計画的形式。 根 C24 元 高端電流ト・2型平台。 根 3 516		040103002001	余方介置:运路山投标人自 行考虑	"E	1 953 27	0.00	0.04	15.26	3.17	1,22	0.00	19.69	38 459.89
電源が原域に源注時です1000. 27.1時に50m.可能計制の表生. 根 C25 A下商品で適益。 第 516 権 56年年度を関係と交換や台、100m. 3 516 権 1 300.8g 54.0m. Mall連注財産収給所、品上			自卸汽车运下, 运船 8km	1 000m <sup>3</sup>	1 953 27	00 0	35.40	15 255.75 3 173.20	3 173.20	1 220.46	0.00	19 684.81	38 449.75
指、诉使基础临上支架平台。 修重1800kg 标准让修理设物价的、陆上			泥泉沙壁成石灌注肺。≠1000.设计排长 50m.回旋结机成孔。 C25 水下商品混凝土	幸	48	6 465.90	6 465.90 16 881.59	6 787.52	2 756.68	2 756.68 1 060.30	0.00	33 951.99	33 951.99 1 629 695.52
<b>新孔灌注酵埋设钢炉筒, 陆上</b>			搭、拆桩棒耐临上支架平台, 锌重1800kg	100sm²	13 838 9	13 838 9 2 196.60	416.34	0.00	456.89	175.73	00.00	3 245.56	44 914.98
000 1 ≥ ∅		3-107	4月1灌注脉埋设物护筒, 陆上 ▼ ≤ 1 000	10m	9.6	1 370.60	177.57	75.55	300.80	115.69	0.00	2 040.21	19 586.02

H	
-	
K	8
7	۰
4	
1	è
2	ç
3	
T.	
-	
9	è
1	ř
3	
1	

0.670	单位(专业)1程名称: 桥梁 市政	桥梁 山政	١	ı	ı	ı	*1	1,47 % 4,4		ı	第2页	页 共5页
							Ų.	0.6年前/元	100			+ 0
erup	1	-			state o	James	A Prince		Pring Date.	区町町	Visit	ā
	3 128	国旋钻北杉城北, 排径φ1000 以内	10003	199.014	719.60	148.61	884.24	333.60	128.31	0.00	2 214.36	440 688.64
	3 144	泥浆池建造、拆除	10m³	199,014	25.20	19.13	0.34	5.31	2.04	0.00	52.02	10 352.71
	3 145-3 146-5 2	3 145·3 146×5 换 泥浆。运输, 远端, 10km	10m³	199,014	312.20	000	661.13	202 45	77 87	0.00	1 253.65	249 493.90
	3 150	回旋钻孔,灌冲的品温漆!	10m3	192.922	292.60	3 988.49	90.49	79.68	30.65	0.00	4 481.91	864 659.04
9	040301011001	截机头: 氧孔灌注航, C25 混 液土	華	90	84.01	1.18	10.88	19.74	7.59	00.00	123.40	5 923.20
	3 548	准拿钻孔灌注框页钢筋混凝土	10m3	4.522	08.168	12.48	115.49	209.52	80.58	0.00	1 309.87	5 923.23
-1	040303001001	混蔽于华広: 10cm, C10	, m	72.70	69.44	128 51	31.06	20.91	8.04	0000	307.96	22 388.69
	3 208 模	铺设混凝十垫层, 观洗短拌混凝土, C10(40)	10m <sup>3</sup>	7.27	05'10	1785.11	310.64	209.05	80.40	0.00	3 079.60	22 388.69
00	040305001001	4 E.: 30cm. 174:	, m	220.10	45.71	84.74	00.0	9.51	3.66	0.00	143.62	31 610.76
	3 207	何以降の整局	10m³	22.01	457.10	847.41	0.00	95.08	36.57	0.00	1 436,16	31 609.88
0	040303003001	混凝 1 夜台· C25 混凝 1	m³	1 035 00	73,64	213.97	31.85	21.94	8.44	000	349.84	362 084.40
	3 215 换	烧筑灌凝土杀台, 观烧艰拌湖 凝土, C25(40)	10m³	103.5	736.40	2 139.74	318.50	219.42	84.39	0.00	3 498.45	362 089.58
01	040303005001	混凝土墩(台)身; C25 混凝土	m³	835.70	107.99	221.48	42.39	31,28	12.03	0.00	415.17	346 957.57
	3 285 機	現沒雅凝土浇筑挡墙, 現游現 排泥凝土, C25(40)	10m³	3.6	725.90	2 118.18	337.37	221.16	85.06	0.00	3 487.67	12 555.61
	3 225 機	浇筑港藻土浇筑轻型桥台,现 浇现拌混凝土, C25(40)	10m³	83.57	1 048.60	2 123.58	409.41	303 27	11664	00 0	4 001.50	334 405 36
=	040303004001	池巖中如台岬: C30 泥巖上	m,	140.20	89.11	223 74	35.25	25.87	9.95	0.00	383.92	53 825.58
	3-243 换	流筑龍巖土浇筑台帽, 現滤現	10m <sup>3</sup>	14.02	891.10	2 237.36	352.51	258.67	99.49	0.00	3 839.13	53 824.60

		×
,		
ķ	47.7	8
5		1
4.4	5	Ç
	-	1
		-

							Ď	11/4/4/2011				
E			Sections					一年 ろいけわいか				
E W	•			=		- Administra	A Principle	7 355	Table 1	事		
12	040304001001	茂川花碟七梁: C50, 28m 顶 应力字心板梁	m³	544.31	128.03	302.56	66.25	40 41	15.54	0.00	552.79	300 889 12
	3 343 换	原制范藻士空心板梁(阅版 71), 现 液 现 样 混 凝 土。 (C50(40) 水泥 52.5	10m³	54.431	941.50	2 803.78	368.59	272.50	104.81	0.00	4 491.18	244 459.42
	3 371	仮制每件场内运输, 每件面40c以内, 海岸100m	10m <sup>3</sup>	54.431	273.70	221.78	19.91	60.38	23.22	00'0	595.69	32 424.00
	3-438	起重机路上安装板梁起重机上 < 20m	10m³	54.431	65.10	00'8	277 27	71.21	27.39	0.00	440.97	24 002.44
22	040304005001	成的混凝上其他构件: C30, 人们道板	E	7,46	309 26	323.06	33 21	71.23	27.40	00.00	764.16	5 700 63
	3-358 拠	放制混凝于人行道, 规语规封 混凝下, C3040)	10m³	0.746	1 599.50	2 383.71	248.86	384.46	147.87	0.00	4 764.40	3 554.24
	1-304	双轮介运输小型构件, 运即50m	10m³	0.746	233.73	0.00	0.00	18.62	18.70	0.00	301.05	224.58
	3 479	小型构件人有道板安装	10m³	0.746	893.90	0.00	0.00	185.93	71.51	0.00	1.151.34	858.90
	3 316 換	桥面轴装, 混凝上面层, 现浇 填拌混凝土, C30(40)	10m³	0.28	973 70	2 256.42	221 68	248.64	95 63	00.00	3 796.07	1 062.90
#	14 040303019001	桥面補袋,C30 混凝上月 8cm、细粒式沥青混凝土并所缩装 4cm	m <sup>2</sup>	820.00	10.73	57.42	1.94	3.26	1.25	0.00	77.60	63 632.00
	3 314 换	桥面铜装,混凝土基础,现浇 现并混凝土, C30(40)	10m³	89.6	779.10	2 241.07	216.10	207.00	79.62	0.00	3 522.89	34 101.58



第4页 共5页

45.47	単位(で少)「村名称、村	桥灰 山政									35.4 以	以大り以
3							**	综合单价层				
<b>西斯</b>	•	3			0.6 8 0.0	the second	机械头	3	40.4	事		
	2 207	<b>小声起映</b> - 路面型和联举护	100m²	12.1	26 00	117 23	0.00	11.65	4.48	00.0	189.36	2 291 26
	2 191-2 192×2 検	机械棒储细粒式沥青混凝土 路面, 房度 4cm	100m²	8.2	70.42	2 923.62	238.89	64.34	24.74	9000	3 322.01	27 240.48
51	040303020001	混散土桥头搭板: C30 混凝土	m)	157.04	87.64	222.97	21.89	22.78	8.76	00'0	364.04	57 168.84
	3 318 换	混凝土桥头档板, 观浇现扩混 滋干, C30(40)	10m³	15.704	876.40	2 229.74	218 94	227.83	87.63	0.00	3 640.54	57 171.04
91	040303021001	混凝上搭板枕梁; C30 混凝 L.	m³	4.72	79.80	224.68	31.85	23.22	8.93	00.00	368,48	1 739.23
	3 222 倏	济筑混凝 · 浇筑横梁 · 現浇现 引"强键 L: C30(40)	10m³	0,472	798.00	2 246 81	318 50	232 23	89.32	0.00	3 684.86	1 739.25
17	040303024001	隔蔽土其他构件: C40 小石子 混蔽上铰丝	m³	23,27	119.84	307 63	22.63	29.63	11.40	00.00	491.13	11 428.60
	3-288 模	板梁向沿瀑上灌缝, 规浇规拌 流蔽上, C30(40)	10m³	2.327	1 198.40	3 076.28	226 27	29633	113.97	00.0	4 911.25	11 428.48
80	040303024002	混凝上其他构件; C25 现浇人 行道梁、侧石	m	14.40	154.84	219.18	24.10	37.22	14.32	0.00	449.66	6 475.10
	3 304	流筑滟凝土地梁、侧石、平石, C25(40)	10m³	1.44	1 548.40	2 191.80	241.00	372.20	143.15	0.00	4 496.55	6 475.03
61	040309004001	橡胶支壓: GJZ100×150 板式 橡胶支壓: 支壓磁厚度为 21mm	4	57	14.4	13.86	0.00	0.91	0.35	0.00	19.53	1 113.21
	3 491	极式橡胶支煙交装	100cm³	179.55	1 40	4.40	0.00	0.29	0.11	0.00	6.20	1 113.21
20	040309007001	桥梁倬缩装置: SPF 倬缩缝	В	129.83	57.35	42.57	31.35	18.45	7.10	0.00	156.82	20 359.94

辦票 山政
工程名称: 1
(平平)

			1000			H	100	综合单价元				Lauren
E W	-	-		:	T.V.	Mercare	机械员	警理美	漢	<b>新</b>	G	
	3 503	梳型钢板伸缩缝安装	101	12 983	569.80	369.04	313.54	183 73	70 67	000	1 506.78	19 562.52
	3 513	沥青木丝板沉降维安装	10m <sup>2</sup>	1.548	30.80	474.97	00.00	6.41	2.46	0.00	514.64	796 66
21	040309009001	析面排(准), 水管: ♦10PVC 管	ш	58.00	1.90	18.99	0.00	1.02	0.39	0.00	25.30	1 467.40
	3 502	塑料管洪水孔安装	10m	8,8	19.00	189.92	0.00	10.19	3.92	0.00	253.03	1 467.57
22	040901004001	例的笼: 钻孔游注桩	-	94.123	679.00	3 938.18	328.20	209.50	80.58	00.0	5 235.46	492 777.20
	3-179	<b>针孔供钢筋笼配角、安装</b>	-	94 123	679.00	3 938.18	328.20	209.50	80 58	0.00	5 235,46	492 777.20
23	040901001001	现法构作解筋: 网络	-	14.844	816.20	3 969.53	55.84	181.38	69.76	0.00	5 092.71	75 596.19
	3 177	风,浇泥染! 以柳制作、安装	1	14 844	816.20	3 969 53	55 84	181.38	69 76	0.00	5 092.71	75 596.19
32	24 040901001002	<b>以流构作例前: 螺纹钢</b>	-	66.564	567.70	3 913.27	89 61	136.72	52.58	000	4 759.88	316 836 65
	3 178	现冷混凝上螺纹钢制作、安装	_	66 564	567.70	3 913.27	89.61	136.72	52.58	0.00	4 759.88	316 836 65
25	040901002001	负制档件转筋; 网络	1	28,421	865.90	3 972.79	65.51	193.73	74.51	0.00	5 172,44	147 005.92
	3 175	<b>负制池港</b>   吳納閏年、安装	-	28 421	865.90	3 972.79	65.51	193.73	74 51	00.0	5 172.44	147 005 92
9	26 040901002002	预制构件解助: 螺纹钢	-	19 922	\$50.20	3 910 09	61 98	132.41	50 93	000	4 730.02	94 231.46
	3-176	负旬混凝!螺纹钩割件、安装	-	19.922	550,20	3 910.09	86.39	(132.41	50.93	0.00	4 730.02	94 231.46
-1	27 040901006001	后宋法顶应力納筋(钢丝束、钢 纹线)>15.24 钢绞线、YM15-4 锚具、波纹管压装管道	aus	21.118	1 906.56	8 662.91	321.50	464	178.24	0.00	1 1532.64	243 546.29
	3 193	后张法群锚 束长 40m 以内,7 孔以内	-	21.118	786.10	6 194.53	214.46	208.12	80.04	0.00	7 483.25	158 031.27
	3 202	安装压莱管道被纹管	100m	44.9388	435.40	1 051.46	00 0	90.56	34.83	0.00	1 612.25	72 452,58
	3 203	竹道压浆	10m3	1.106	3 703.00	3 703.00 4 408.67	2 043.78 1 195.33	1 195.33	459.74	0.00	1 1810.52	13 062.44
				<□								4 469 338.26



§ 12-16 施工技术措施项目清单与计价表

4)	单位(专业)工程名称: 桥梁-市政	梁- 巾政								第1页 共1页	共1页
	Light of St.						4444	4.5	· E	其中间	1
12		- Area Marie	The state of the s		单位			正	人工美	机板表	Ħ
	041103001001	网戏	編列公於開城		, m	550 80	87 63	48 266.60   14 177.59   1 454 11	14 177.59	1 454 11	
	041107002001 排水、降水	排水、降水		3	量夜	00	8 743.66	69 949,28 27 504,72 18 522,40	27 504.72	18 522.40	
			本页小计					118 215.88 41 682.31	41 682.31	19 976.51	
			4		,, ,			118 215.88 41 682.31 19 976.51	41 682.31	19 976.51	

# 表 12-17 施工技术措施项目综合单价计算表

2	单位(专业)厂程名称: 桥梁 市政	桥梁 市政			7	7.7	1				郷	第1页 共1页
1				P	X	+	## 	<b>一个单价</b> 层		F		
	=			2		anto	18 8 60	Posts C		最用	A MONEY	18
	041103001001	<b>尼城:辦外、吳同城</b>	, m	550.80	25.74	51 08	264	5 90	2.27	0.00	87 63	48 266 60
	1-182	编先袋租根	100m³	5 508	2 573 55	2 107 66	264.11	590,23	227.01	0.00	8 762.56	48 264 18
	041107002001	<b>排水、熔水</b>	昼仪	00	3 438.09	1 333.33	2 315.30	1 196.71	460.23	0.00	8 743.66	69 949,28
	1 323	轮型井点降水安装	10 批	25	645.82	379,61	294.74	195,64	75.24	00.0	1 591.05	39 776.25
	1-324	经型用方路水桥除	10 根	25	230 37	00.0	180.30	85 42	32.85	0.00	528.94	13 223.50
	1 325	使用轻型并点降水	竞· 人	40	140 00	29.41	166.16	63.68	24.49	0.00	423.74	16 949 60
					4							118 215.88

#### 表 12-18 施工组织措施项目清单与计价表

#### 单位(专业) L程名称: 桥梁 市政

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基数	蒉率/%	金額/元
1	安全文明施工费	人工费+机械费	11.54	164 722.75
2	其他组织措施费			29 404.58
2.1	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0	0.00
2.2	夜间施工增加费	人工费+机械费	0.01	142.74
2.3	己完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.02	285.48
2.4	二次搬运费	人工费+机械费	0	0.00
2.5	行车、行人干扰费增加费	人工费+机械费	. 2	28 548.14
2.6	提前竣工增加费	人工费+机械费	, Ko	0.00
2.7	工程定位复测费	人工费+机械费	0.03	428.22
2.8	特殊地区施工增加费	人工费+机械费	0	0.00
2.9	其他施工组织措施费	按相关规定计算	0	0.00
	슈	it \		194 127.33

#### 表 12-19 其他项目清单与计价汇总表

丁和夕秋, 市政

第1面 计1面

上九生生	45/4: 1月 45/4	1	- V	A) 1 24 24 1 24
序号	项目名称	计量单位	金額/元	<b>备</b> 注
1	暂列金额	心、	0.00	
2	暂估价 、:	ri.	0.00	
2.1	专业工程智估价	16/2	0.00	
3	计日工 /	JL "	0.00	
4	总承包服务费	戊	0.00	
	合 计		0.00	

注: 本工程无其他清单项目, 其他项目清单包括的明细清单中金额均为零。本例不再放入相应的明细 清单。

#### 表 12-20 主要工日价格表

单位(专业) [程名称: 桥梁-市政

第1页 共1页

序号	工 种	单位	数量	单价/元
1	·类人工	LH	163.824	65
2	二类人工	TH	12 272.540	70
3	人工(机械)	ĽΒ	1 869.466	70

#### 表 12-21 主要材料表

单位(专业) L程名称: 桥梁 市政

第1页 共1页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价/元	备注
1		YM15-4 锚具		套	456.001	15	
2	0101001	螺纹钢	II级综合	ŧ	173.679	3 780	
3	0107001	钢绞线		t	21.963	5 640	
4	0109001	圆钢	(综合)	t	54.763	3 850	
5	0401031	水泥	42.5	kg	762 796.738	0.33	
6	0403043	黄砂(净砂)	综合	t	2 175.609	62.5	
7	0405001	碎石	综合	t	4 4 2 4 . 5 6 3	49	
8	0433062	非泵送水下商品混 凝土	C25	m <sup>3</sup>	2 315.064	329	
9	j3115031	电(机械)		kW · h	215 290.115	0.854	
10	0409481	黏土	11	m <sup>3</sup>	512.244	25	
11	8021221	现浇现拌混凝土	C25(40)	m <sup>3</sup>	1 949.917	207.370 5	
12	8021271	现浇现拌混凝土	C50(40)-水泥 52.5	m <sup>3</sup>	552.475	266.104	

#### 表 12-22 主要机械台班表

单位(专业)工程名称, 桥梁 市压

序号	机械设备名称	单位	数量	单价/元
1	被带式推工机 90kW	行班	2.719	732.633 5
2	履带式单斗挖掘机(液压)1m3	台班	4.409	1 105.38
3	内燃光轮压路机 8t	台班	1.607	295.336 5
4	内燃光轮压路机 15t	台班	1.607	505.822 5
5	电动夯实机 20~62kg • m	台班	43.483	21.796 4
6	沥青混凝土推铺机 8t	台班	0.795	843.950 5
7	转盘钻孔机ø1500	台班	255.733	477.594 9
8	履带式电动起重机 5t	台班	328.882	171.71
9	自卸汽车 12t	台班	41.956	698.776 5
10	驳船 50t	台班	11.071	131.4
11	预应力拉伸机 YCW-150	台班	16.472	80.4
12	电动卷扬机单简慢速 50kN	台班	69.695	120.744 4
13	电动卷扬机单筒慢速 100kN	台班	4.953	182,522
14	双锥反转出料混凝土搅拌机 350L	台班	165.549	123.726 1
15	灰浆搅拌机 200L	台班	8.250	85.572 9
16	钢筋切断机 🛊 40	台班	56.625	38.823 4
17	钢筋弯曲机 ø 40	台班	93.650	20.951 2

续表

序号	机械设备名称	单位	数量	单价/元
18	电动多级离心清水泵 H<180m	台班	14.250	400.579 5
19	污水泵ø100	台班	14.250	116.51
20	泥浆泵ø100	台班	331.358	210.528 4
21	高压油泵 80MPa	台班	16.472	194.543 3
22	射流井点泵最大抽吸深度 9.5m	台班	120.000	55.387 9
23	交流弧焊机 32kV·A	台班	350.821	90.356 6
24	对焊机容量 75kV·A	台班	8.649	123.056 6
25	电动空气压缩机 1m³/min	台班	10.446	49.996 2
26	液压注浆泵 HYB50/50-1 型	台班	7.454	80.928
27	汽车式起重机 75t	台班	/5.661	2 666.051 5
28	混凝土振捣器平板式 BLL	台班	118.497	17.556
29	混凝土振捣器插入式	台班。	7386.399	4.826
30	泥浆运输车 5t	介班	332.353	347.984

# 思考题与习题

- 1. 《建设工程工程量清单计价规范》中, 桥涵工程主要列了哪些清单项目?
- 2. "钻孔灌注柱" 清单项目与相应的定额项目计算规则相同吗?
- 3. "泥浆护壁成孔灌注柱"清单项目可组合的工作内容是否包括钢筋笼?是否包括截桩头?
- 4. "泥浆护壁成孔灌注柱"清单项目可组合的工作内容是否包括铜筋笼? 是否包括截桩头?
- 5. "混浆护壁成孔灌注柱"清单项目可组合的工作内容是否包括陆上支架平台的搭拆? 是否包括水上支架平台的搭拆?
  - 6. 桥涵工程现浇混凝土的模板在编制工程量清单的时候,如何处理?
  - 7. "泥浆护壁成孔灌注柱"清单项目可组合的工作内容是否包括声测管的制作、安装?
  - 8. "预制混凝土梁"清单项目可组合的工作内容有哪些?
- 新建的简支梁桥(轻型桥台、钻孔灌注桩基础)工程通常包括哪些分部分项清单项目?
  - 10. 改建的简支梁桥(轻型桥台、钻孔灌注桩基础)工程通常包括哪些分部分项清单项目?

# 附录 市政工程清单项目及其 计算规则、组合工作内容

#### 1. 土石方工程

(1) 土方工程, 见附表-1。



4.月編号	9.0 50	项目特征	計量	工作學 (1) 新加州	正程内容	可组合的主要内容
040101001	挖一般土方	1. 上壤类别 2. 挖上深度	m³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 旧扩(挡上板) 及扩除 4. 基底钎探 5. 场内运输	1. 人工挖土方 2. 机械挖土方 3. 打拔工具桩 4. 木、竹、钢挡土板 5. 人工装、运土方 6. 推土机推土 7. 炭载机装松散土、装运土方 8. 自卸车运土
040101002	挖沟槽 土方	1. 上壤类别 2. 挖土深度	m³	按设计图示尺 寸以基础垫层 底面积乘以挖 上深度计算	3. 围护(挡上板)	1. 人工挖沟槽、基坑土方 2. 机械挖沟槽、基坑土方 3. 打拔工具桩 4. 木、竹、钢挡上板 5. 人工装、运上方 6. 推上机推上 7. 装载机装松散上、装运上方 8. 白卸车运上
040101003	挖基坑 土方	1. 土壤类别 2. 挖土深度	m³	按设计图示尺 寸以基础垫层 底面积乘以挖 上深度计算	3. 围护(挡上板)	1. 人工挖沟槽、基坑上方 2. 机械挖沟槽、基坑上方 3. 打拔工具桩 4. 木、竹、钢挡上板 5. 人工装、运上方

以月编号	项目 名称	项目特征	计量 单位	工務量 計算規則	工程内容	可组合的主要内容
040101003	挖基坑 上方	<ol> <li>土壤类别</li> <li>挖土深度</li> </ol>	m³	按设计图示尺 寸以基础垫层 底面积乘以挖	3. 围护(挡上板)	6. 推上机推上 7. 装载机装松散士、装运 上方
				上深度计算	<ol> <li>基底钎探</li> <li>场内运输</li> </ol>	8. 自卸车运上
040101004	暗挖土方	1. 土壤类别 2. 平洞、斜 洞(坡度) 3. 运距	m³	按设计图示断 面乘以长度以 体积计算		
040101005	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度 2. 运距	m³	按设计图示位 置、界限以体 积计算	1. 开挖 2. 运输	1. 人工挖淤泥、流砂 2. 机械挖淤泥、流砂 3. 人工运淤泥、流砂

## (2) 石方工程, 见附表-2。

附表-2 石方工程(编码: 040102)

项目编号	項目 名称	No.	计制	工程量 计序模型	X	工程内容	可组合的主要内容
040102001	接級石資	1. 岩石类别 2. 开凿深度	m A	接设计图示尺 寸以体积计算	1. 2. 3. 4.	排地表水 石方开凿 修整底、边 场内运输	<ol> <li>人 L、机械Ğ石</li> <li>明挖石方运输</li> <li>推上机推石渣</li> <li>挖掘机挖石渣</li> <li>白卸汽车运石渣</li> </ol>
040102002	挖沟槽石方	1. 岩石类别 2. 开凿深度	m³	按设计图示尺 寸以基础垫层 底面乘以挖石 深度计算	1. 2. 3. 4.		1. 人工、机械凿石 2. 明挖石方运输 3. 推工机推石造 4. 挖掘机挖石渣 5. 自卸汽车运石渣
040102003	挖基坑石方	1. 岩石类别 2. 开凿深度	m³	按设计图示尺 寸以基础垫层 底面乘以挖石 深度计算	1. 2. 3. 4.	排地表水 石方开凿 修整底、边 场内运输	八

#### (3) 回填方及土石方运输, 见附表-3。

附表-3 回填方及土石方运输(编码: 040103)

顺日编号	项目 名称	项目特征	计量 单位	工程量 计算规则		可组合的主要内容
040103001	回填方	1. 密实度 2. 填方材料品种 3. 填方粒经要求 4. 填方来源、运距	m³	1. 接挖方青量加设 原地	3.	1. 人工装、运士方 2. 装载机装松散上、装运上方 3. 自卸汽车运上 4. 明挖石方运输 5. 控题机挖石渣 6. 自卸汽车运石渣 7. 人工填土、夯实 8. 机械填土研压 9. 机械填土夯实 10. 路林填筑砂、塘渣、粉煤灰
040103002	余方	b. 废弃料品种 25. 运距	m <sup>3</sup>	按挖方清单项目 飞程量减利用回 填存体积(正数) 计算	余方点装 料运输至 弁置点	1. 人工装、运土方 2. 推土机推土 3. 装载机装松散土、装运 上方 4. 自卸汽车运士 5. 明挖石方运输 6. 挖掘机挖石造 7. 自卸汽车运石湾

- (4) 挖方应按天然密实度体积计算,填方应按压实后体积计算。
- (5) 沟槽、基坑、一般土石方的划分应符合下列规定。
- ① 底宽 7m 以内, 且底长大于底宽 3 倍以上应按沟槽计算。
- ② 底长小于底宽 3 倍以下, 且底面积在 150m2以内应按基坑计算。
- ③ 超过上述范围,应按一般土石方计算。
- 2. 道路工程
- (1) 路基处理, 见附表-4。

附表-4 路基处理(编码: 040201)

川巨編号	项目 各称	项目特征	#	工程量计算规则	工程内容	可组合的 主要内容
040201001	预压 地基	1. 排水坚并种类、 断面尺寸、排列方 式、间距、深度 2. 预压方法 3. 预压荷载、时间 4. 砂垫层厚度	m²		1. 设置排水坚井、 盲沟、滤水管 2. 铺设砂整层、密 封膜 3. 堆载、卸载或抽 气设备安拆、抽真空 4. 材料运输	
040201002	强介 地基	<ol> <li>方击能量</li> <li>方击遍数</li> <li>地耐力要求</li> <li>夯填材料种类</li> </ol>	m²	按设计图示尺寸以面积计算	1。铺设夯填材料 2. 强分 3. 分填材料运输	
040201003	振冲 密实 (不填料)	<ol> <li>地层情况</li> <li>振密深度</li> <li>孔距</li> <li>振冲器功率</li> </ol>	m²		1. 振冲加密 2. 泥浆运输	
040201004	掺石灰	含灰量	m <sup>3</sup>	, , ,	t. 掺石灰 2. 夯实	1. 掺石灰 2. 消解石灰
040201005	掺干土	1. 密实度 2. 掺上率	m³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 掺干土 2. 夯实	
040201006	掺石,	1. 密实度 21 排石率	m³¥		1. 掺石 2. 夯实	改换片石
040201007	抛衣 挤淤	材料品种、规格	m³		<ol> <li>抛石挤淤</li> <li>填塞垫平、压实</li> </ol>	抛石挤淤
040201008	袋装 砂井	1. 直径 2. 填充料品种 3. 深度	m	按设计图示尺寸	1. 制作砂袋 2. 定位沉管 3. 下砂袋 4. 拔管	袋装砂井
040201009	塑料排水板	材料品种、规格	m	以长度计算	1. 安装排水板 2. 沉管插板 3. 拔管	塑料排水板
040201010	振冲桩 (填料)	1. 地层情况 2. 空桩长度、桩长 3. 桩径 4. 填充材料种类	1. m 2. m <sup>3</sup>	1. 以米计量,按 设计图示尺寸以 桩长计算 2. 以立方米计量,按设计桩截 面乘以桩长以体 积计算	1. 振冲成孔、填料、 振实 2. 材料运输 3. 泥浆运输	碎石振冲桩

/-t- +

						续表
馬貝编号	- 55 月 名称	项目特征	计量 单位	工程量计算规则	工程内容	可迫合的 主要内容
040201011	砂石桩	<ol> <li>地层情况</li> <li>空桩长度、桩长</li> <li>桩径</li> <li>成孔方法</li> <li>材料种类、级配</li> </ol>	1. m 2. m <sup>3</sup>	1. 以米计量,按设计图示尺寸以桩长计算 2.以立方米计量,按设计桩截面乘以桩长(包括 尖)以体积计算		
040201012	水泥粉 煤灰碎 石桩	<ol> <li>地层情况</li> <li>空桩长度、桩长</li> <li>桩径</li> <li>成孔方法</li> <li>混合料强度等级</li> </ol>	m	按设计图示尺寸 以桩长(包括桩 尖)计算	<ol> <li>成孔。</li> <li>混合料制作、灌 注、养护</li> <li>材料运输</li> </ol>	
040201013	深层 水泥搅 拌桩	1. 地层情况 2. 空桩长度、桩长 3. 桩截而尺寸 4. 水泥强度等级、 掺量	m	N. W.	1. 预搅下钻、水泥 浆制作、喷浆搅拌提 升成桩 2. 材料运输	水泥搅拌桩(喷浆)
040201014	粉喷桩	1. 地层情况 、 2. 空射长度、椎长 3. 椎径 4. 粉体种类、掺量 5. 水泥强度等级、 石灰粉要求	m	按设计图示尺寸以桩长计算	1. 预搅下钻、喷粉 搅拌提升成桩 2. 材料运输	水泥搅拌桩(喷粉)
040201015	高压水泥炭喷桩	1. 地层情况 2. 空桩长度、桩长 3. 桩截面 4. 旋喷类型、方法 5. 水泥强度等级、 掺量	m		1. 成孔 2. 水泥浆制作、高 压旋喷注浆 3. 材料运输	1. 钻扎
040201016	石灰桩	1. 地层情况 2. 空桩长度、桩长 3. 桩径 4. 成孔方法 5. 掺和料种类、配 合比	m	按设计图示尺寸 以桩长(包括桩 尖)计算	1. 成孔 2. 混合料制作、运 输、夯填	<ol> <li>石灰砂桩</li> <li>消解石灰</li> </ol>
040201017	灰上 (土)挤 密桩	1. 地层情况 2. 空桩长度、桩长 3. 桩径 4. 成孔方法 5. 灰土级配	m	按设计图示尺寸 以桩长(包括桩 尖)计算	1. 成孔 2. 灰上拌和、运输、 填充、夯实	

续表

						突衣
項目編号	项目 差科	项目特征	) 計量	工程量计算规则	工程内容	可组合的 主要内容
040201018	柱锤冲扩桩	1. 地层情况 2. 空桩长度、桩长 3. 桩径 4. 成孔方法 5. 桩体材料种类、 配合比	m	按设计图示尺寸以桩长计算	1. 安拔套管 2. 冲孔、填料、 夯实 3. 桩体材料制作、 运输	
040201019	地基注案	1. 地层情况 2. 成孔深度、间距 3. 浆液种类及配 合比 4. 注浆方法 5. 水泥强度等级、 用量		1. 以来计量,按设计图示尺寸以深度计算 2.以立方米计量,按设计图示尺寸以加固体积计算	1. 成形 2. 注錄导管制作、 安装 3. 浆液制作、压浆 4. 材料运输	<ol> <li>分层注浆</li> <li>几层注浆</li> </ol>
040201020	褥垫层	1. 厚度 2. 材料品种、规格 及比例	1, m <sup>2</sup> 2. m <sup>3</sup>	1.以平方米计量。 核设计图示尺寸 以铺设面积计算 2.以立方米计量。 核设计图示尺寸 以铺设体积计算	.1. 材料拌合、运输 2. 辅设 3. 压实	
040201021		1: 材料品种、规格 2. 搭接方式	m <sup>2</sup>	按设计图示尺寸 以面积计算	<ol> <li>基层整平</li> <li>辅设</li> <li>固定</li> </ol>	1. 土 正布 2. 土 正格棚
040201022	排水沟截水沟	1. 斯面尺寸 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度 3. 砌体材料 4. 砂浆强度等级 5. 伸缩缝填塞 6. 盖板材质、规格	m	按设计图示尺寸 以长度计算	1. 模板制作、安装、 拆除 2. 基础、垫层铺筑 3. 混凝上拌和、运输、浇筑 4. 侧墙浇捣或砌筑 5. 勾缝、抹面 6. 盖板安装	1. 性层 2. 基础 3. 混凝上浇捣 4. 砌筑 5. 抹面 6. 勾缝 7. 沉降缝 8. 盖板制作、安装
040201023	盲沟	1. 材料品种、规格 2. 断面尺寸	m	铺筑	铺筑	1. 砂石盲沟 2. 滤管盲沟

### (2) 道路基层, 见附表-5。

附表-5 道路基层(编码: 040202)

项目编写	域目 名称	JEWL	計量 単位	_DEH NAM		<b>一种</b>
040202001	路床(槽)整形	1. 部位 2. 范围	m²	按设计道路底基层图 示尺寸以面积计算,不 扣除各类并所占面积	1. 放样 2. 修整路拱 3. 碾压成型	路床(槽)整形
040202002	石灰稳 定土	1. 水泥含量 2. 厚度	m <sup>2</sup>		(*( ' <u>)</u>	
040202003	水泥稳 定土	1. 水泥含量 2. 厚度	m <sup>2</sup>			1. 水泥稳定土 2. 顶层多合土养生
040202004		1. 配合比 2. 厚度	m²	接设计图示尺寸以面 积计算,不扣除各种井 所占面积		1. 石灰、粉煤灰、土基层 2. 顶层多合土养生
040202005	石灰、碎 石、土	1. 配合比 2. 碎石规格 3. 厚度	m <sup>2</sup>		1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑	1. 石灰、碎石、土基层 2. 顶层多合工养生
040202006	石灰、粉 煤灰、碎 (砾)石	1. 配合比 2. 碎(砾)石 规格 3. 厚度	m°		4. 找平 5. 碾压 养护	1. 石灰、粉煤灰、碎(磁石基层 2. 顶层多合工养生
040202007	粉煤灰	厚度、ノン	m <sup>2</sup>	<b>X</b>		
040202008	矿渣	厚度	m²	· X		矿渣底层
040202009	砂砾石	1. 石料规格 2. 厚度	m <sup>2</sup>	*\// <u>-</u> '		砂砾石底层
040202010	卵石	1. 石料规格 2. 厚度	m <sup>2</sup>			卵石底层
040202011	碎石	1. 石料规格 2. 厚度	m <sup>2</sup>			碎石底层
040202012	块石	1. 石料规格 2. 厚度	m <sup>2</sup>			块石底层
040202013	山皮石	1. 石料规格 2. 厚度	m²	按设计图示尺寸以面 积计算,不扣除各种井 所占面积	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	塘渣底层
040202014	粉煤灰	1. 配合比 2. 厚度	m <sup>2</sup>			1. 粉煤灰三汽基层 2. 顶层多合上养生
040202015	水泥稳 定碎 (砾)石	1. 水泥含量 2. 石料规格 3. 厚度	m²			1. 水泥稳定碎石基层 2. 水泥稳定碎石砂基层 3. 顶层多合上养生
040202016	沥青稳 定碎石	1. 沥青品种 2. 石料粒径 3. 厚度	m <sup>2</sup>			沥青稳定碎石

## (3) 道路面层, 见附表-6。

附表-6 道路面层(编码: 040203)

绿巨编号	项目  名称	项目特征	计量 单位	工程量计算	工程内容	可组合	<b>的主要内容</b>	
040203001	沥青表面 处理	1. 沥青品种 2. 层数	m²		1. 喷油、布料 2. 碾压	沥青表面外	<b>止治</b>	
040203002	沥青贯 入式	1. 沥青品种 2. 厚度	m²	按设计图示 尺寸以面积	<ol> <li>摊铺碎石</li> <li>喷油、布料</li> <li>碾压</li> </ol>	沥青贯入。	<b>汽路</b> 面	
040203003	透层、 粘层	1. 材料品种 2. 喷油量	m²		1. 清理下承层 2. 喷油、布料	1. 透层		
040203004	封层	1. 材料品种 2. 喷油量 3. 厚度	m²	占面积,带 平石的面层 应扣除平石	1. 清理下承层 2. 喷油、布料 3. 压实	封层		
040203005	黑色碎石	1. 沥青品种 2. 石料规格 3. 厚度	m <sup>2</sup>	所占面积 ,	<ol> <li>清理下承面</li> <li>拌和、运输</li> <li>摊铺、整形</li> <li>压实</li> </ol>	黑色碎石器	<b>各面</b>	
		1. 沥青品种 2. 沥青混凝	1/	1	1. 清理下產面		粗粒式	
040203006	沥青 混凝土	土种类 3. 有料粒径 4. 掺和料 5. 厚度	m²	. \	2. 拌和、运输 3. 摊铺、整形 4. 压实	沥青混凝 七路面	中粒式 细粒式	
		1. 混凝土强		按尺计除占平应所出 不积 扣所 带层石扣占面 不积 扣所 带层石	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝上拌和、 运输、浇筑	1. 水泥混凝土路面 2. 伸缩缝嵌缝、锯缝		
040203007	水泥 混凝土	度等级 2. 掺和料 3. 厚度 4. 嵌缝材料	m²		3. 拉毛 4. 痕或刻防滑槽 5. 伸缝 6. 缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	3. 混凝土路面刻助滑槽 4. 水泥混凝土路面养生		
040203008		1. 块料品				1. 铺筑垫	E	
040203007	块料面层	种、规格 2. 垫层: 材 料品种、厚 度、强度等级	m <sup>2</sup>		1. 铺筑垫层 2. 铺砌块料 3. 嵌缝、勾缝	2. 块料铺	贴	
040203009	弹性面层	1. 材料品种 2. 厚度	m <sup>2</sup>		1. 配料 2. 铺贴			



## (4) 人行道及其他, 见附表-7。

附表-7 人行道及其他(编码: 040204)

项目编号	項目 名称	项目特征	<b>计量</b> 单位	工程量计算规划	工程内容	可组合的 主要内容
040204001	人行道 整形 碾压	1. 部位 2. 范围	m²	按设计人行道图示 尺寸以面积计算, 不扣除侧石、树池 和各类并所占面积	1. 放样 2. 碾压	人行道路 整形碾压
040204002	人行道 块料 铺设	1. 块料品种、规格 2. 卷层、基础: 材料品 种、厚度 3. 图形	m <sup>2</sup>	按设计图示尺寸以 面积计算,不扣除	1. 基础、垫层铺筑2. 块料铺设	1. 人行道 混凝土基础 2. 人行道 块料铺设
040204003		<ol> <li>混凝土强度等级</li> <li>厚度</li> <li>基础、垫层: 材料品种、厚度</li> </ol>	m²	各类井所占面积 但应扣除侧石、树 池所占面积	、模板制作、安装、 拆除 2、基础、垫层铺筑 3、混凝土拌和、运 输、浇筑	
040204004	安砌侧 (平、缘)	1. 材料品种、规格 2. 基础、垫层: 材料品: 种、厚度	m		1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧(平、缘)石安砌	1. 侧、平 石垫层 2. 侧、平 石安砌
040204005	现浇侧(平、缘)	1. 材料品种 2. 尺寸 3. 形状 4. 混凝上强度等级 5. 基础、垫层: 材料品 种、厚度	mX.	按设计图示中心线长度计算	1. 模板制作、安装、 拆除 2. 开槽 3. 基础、垫层铺筑 4. 侧(平、缘)石安砌	1. 侧平石 垫层 2. 现浇机、 平石
040204006	检查并升降	1. 材料品种 2. 检查井规格 3. 平均升(降)高度	座	按设计图示路面标 高与原有的检查井 发生正负高差的检 查井的数量计算		1. 拆除砖砌检查井 2. 砖砌检查井筒 3. 砖墙井抹灰、勾缝
040204007	树池砌筑	1. 材料品种、规格 2. 树池尺寸 3. 树池盖材料品种	个	按设计图示以数量计算	1. 基础、垫层铺筑 2. 树池砌筑 3. 盖面材料运输、 安装	1. 砌筑树 池 2. 树池盖 制作、安装
040204008	预制电 缆沟 铺设	1. 材料品种 2. 规格尺寸 3. 基础、稳层: 材料品种、厚度 4. 盖板品种、规格	m	按设计图示中心线 长度计算	1. 基础、垫层铺筑 2. 预制电缆沟安装 3. 盖面安装	

## 3. 桥涵护岸工程

(1) 桩基, 见附表-8。

附表-8 桩基(编码: 040301)

明目编号	项目 名称	项目特征	计量 单位	工程量 計算規則	工程内容	可组合的 主要尺4
040301001	预制钢 筋混凝 上方桩	1. 地层情况 2. 送桩深度、桩长 3. 桩截而 4. 桩倾斜度 5. 混凝土强度等级	1. m 2. m³ 3. 根	1. 以来计量,按设计 图示尺寸以桩长(包括 桩尖)计算	1. 工作 平台搭拆 2. 桩就位 3. 桩机移位 4. 沉桩 5. 接桩 6. 送粧	1. 搭拆桩基础支架平台 2. 打桩 3. 接桩 4. 送桩
040301002	预制钢 筋混凝 上管桩	1. 地层情况 2. 送桩深度、桩长 3. 桩外径、壁厚 4. 桩倾斜度 5. 桩尖设置及类型 6. 混凝土强度等级 7. 填充材料种类	1. m 2. m³ 3. 根	3. 以根计量, 按设计	<ol> <li>工作平台搭拆</li> <li>桂就位</li> <li>桩机移位</li> <li>桩火安装</li> <li>流桩</li> <li>接桩</li> <li>送柱</li> <li>柱芯填充</li> </ol>	1. 搭拆桩基础支架平台 2. 打桩 3. 接桩 4. 送桩 5. 桩芯填充
040301003	钢管框	地层情况     这桩深度、桩长     村质     特優     華校、	1. t 2. 根	2-1-1-1	1. 工作平台搭拆 2. 桩就位 3. 桩机移位 4. 沉桩 5. 接桩 6. 透射 7. 切割蓋帽 8. 管内取上、余上弃置 9. 防护材料	1. 搭拆桩基 础支架平台 2. 打桩 3. 接桩 4. 送机 5. 切割钢管、 精制盖朝 6. 管内取上 7. 管内填芯
040301004	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 地层情况 2. 空桩长度、桩长 3. 桩径 4. 成孔方法 5. 混凝上种类、强 度等级	1. m 2. m³ 3. 根	1. 以米计量, 按设计 图示尺寸以桩长(包括 桩尖)计算 2. 以立方米计量, 按 不同截面在桩长范围 内以体积计算 3. 以根计量, 按设计 图示数量计算	1. 工作平台搭拆 2. 桩机移位 3. 护筒埋设 4. 成孔、固壁 5. 混凝土制作、 达输、灌注、养护 6. 上力、废浆频如 及泥浆池、泥浆沟	1. 工作平台 搭拆 2. 埋设钢炉筒 3. 回旋钻孔 4. 泥浆池建 造和拆除 5. 泥浆外运 6. 灌注混凝土

A+ +:

						续表
J. 日編号	100日 名称	项目特征	件量 [基]]	工程 (III)	工程内容	川唱合的 主奏内容
040301005	沉管灌 注桩	1. 地层情况 2. 空桩长度、桩长 3. 复打长度 4. 桩径 5. 沉管方法 6. 桩尖类型 7. 混凝上种类、强 度等级	1. m 2. m³ 3. 根	1. 以来计量,按设计 图示尺寸以桩长(包括 桩尖)计算 2. 以立方米计量,按 设计图示桩长(包括	1. 工作平台搭拆 2. 桩机移位 3. 打(沉)拔钢管 4. 桩尖安装 5. 混凝土制作、运输、灌注、养护	
040301006	干作业 成孔灌 注桩	1. 地层情况 2. 空桩长度、桩长 3. 桩径 4. 扩孔直径、高度 5. 成孔方法 6. 混凝上种类、强度等级	1. m 2. m³ 3. 根	尖)乘以桩的断面面积 计算 3.以根计量,核设计 图示数量计算	1. 工作平台搭拆 2、桩机移位 3. 成孔、扩孔 4. 混凝土制作、运输、灌注、振捣、 养护	
040301007		1. ±(石)类别 2. 挖孔深度 3. 弃土(石)运溉	m³	按设计图示尺寸(含护 壁)截面积乘以挖孔深 度以立方米为单位计算	1. 排地表水 2. 挖土、凿石 3. 基底钎探 4. 上(石)方外运	<ol> <li>人工挖孔</li> <li>挖淤泥、流砂增加费</li> <li>挖岩石增加费</li> </ol>
040301008	人工挖 孔灌注 桩	1. 柱心长度 2. 桂心 直径、扩底 直径、扩底高度 3. 护壁厚度、高度 4. 护壁材料种类、强度等级 5. 桩芯混凝上种类、强度等级	1. m³ 2. 根	1. 以立方米计量。按 桩忠混泥上体积计算 2. 以根计量。按设计 图示数量计算	1. 护壁制作、安 装 2. 混凝土制作、 运输、灌注、振捣、 养护	<ol> <li>安装混凝土护壁</li> <li>進注混凝土</li> </ol>
040301009	钻孔压浆桩	1. 地层情况 2. 桩长 3. 钻孔直径 4. 骨料品种、规格 5. 水泥强度等级	1. m 2. 根		1. 钻孔、下注浆管、投放骨料 2. 浆液制作、运输、压浆	
040301010	灌注桩后注浆	1. 注浆导管材料、 规格 2. 注浆导管长度 3. 单孔注浆量 4. 水泥强度等级	孔	按设计图示以注浆孔 数计算	1. 注浆导管制作、 安装 2. 浆液制作、运输、压浆	

市目編号 活机		项目特征	10.00		工程内容	. 河组合的 主要内容	
040301011	截桩头	1. 桩类型 2. 桩头截面、高度 3. 混凝 上强度等级 4. 有无钢筋		1. 以立方米计量,按 设计桩截面乘以桩头 长度以体积计算 2. 以根计量,按设计 图示数量计算	2. 凿平	1. 截桩头 2. 废料弃置	
040301012	声测管	1. 材质 2. 规格、型号	1. t 2. m	1. 按设计图示尺寸以 质量计算 2. 按设计图示尺寸以 长度计算	挂头	声测管制作、 安装	

## (2) 基坑与边坡支护, 见附表-9。

## 附表-9 桩基(编码: 040302)

项三角	_項目 名称	JEW	计量 单位	工程置入	III	可组合的 主要内容
040302001	倒木桩	1. 地层情况 2. 桩长 3. 材质 4. 尾谷 5. 桩倾斜度	1. m 2. 根	1. 以来刊量, 按设 计图示尺寸以辨长 (包括桩尖)计算 2. 以根刊量, 按设 计图示数量计算	2. 桩机移位 3. 桩制作,运输、就位	1. 搭拆桩基础 支架平台 2. 打基础圆 木桩
040302002	预制钢 筋混凝 上板桩	1. 地层情况 2. 英雄深度、 姓长 3. 桩截面 4. 混凝土强度 等级	1. m³ 2. 根	1. 以立方来计量, 按设计图示桩长(包 括桩尖)乘以桩的断 面面积计算 2. 以根计量,按设 计图示数量计算	3. 桩机移位 4. 沉桩	1. 搭拆桩基础 支架平台 2. 打桩 3. 送桩
040302003	地下连续墙	1. 地层情况 2. 导墙类型、截面 3. 墙体厚度 4. 成槽深度 5. 混凝土种类、强度等级 6. 接头形式	m³	按设计图示端中心 线长乘以厚度乘以 槽深,以体积计算	1. 工导墙挖填、制作、 安装、拆除 2. 挖土成槽、固壁、清 底置换 3. 混凝上制作、运输、 灌注、养护 4. 接头处理 5. 上方、废浆外运 6. 打桩场地硬化及泥浆 池、泥浆沟	1. 导端开挖及 制作 2. 挖土成槽 3. 土方外运 4. 接头处理 5. 清底置换 6. 浇筑混凝土 7. 泥浆池建造 和拆除 8. 泥浆外运

						续表
四角编号	期日 名称	项点特征	け面 単位	工作员 计算规则	工程内容	所到合的 非例學生
040302004	咬合灌 注桩	1. 地层情况 2. 桩长 3. 桩径 4. 混凝上种类、强度等级 5. 部位	1. m 2. 根	1. 以来计量,按设计图示尺寸以桩长计算 2. 以根计量,按设计图示数量计算	1. 桩机移位 2. 成孔、固壁 3. 混凝上制件、运输、 灌注、养护 4. 套管压拔 5. 土方、废浆外运 6. 打桩场地硬化及泥浆 池、泥浆内	
040302005	型钢水 泥土搅 拌墙	1. 深度 2. 桩径 3. 水泥掺量 4. 型钢材料、 规格 5. 是否拔出	m³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 钻机移位 2. 钻进 3. 椽液制作、运输、 基. 挽 4. 搅拌成桩 5. 型铜插拔 6. 土方、废浆外运	1. 三轴水泥搅 拌桩 2. 插、拔型钢 3. 上方外运 4. 泥浆外运
040302006	锚杆 (索)	1. 地层情况 2. 锚杆(索)类型、部位 3. 钴孔直径 深度 4. 杆体材料晶 种、规格、效量 5. 是否确应力 6. 浆液种类、 强度等级	1. m 2. 根	1. 切來计帶, 接设 计關邻尺寸以钻孔 深度计算	「、钻孔、浆液制作、运输、压浆 2. 锚杆(索)制作、安装 3. 张拉锚围	
040302007	土钉	1. 地层情况 2. 钻孔直径、 深度 3. 置入方法 4. 杆体材料品 种、规格、数量 5. 浆液种类、 强度等级		2. 以根计量,按设计图示数量计算	1. 钻孔、浆液制作、运输、压浆 2. 土钉制作、安装 3. 土钉施工平台搭设 拆除	
040302008	喷射混凝土	1. 部位 2. 厚度 3. 材料种类 4. 混凝上类别、 强度等级	m²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 修整边坡 2. 混凝上制作、运输、喷射、养护 3. 钻排水孔、安装排 水管 4. 喷射施工平台搭设、 拆除	

## (3) 现浇混凝土构件, 见附表-10。

附表-10 现浇混凝土(编码: 040303)

项目编号	项目 名称	-XINTOL	· 神皇 単位	二本量 计算规则		V			
040303001	混凝土 垫层	混凝 上强度等级	m³		<ol> <li>模板制作、安装、拆除</li> <li>混凝上拌和、运输、浇筑</li> <li>养护</li> </ol>	混凝土	<b>陸</b> 层		
040303002	混凝土	<ol> <li>混凝土强 度等级</li> </ol>	m <sup>3</sup>		<ol> <li>模板制作、安装、拆除</li> <li>混凝上拌和、运输、浇筑</li> <li>养护</li> </ol>	1. 毛石	混凝土基础		
040303002	基础	2. 嵌料(毛石) 比例	nı		<ol> <li>模板制作、安装、拆除</li> <li>混凝土拌和、运输、浇筑</li> <li>养护</li> </ol>	2. 混崇	<b>- 七基础</b>		
040303003		混凝土强度 等级	m <sup>3</sup>		<ol> <li>模板制作、安装、拆除</li> <li>混凝上排削、运输、浇筑</li> <li>养护</li> </ol>	混凝土	尧捣		
		1. 部位	1		1、模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 养护	混凝土	墩帽		
040303004	収(台)	2. 混凝土强 度等级	lm <sup>3</sup>			- NINE   16 50 1 66	1.模板侧作、繁装、拆除 2. 混凝上拌和、运输、浇筑 3. 奏护,	浇捣	台帽
	- 0	11		体积计算	. /		轻型桥台		
	混凝土	1. 部位		1	1. 模板制作、安装、拆除	267 167	实体式桥台		
040303005	墩(台)	2. 混凝土强	$m^3$			2. 混凝土拌和、运输、浇筑	混凝土	拱桥墩身	
	身	度等级			3. 养护		拱桥台身		
							柱式墩台身		
		1. 部位	1		<ol> <li>模板制作、安装、拆除</li> <li>混凝土拌和、运输、浇筑</li> <li>养护</li> </ol>	混凝土	支撑梁		
040303006		2. 混凝土强 度等级	m <sup>3</sup>		1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝上拌和、运输、浇筑 3. 养护	浇捣	横梁		
		1. 部位			1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝上拌和、运输、浇筑 3. 养护	混凝土	墩盖梁		
040303007	10303007 墩(台) 2. 混凝土强 盖梁 度等级	m <sup>3</sup>		1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝上拌和、运输、浇筑 3. 养护	浇捣	台盖梁			

/± ±

项目编号	集 名称	项目特征	计量	工程量	Link	可组合	的主要内容		
040303008	混凝土 拱桥 拱座	混凝 土强度	m¹		<ol> <li>模板制作、安装、拆除</li> <li>混凝土拌和、运输、浇筑</li> <li>养护</li> </ol>	混凝土	烧搗		
040303009	混凝土 拱桥 拱助	混凝 上强度等级	m³		<ol> <li>模板制作、安装、拆除</li> <li>混凝土拌和、运输、浇筑</li> <li>养护</li> </ol>	混凝土	尧捣		
040303010	110.110	1. 部位 2. 混凝土强 度等级	m³		<ol> <li>模板制作、安装、拆除</li> <li>混凝土拌和、运输、浇筑</li> <li>养护</li> </ol>	混凝土i	浇捣		
					<ol> <li>模板制作、安装、拆除</li> <li>混凝土拌和、运输、浇筑</li> <li>养护</li> </ol>		0 号块件		
040303011	混凝土 箱梁	<ol> <li>部位</li> <li>混凝土强度等级</li> </ol>	m³	m <sup>3</sup>		<ol> <li>0. 模板制作、安装、拆除</li> <li>2. 混凝土拌和、运输、浇筑</li> <li>3. 养护</li> </ol>	混凝土 浇捣	悬浇箱梁	
				按设计图 示尺寸以	<ol> <li>模板制作、安装、拆除</li> <li>混凝上拌和、运输、浇筑</li> <li>养护</li> </ol>		支架上现浇 箱梁		
040303012		1. 部位、 2. 结构形式	m <sup>3</sup>	体积计算	1. 模板制作、安装、拆除 2. 泥巌上拌和、运输、浇筑	混凝土			
010303012	-	3. 混凝土强 度等级			3. 养护	浇捣	矩形空心连 续板		
		1. 部位 2. 结构形式			1. 模板制作、安装、拆除	湿凝 -	实心板梁		
040303013		3. 混凝土强 度等级	m <sup>3</sup>		2. 混凝上拌和、运输、浇筑 3. 养护	浇捣	空心板梁		
040303014	混凝土 板拱	1. 部位 2. 混凝土强 度等级	m³		<ol> <li>模板制作、安装、拆除</li> <li>混凝土拌和、运输、浇筑</li> <li>养护</li> </ol>	混凝土	尧捣		
040303015	混凝土 挡墙 墙身	1. 混凝土强 度等级 2. 泄水孔材 料品种、规格 3. 滤水层要求 4. 沉降维要求	m³				1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝上拌和、运输、浇筑 3. 养护 4. 抹灰 5. 泄水孔制作、安装 6. 滤水层铺筑 7. 沉降蜂	2. 抹灰3. 泄水	孔制作、安装 法层铺筑

续表

	-						供化
项目编号	高日 名称	DEM.	计量 单位	等量 计算规则	工程内容	可维定	的主要内容
040303016	挡墙	<ol> <li>混凝土强度等级</li> <li>沉降继要求</li> </ol>	m³	按设计图 示尺寸以 体积计算		1. 混凝	
040303017		1. 结构形式 2. 底板厚度 3. 混凝土强 度等级		皿伙订异	<ol> <li>模板制作、安装、拆除</li> <li>混凝」拌和、运输、浇筑</li> <li>季好</li> </ol>		
040303018		1. 断血 2. 混凝土强 度等级	na		<ol> <li>模板制作、安装、拆除</li> <li>混凝上拌和、运输、浇筑</li> <li>养护</li> </ol>	混凝土	烧捣
040303019	桥面铺装	1、 混凝土强 复等级 2. 沥青品种 3. 沥青混凝 土种类 4. 厚度 5. 配合比	m²	示尺寸以	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝上拌和、运输、浇筑 3. 养护 4. 沥青混凝土铺装 5. 碾压		水泥混凝土 肺路 伸缩缝候缝、 锯凝土路面 刻防消槽 水泥溶土 路面 水泥溶土 路面 水泥溶土
040303020	混凝土 桥头 搭板	混凝 上强度等级	m³		1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝上拌和、运输、浇筑 3. 养护	混凝土	
040303021	混凝土 搭板 枕梁	混凝土强度 等级	m³		1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 养护		
040303022	混凝土 桥塔身	1. 形状 2. 混凝 上强 度等级	m <sup>3</sup>		<ol> <li>模板制作、安装、拆除</li> <li>混凝上拌和、运输、浇筑</li> <li>养护</li> </ol>		

/± ±

项目编号	岛目 名称	项目特征	计量量标	工程量 计算规划	工程内容	可组合	的主要内容
040303023	混凝土	<ol> <li>形状</li> <li>混凝土强 度等级</li> </ol>	m¹		<ol> <li>模板制作、安装、拆除</li> <li>混凝土拌和、运输、浇筑</li> <li>养护</li> </ol>	混凝土	尧搗
				按设计图		1. 混凝	上灌缝
	混凝土		m <sup>3</sup>	示尺寸以 体积计算	<ol> <li>模板制作、安装、拆除</li> <li>混凝上拌和、运输、浇筑</li> </ol>	a 1 mil	立柱、端柱、 灯柱
040303024	040303024 其他 2. 混凝土强 构件 度等级		m		3. 养护	松1件	地梁、便石、 平石
					, , , )		支座垫石
	细等班	混凝土强度		按设计图	1.1.		
040303025	混凝土		m³	示尺寸以 体积计算	混凝土拌和、运输、压注		

(4) 预制混凝土, 见附表-11。

附表-11 预制混凝土(编码: 040304)

項目编号	跨目 名称	项目特征	单位	工行學 计算规则		可组合的主要内容
040304001	預制起凝土渠	L 解放 2. 图象、图纸名称 3. 构件代号、名称 4. 混凝上强度等级 5. 砂浆强度等级	m³	按设计图	装、拆除 2. 混凝土拌和、 运输、浇筑 3. 养护 4. 构件安装	<ol> <li>混凝土浇捣、模板安拆</li> <li>构件出槽堆放</li> <li>场内构件运输</li> <li>安装</li> <li>构件连接</li> </ol>
040304002	預制混 凝土 上柱	1. 部位 2. 图集、图纸名称 3. 构件代号、名称 4. 混凝上强度等级 5. 砂浆强度等级	m³	示尺 寸以 体积计算	装、拆除 2. 混凝 上 拌和、运输、浇筑 3. 养护 4. 构件安装	<ol> <li>混凝上浇捣、模板安拆</li> <li>场内构件运输</li> <li>安装</li> <li>构件连接</li> </ol>

(1)自編号	项目 名称	项月特征	计量 单位	工程量 计算规则	1/6/		可组合的	的主要内容
					1. 模板制作、安	1.	混凝土流	<b>Ł捣、模板安拆</b>
			1 1 1		2.	构件出程	<b>車堆放</b>	
		1. 部位				3.	场内构件	运输
040304003	预制混	<ol> <li>图集、图纸名称</li> <li>构件代号、名称</li> </ol>	m³		运输、浇筑	4.	安装	
040304003	凝土板	4. 混凝土强度等级	m	4. 构件安装				
		5. 砂浆强度等级			5. 接头灌缝	Ļ	构件连接	e.
					6. 砂浆制作 、	٥.	19 I I AL 13	ζ.
					7. 运输 /	1		
			1. 模板制作、安	1.	砌筑			
		DO No. DO Not Justin			装、拆除	2.	勾缝	
		1. 图集、图纸名称			2. 混凝上拌和、	3.	泄水孔制	作、安装
		<ol> <li>构件代号、名称</li> <li>结构形式</li> </ol>		-1	运输、浇筑 3. 养护	4.	滤水层铺	筑
預制混 040304004 凝土挡 環端身	4. 混凝土强度等级	体科	按设计图示尺寸以,体积让算	4. 构件安装 5. 接头潜缝 6. 泄水孔制作、 安装 7. 滤水层铺设 8. 砂浆制作 9. 运输	5.	沉降缝		
						1.	桩	混凝 ±浇捣、 模板 安拆
					1. 模板制作、安			场内构件安拆
		1. 部位			装、拆除 2. 混凝上拌和、			混凝 ±浇捣、 模板安拆
040304005 凝土其		2. 图集、图纸名称			运输、浇筑	2.	拱构件	场内构件安拆
		m³		3. 养护			安装	
	构件 4. 混凝土强度等级 5. 砂浆强度等级		<ol> <li>4. 构件安装</li> <li>5. 接头灌缝</li> </ol>			构件连接		
				5. 接头准键 6. 砂浆制作 7. 运输	3. 小	t wallt to	混凝 上浇捣、 模板安拆	
			'			小型构件	场内构件安拆	
								安装



## (5) 砌筑, 见附表-12。

附表-12 砌筑(编码: 040305)

项目编号	项目名称	项目异征	计量 单位	. 工程量 . 中国1000回	工程内容	可组合的主要内容
040305001	垫层	1. 材料品种、规格 2. 厚度	m <sup>3</sup>		热层铺筑	1. 碎石垫层
040305002	干砌块料	<ol> <li>2. 序段</li> <li>1. 部位</li> <li>2. 材料品种、规格</li> <li>3. 泄水孔材料品种、规格</li> <li>4. 滤水层要求</li> </ol>	m³		1. 砌筑 2. 砌筑存缝 3. 砌筑抹面 4. 洲水孔制作, 安装 5. 滤层铺设	<ol> <li>砂垫层</li> <li>砌筑</li> <li>勾缝</li> <li>泄水孔制件、安装</li> <li>港水层铺筑</li> </ol>
040305003	浆砌块料	5. 沉降缝要求 1. 部位 2. 材料品种、规格 3. 砂浆强度等级 4. 泄水孔材料品种、规格 5. 滤水层要求	m³	按设计图,示尺寸以体积计算、	6. 沉解缝 1. 砌筑 2. 砌体勾缝 3. 砌体抹面 4. 泄水孔刺作、安装 5. 滤层辅设 6. 沉降缝	<ol> <li>紅降缝</li> <li>砌筑</li> <li>勾缝</li> <li>地水扎制作、安装</li> <li>遮水层铺筑</li> <li>沉降缝</li> </ol>
040305004	砖砌体 *	6. 沉降继要求 1. 部位 2. 材料品种、规格 3. 砂浆强度等级 4. 泄水孔材料品	m³ \	\ X	1. 砌筑 2. 砌体勾缝 3. 砌体抹血	1. 砌筑
010303001	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	种、规格 5. 滤水层要求 6. 沉降缝要求 1. 材料品种	, ,	About 1 mai	<ol> <li>1. 洲水孔制作、安装</li> <li>5. 滤层铺设</li> <li>6. 沉降缝</li> <li>1. 修整边坡</li> </ol>	2. 抹灰
040304004	护坡	<ol> <li>结构形式</li> <li>厚度</li> <li>砂浆强度等级</li> </ol>	m²	按设计图 示尺寸以 面积计算	2. 砌筑 3. 砌体勾缝 4. 砌体抹面	<ol> <li>勾缝</li> <li>抹灰</li> </ol>

## (6) 装饰, 见附表-13。

附表-13 装饰(编码: 040308)

项目编号	項目 名称	THAT	计量 单位	工程量	工程内容	可继言的 主要内容
040308001	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比 2. 部位 3. 厚度	m <sup>2</sup>	按设计图示尺寸 以面积计算	<ol> <li>基层清理</li> <li>砂浆抹面</li> </ol>	水泥砂浆抹面

加日编号	項目 名称	项目特征	计量	了程量 计算规则	工程内容	可组合的 主要内容
040308002	剁斧石 饰面	1. 材料 2. 部位 3. 形式 4. 厚度	m²		1. 基层清理 2. 饰面	剁斧石饰面
040308003	镶贴面层	1. 材质 2. 规格 3. 厚度 4. 部位	m²	按设计图示尺寸 以面积计算	1. 基层清理 2. 镶贴面层 3. 勾缝	镶贴面层
040308004	涂料	1. 材料品种 2. 部位	m <sup>2</sup>		<ol> <li>基层清理</li> <li>涂料涂刷</li> </ol>	涂料
040308005	油漆	1. 材料品种 2. 部位 3. 工艺要求	m <sup>2</sup>	11/3-1	1. 除锈 2. 刷油漆	油漆

# (7) 其他, 见附表-14。

附表。14 其他(编码: 040309)

项目编号	项目 名称		ग्रे¶ काइ		1000	可组合的 主要内容
040309001	金属栏杆	1. 栏杆材质、 规格 2. 油漆品种、 工艺要求	2. m	1. 按设计图示尺 可以质量计算 2. 按设计图示尺 寸以延长米计算	<ol> <li>制作、运输、 安装</li> <li>除锈、刷油漆</li> </ol>	1. 制作、安装
040309002	石质栏杆	材料品种、规格	m		制作、运输、安装	
040309003	混凝土栏杆	1. 混凝上强度 等级 2. 规格尺寸	m	按设计图示尺寸 以长度计算	制作、运输、安装	
040309004	橡胶支座	1. 材质 2. 规格、型号 3. 形式			支座安装	支座安装
040309005	钢支座	1. 规格、型号 2. 形式	<b>↑</b>	按设计图示数量 计算	支座安装	支座安装
040309006	盆式支座	1. 材质 2. 承载力			支座安装	支座安装
040309007	桥梁伸缩装置	1. 材料品种 2. 规格、型号 3. 混凝土种类 4. 混凝上强度 等级	m	以米计量,按设 计图示尺寸以延 长米计算		伸缩装置安装

加目编号	図目 名称	项目特征	#12 #12	工程並计算规则	工程内容	川地合作 主要内容
040309008	隔声屏障	1. 材料品种 2. 结构形式 3. 油漆品种、 工艺要求	m <sup>2</sup>	按设计图示尺寸以面积计算	1. 制作、安装 2. 除锈、刷油漆	
040309009	桥面泄水管	1. 材料品种 2. 管径	m	按设计图示尺寸 以长度计算	进水口、泄水管制 作、安装	<ol> <li>泄水管安装</li> <li>滤层铺设</li> </ol>
040309010	防水层	1. 部位 2. 材料品种 3. 工艺要求	m <sup>2</sup>	按设计图示尺寸 以面积计算	防水层铺涂	防水层铺涂

## 4. 市政管网工程

(1) 管道铺设, 见附表-15。

附表-15 管道铺设(编码: 040501)

项目编号	項目 名称	项目特征	計画 単位	) 工程设计	1.73	TEL NEED P
040501001	混凝土實	1. 华层、基础材质 及厚度 2. 管座材质 3. 规格 4. 接印形式 3. 铺设深度 6. 混凝土强度等级 7. 管道检验及试验 要求	m	长度以延 长来计算, 不耐除附 属构筑物、 管件及阀门	2. 模板制作、安装、	1. 华层铺筑 2. 湘藏土基础浇筑 3. 湘藏土基础浇筑 3. 湘瀛土枕基预制。安装 4. 湘藏土管座浇筑 5. 给水管道铺设接口 6. 排水管道接段 7. 排水管道接段 8. 闭水试验 9. 管道试压
040501002	钢管	1. 垫层、基础材质 及厚度 2. 材质及规格 3. 接口形式 4. 铺设深度 5. 管道检验及试验 要求 6. 集中防腐运距	m	按设计图线 还来 医水子 医水子 医水子 医水子 医水子 医外外 医外外 医外外 医外外 医外外 医外外 医外外 医外外 医外外 医外	1. 垫层、基础铺筑及 养护 2. 模板制作、安装、 拆除 3. 混凝上拌和、运输、 流筑、 条护 4. 管道输设 5. 管道检验及试验 6. 集中防腐运距	

项目编号	(취취 용기	项目特征	计量 单位	工程量计算规则	工程内容	可组合的主要内容
						1. 垫层铺筑
						2. 混凝土基础浇筑
						3. 混凝土枕基预制安装
		1, 垫层、基础材质			1. 垫层、基础铺筑及	4. 给水管道铺设接口
		及厚度			养护	5. 排水管道铺设
		2. 材质及规格			2. 模板制作、安装、 拆除	6. 排水管道接口
40501004	塑料管	3.接口形式	m		排原 3、混凝上拌和、运输、	7. 燃气管道铺设接口
		4. 铺设深度			浇筑、养护	8. 排水管道闭水试验
		5. 管道检验及试验			4. 管道铺设	9. 给水管道水压试验
		要求		按设计图	5. 管道检验及试验	10. 管道冲洗消毒
				示中心线		11. 燃气管道强度试验
			长	长度以延		12. 燃气管道气密性试验
				长米计算,	190	13. 燃气管道吹扫
		1. 七壤类别 2. 材质聚规格 3. 对质聚规格 3. 水次成化长度 平导4. 接1形式 高速5. 泥浆要求 6. 管道检验及试验 要求 7. 集中防腐运距	构筑特 作 # ) 的长度 数规格 成礼长度	扣除附属	e <sup>ert</sup> l p	1. 塑料符管道接口
				构筑物(检		2. 排水塑料管定向钻牵引管道
				的长度	1. 设备安装、拆除	3. 钢管等其他定向钻牵 引管道
				110	3. 管道接口 4. 拉管	4. 泥浆外运
40501008			m	A	5. 纠偏、监测 6. 泥浆制作、注浆 7. 管道检测及试验 8. 集中防腐运距	5. 管外注浆
				175		6. 排水管道闭水试验
	*					7. 给水管道水压试验
						8. 管道冲洗消毒
		, and a second			9. 泥浆、土方外运	9. 燃气管道强度试验
						10. 燃气管道气密性试验
						11. 燃气管道吹扫
						1. 坚拆卷扬机打拔桩架
		1. 土壤类别			a obstale EELAA	2. 打拔钢板桩
		2. 工作坑平面尺寸 及深度			<ol> <li>支撑、围护</li> <li>模板制作、安装、</li> </ol>	3. 支撑安拆
		3. 支撑、围护方式			拆除	4. 垫层及基础浇筑
40501010	頂管工	4. 垫层、基础材质	座	按设计图示	3. 混凝上拌和、运输、	5. 基础模板
	作坑	及厚度		数量计算	浇筑、养护	6. 工作坑挖土
		5. 混凝土强度等级			4. 工作坑内设备、工	7. 工作坑回填
		6. 设备、工作台主			作台安装及拆除	8. 安拆顶进后座及平台
		要技术要求				9. 安拆敞开式顶管设备

4-5 主

	NAME AND		59 Mg	- to B -		狭衣
地間環局	名称	项目特征	- 計畫 作	工程量计 算规则	三聖内有	可絕合的主要內容
040501011	凝土工	1. 土壤类别 2. 工作坑平面尺寸 及深度 3. 稳层、基础材质 及厚度 4. 混凝土强度等级 5. 设备、工作台主 要技术要求 6. 混凝土构件运距	座	按设计图示数量计算	1. 混凝土1作坑制作 2. 卜沉、定位 3. 模板制作、安装、 拆除 4. 混凝上拌和、运输、 浇筑、养护 5. 厂作坑内设备、厂 作行安装及拆除 6. 混凝土构件运输	<ol> <li>混凝上工作玩贩机</li> <li>混凝上工作坑运输</li> <li>工作坑垫层</li> <li>底板浇筑</li> <li>挖工下沉</li> <li>安拆顶进后座及平台</li> <li>安敞开式顶管设备</li> </ol>
040501012	顶管上坡加固	1. 土壤类别 2. 顶管工作方式 3. 管道材间规格 4. 中排特种级变成 6. 触变淀检验及或验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验	1. m 2. m³	不延	1. 管道顶进 2. 管道顶进 3. 中權同。工具管及 附属设备 安装拆除 4. 管内整、运上及上 方提升 5. 机械质管设备调向 6. 纠编。 6. 纠编。 8. 测;山木 9. 管道检测及试验 10. 集中的腐运输 11. 流浆、上方外运 打孔、调浆、灌注	1. 项进后座及坑内工作平台挤拆。 2. 项进设备 安装拆除 3. 管道项进 4. 中维回安拆 5. 触变泥浆减阻及封拆 6. 洞口止水处理 7. 泥浆外运 9. 防腐、保温 10. 排水管道闭水试验 11. 给水管道水压试验 11. 给水管道水压试验 11. 给水管道水压试验 12. 压密注浆 3. 高压旋喷柱 4. 深层水泥搅拌柱 5. 插拔型钢 6. 碎石冲振柱
040501016		1. 斯面规格 2. 垫息层、基础材质 及厚度 3. 砌筑材料品种、 规格、强度等级 4. 混凝上强度等级, 配合比6. 勾缝、抹质及规格 8. 伸缩缝(沉降缝) 9. 防渗、防水要求 10. 混凝上构挥运距 10. 混凝土生	m	按	1. 模板刺作、安装、 拆除 2. 混凝土拌和、运输、 浇筑、	1. 韓层铺筑 2. 基础浇筑 3. 砌筑 4. 抹灰、勾缝 5. 盖板颅刺安装 6. 盖板运输 7. 沉降缝 8. 方沟渗水试验

续表

						<b>张 农</b>
项目编号	项目 名称	- MATAL	注量. 单位	工程量计算规则	11000	- Internousers to
		1. 断面规格				1. 垫层铺筑
		2. 垫层、基础材质		按放水管	1. 模板制作、安装、	2. 现浇混凝土方沟
		及厚度		线长度以	拆除	3. 抹灰
	混凝土	3. 混凝土强度等级		延长米计	2. 混凝上拌和、运输、	4. 盖板预制安装
40501017	方沟	<ol> <li>4. 伸缩缝(沉降缝)</li> </ol>	m	算,不扣除	浇筑、养护	5. 盖板运输
		要求 5. 盖板材质、规格		管件、阀门	<ol> <li>盖板安装</li> <li>防水、止水</li> </ol>	6. 近降缝
		<ol> <li>6. 防渗、防水要求</li> <li>7. 混凝土构件运距</li> </ol>		所占长度	5. 混凝土构件运输	7. 方沟渗水试验
		1. 断面规格	<b>B</b>		1 [7]	1. 垫层铺筑
		2. 巷层、基础材质		按放水管	1-120	2. 渠道基础浇筑
		及厚度			<ol> <li>模板制作、安装、 拆除</li> <li>混凝土拌和、运输、 浇筑、 斧护</li> <li>渠道砌筑</li> <li>勾缝、抹血</li> <li>防水、止水</li> </ol>	3. 墙身砌筑
		3. 砌筑材料品种、				4. 拱盖砌筑
	砌筑	规格、强度等级 4、混凝土强度等级				5. 墙帽砌筑
40501018		<ol> <li>2. 能艇工强度等级。</li> <li>3. 砂浆强度等级。</li> </ol>		第,不扣除 登供、阅口		6. 抹灰、勾缝
	水旭	配合比				7. 盖板预制安装
		6. 勾缝、抹前要求		所占长度		8. 盖板运输
		7. 伸缩缝(沉释缝)				9. 沉降缝
	11	要求 8. 防渗、防水要求		12		10. 渠道渗水试验
		1. 断面规格				1. 垫层铺筑
		2. 垫层、基础材质		按放水管	<ol> <li>模板制作、安装、</li> </ol>	2. 现浇混凝土
		及厚度		线长度以		3. 方沟模板
混凝土	3. 混凝土强度等级		延长米计	2. 混凝上拌和、运输、	4. 抹灰、勾缝	
10501019	渠道	4. 伸缩缝(沉降缝)	m		浇筑、养护	5. 盖板 预制安装
	要求			3. 防水、止水	6. 盖板运输	
		5. 防渗、防水要求		所占长度	4. 混凝上构件运输	7. 沉降缝
		6. 混凝土构件运距				8. 渠道渗水试验

(2) 附属构筑物, 见附表-16。



#### 附表-16 管道附属构筑物(编码: 040504)

项目编号	- 项目 - 名称	项目特征	it B V IS	工程量計 算规则	工程内容	<b>呵组合的主要内容</b>
040504001	砌筑井	1. 整层、基础材质及厚度 2. 砌筑材料品种、规格、 强度等级 3. 勾缝、抹面要求 4. 砂浆强度等级 6. 混凝上强度级等级 6. 温板材质、规格 7. 井盖、井圃材质及规格 8. 踏步材质、规格 9. 防渗、防水要求	座		浇筑、养护	1. 垫层、基础铺筑 2. 砌筑 3. 流槽流筑 4. 过梁倾电 5. 过缝安奏 6. 勾缝、抹灰 7. 混凝 L 盖 并、腰 期件 8. 并盖井座安装 9. 踏步安装
040504002	混凝 土井	1. 整层、基础材质及厚度 2. 混凝 L强度等级 3. 孟板材质、规格 4. 丹蓝,外侧核及规格 6. 防渗、防水吸来	PAG	按设计图示数量计算	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、 拆除 3. 混凝上拌和、运输、 浇筑、淬炉 4. 开侧、井盖安装 5. 盖板安装 6. 辨少安装 7. 防水、止水	1. 转层轴负 2. 混凝土成板浇筑 3. 并曝滤泵 4. 顶板烧筑 5. 并壁板板 6. 顶板模板 7. 踏步安装 8. 流槽浇筑 9. 混凝土盖井、圆 10. 升盖井座安装
040504003		1. 垫层、基础材质及厚度 2. 检查井材质、规格 3. 井筒、井盖、井圖材质 及规格	廢		1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、 拆除 3. 混凝上拌和、运输、 浇筑、养护 4. 检查井安装 5. 井筒、井圏、井盖 安装	
040504004	砌筑 井筒	1. 井筒规格 2. 砌筑材料品种、规格 3. 砌筑、勾缝、抹面要求 4. 砂浆强度等级、配合比 5. 踏步材质、规格 6. 防渗、防水要求	m	按 设 计 图 示尺寸以延 长米计算	1. 砌筑、勾缝、抹面 2. 踏步安装	1. 砌筑 2. 踏步安装 3. 抹灰、勾缝
040504005	预制混 凝土 井筒	1. 井筒规格 2. 踏步规格	m		1. 运输 2. 安装	

徒事

项目编号	项目 名称	项目特征	计量 单位	工程量计 算规则	工程内容	可组合的主要内容
040504006		1. 整层、基础材质及厚度 2. 砌筑材料品种、规格 3. 砌筑、勾缝、抹面要求 4. 砂浆强度等级及配合比		按 设 计 图示数量计算	1. 墊层铺筑 2. 模板制作、安装、 拆除 3.混凝土拌和、运输、 浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面	水口 3. 砌筑
040504007		1. 垫层、基础材质及厚度 2. 混凝土强度等级	座	按设计图示数量计算	<ol> <li>垫层铺筑</li> <li>模板制作、安装、 拆除</li> <li>混凝土拌和、运输、 浇筑、养护</li> </ol>	<ol> <li>垫层铺设</li> <li>混凝土基础</li> <li>混凝土浇筑</li> </ol>
040504009	雨水口	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格 2. 垫层、基础材质及厚度 3. 混凝土强度等级 4. 砌筑材料品和、规格 5. 砂浆强度等级及配合比	(本)	接设计图示数量计算	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、 拆除 3. 配度 其种、运输、 流流、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水箅子安装	6. 勾缝、抹灰

## 5. 钢筋工程

钢筋工程,见附表-17。

附表-17 钢筋工程(编码: 040901)

项目编号	项目 名称	项目特征	计量 单位	工程量计算 规则	工程内容	可组合的	的主要内容
						1. 地下连续均	音导墙钢筋
040901001	现浇构 件钢筋				1. 制作 2. 运输 3. 安装	2. 道路工程	现浇构件钢筋
						3. 桥涵工程	现浇构件钢筋
						4. 隧道工程	现浇构件钢筋
		1. 钢筋种类 2. 钢筋规格	t			5. 排水工程	现浇构件钢筋
	預制构	2. 钢肋规怕				1. 桥涵工程	预制构件钢筋
040901002	件钢筋					2. 排水工程	预制构件钢筋
040901003	钢筋 网片	1				1. 道路工程	钢筋网片
						2. 隧道工程	钢筋网片

							续表
项目编号	项目 名称	项目特征	计量 单位	工程量计算 规则	工程内容	可组合的	主要内容
040901004	钢筋笼					1. 地下连续墙	钢筋笼
040901004	WAND DE					2. 桥涵工程	钢筋笼
	先张法					1. 桥涵工程	先张法预应力
040901005	预应力	1. 部位				1. 17 (12) 1. T.E.	钢筋
	钢筋	2. 预应力筋种类					先张法预应力
	, , , ,	3. 预应力筋规格			1. 制作	2. 排水工程	钢筋
	钢绞线)		]		2. 运输		171.160
		1. 部位		按设计图示 尺寸以质量 计算	3. 安装	権滅工程	后张法预应力
	后张法	2. 预应力筋种类	t			TOTAL TAX	钢筋
		3. 预应力筋规格	1				后张法预应力
040901006		4. 锚具种类、规格	1				
		5. 砂浆强度等级		1	7	2. 排水工程	钢筋
		6. 压浆管材质、		. XX	100		1 1 1 1 1 1 1 1
		规格		MY			
	型钢	1、材料种类	111	MI	1. 制作		
040901007		2. 材料規格		,	/Vir	插拔型钢	
		7/			3. 安装、定位		
		. X		V	1. 定位、钻孔、		
	植飾	b 材料种类	根	按设计图示 数量计算	消孔		
040901008		2. 材料规格			2. 钢筋加工成型		
		3. 植入深度			3. 注胶、植筋		
		4. 植筋胶品种			4. 抗拔试验		
			-	Advantage met	5. 养护	A DE UN ON THE	2727 Levi Aul., 201.
0.10001000	预埋			按设计图示		1. 桥涵工程	预埋铁件
040901009	铁件		t	尺寸以质量 计算		2. 排水工程	预埋铁件
		<ol> <li>材料种类</li> </ol>	<u> </u>		1. 制作		
	高强螺栓	1. 材料// 2. 材料規格		1. 按设计图	2. 运输		
040901010		2. 47 科 7 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7	1. t 2. 套	示尺寸以质 量计算	3. 安装		
				重计昇 2. 按设计图			
				7. 按反订图 示数量计算			
				小数里订昇			

## 6. 拆除工程

拆除工程, 见附表-18。

附表-18 拆除工程(编码: 041001)

项目编号	项目 名称	项目特征	计量 单位	工程量计算规则	工程内容	可组合的主要内容
041001001	拆除路面					1. 拆除沥青柏油类路面层
		1. 材质 2. 厚度	m²	拆除部位以面积 计算 按拆除部位以延 长米计算		2. 拆除混凝土类路面层 3. 运输
						1. 拆除混凝土预制板
041001002	拆除人行道					2. 拆除混凝土面层
					V	3. 运输
	拆除基层	1. 材质			1. 拆除、清理 2. 返输	1. 人工拆除基层
041001003		2. 厚度				2. 机械拆除基础
		3. 部位				3. 运输
041001004	铣刨路面	1. 材质 2. 结构形式 3. 厚度				铣刨沥青路面
041001007	拆除侧、平	材质	1			1. 拆除侧、平石
041001005	(缘)石	材坝,	1/1			2. 运输
041001006	拆除管道	1. 材质	in			1. 拆除管道
041001006	沙除卧地	2. 管径		XXX		2. 运输
041001007	拆除砖石	T. 结构形式	733.5	擅拆除部位以体 积计算		1. 拆除砖石构筑物
041001007	结构					2. 运输
041001008	拆除混凝土	2. 强度等级				1. 拆除混凝土构筑物
041001008	结构へ					2. 运输
	拆除井	1. 结构形式		按拆除部位以数		1. 拆除井
041001009		<ol> <li>规格尺寸</li> <li>强度等级</li> </ol>	座			2. 运输
041001010	拆除电杆	1. 结构形式	相			
041001010		2. 规格尺寸				
041001010	拆除管片	1. 材质 2. 部位	处			

## 参考文献

- [1] 中华人民共和国国家标准, GB 50500-2013 建设工程工程量清单计价规范[S], 北京: 中国计划出版社, 2013
- [2] 浙江省建设工程造价管理总站。浙江省市政工程预算定额(2010版)[S]、北京:中国计划出版社,2010.
- [3] 浙江省建设工程造价管理总站。浙江省建设工程施工费用定额(2010 版)(S)。北京:中国计划出版社, 2010
- [4] 浙江省建设工程造价管理总站, 浙江省建设工程工程量清单计价指引(市政工程)[S], 北京: 中国计划出 版社, 2013.
- [5] 中华人民共和国国家标准。GB 50857-2013 市政工程工程量计算规范[S]。 北京: 中国计划出版社, 2014.
- [6] 肖明和, 建筑工程计量与计价[M], 3 版, 北京; 北京大学工业出版社, 2015.
- [7] 雷建平. 市政工程计量与计价[M]. 北京: 中国电力出版社, 2012.
- [8] 王云江. 透过案例学市政工程计量与计价 [M]. 2 版. 北京: 中国建材工业出版社, 2015.
- [9] 袁建新. 市政工程计量与计价[M]. 3 版. 北京: 中国建筑工业出版社, 2014.
